

LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

Santo Domingo, D.N.  
17 de mayo de 2023

Al:

Ingeniero  
**Valentín Santos García**  
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Su Despacho-

Via:

Ingeniero  
**Nelson D. Peña Luna**  
Director Asesoría Construcciones Municipales  
Su Despacho

Asunto:

**Remisión de informe de cierre de ejecución Villa Tapia**

En la visita técnica realizada el 17 de marzo del 2023 se validó la ejecución de 2,753.62 metros cuadrados de aceras y 922.30 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.


La supervisión externa ha validado la ejecución de 477.75 metros cuadrados de aceras y 735 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 3,231.37 metros cuadrados de acera y 1,657.30 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

  
**Stephany Castro de la Cruz**  
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 190301  
REGIÓN: CIBAO NORDESTE  
PROVINCIA: HERMANAS MIRABAL  
MUNICIPIO: VILLA TAPIA  
DISTRITO MUNICIPAL: -


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17/03/2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza  
2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE PRIMERA	41.50	1.10	1.00	42.00	1.00	45.65	42.00
TRAMO B	CALLE PRIMERA	82.10	1.13	1.00	82.10	1.00	92.87	82.10
TRAMO C	CALLE PRIMERA	35.00	1.10	1.00	35.00	1.00	38.50	35.00
TRAMO D	CALLE PRIMERA	23.00	1.04	1.00	23.00	1.00	23.92	23.00
TRAMO E	CALLE PRIMERA	55.30	1.00	1.00	55.30	1.00	55.30	55.30
TRAMO F	CALLE PRIMERA				22.00	1.00		22.00
TRAMO G	ENTRADA DE FEDEVITA	79.80	1.47	2.00	26.90	1.00	234.16	26.90
TRAMO H	ENTRADA DE FEDEVITA	171.90	1.05	2.00	171.90	2.00	360.99	343.80
TRAMO I	SABANA ANGOSTA	229.60	1.10	1.00			252.56	
TRAMO J	SABANA ANGOSTA CALLE PRINCIPAL	346.30	1.38	2.00	30.00	1.00	956.60	30.00
TRAMO K	SABANA ANGOSTA CALLE PRINCIPAL	99.99	1.00	1.00			99.99	
TRAMO L	SABANA ANGOSTA C/ CARRET. EL COCO	101.90	1.27	1.00			129.07	
TRAMO M	ENTRADA DE FEDEVITA	464.00	1.00	1.00	262.20	1.00	464.00	262.20
TRAMO N								
<b>Total</b>							<b>2,753.62</b>	<b>922.30</b>

#### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,303,939.91  
Monto desembolsado RD\$ 5,303,939.91 (100%)  
Avance de obra 115.24%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17/03/2023

PROVINCIA: HERMANAS MIRABAL

MUNICIPIO: VILLA TAPIA

DISTRITO MUNICIPAL: -



## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,753.62 metros cuadrados de aceras y 922.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## NOTAS




1. En la visita realizada a este municipio pudimos observar que la construcción de aceras y contenes se esta ejecutando bajo los parámetros establecidos.
2. En algunos de los tramos, el ancho correspondiente establecido de las aceras se vio reducido por el poco ancho de la vía.
3. Este informe no cierra al 100% debido a que se les termino el dinero del programa, la razon que nos informaron fue que pagaron mas alto la construccion de las aceras que los contenes.

## IMÁGENES

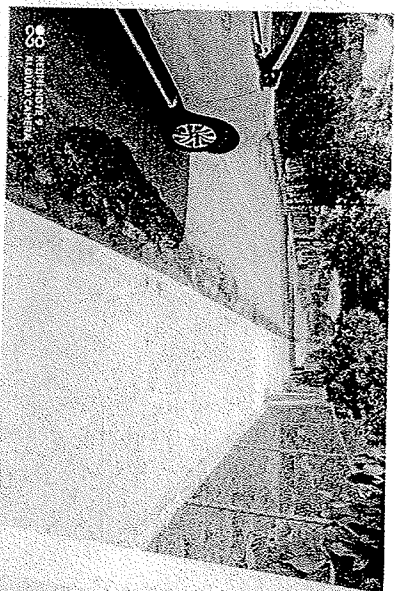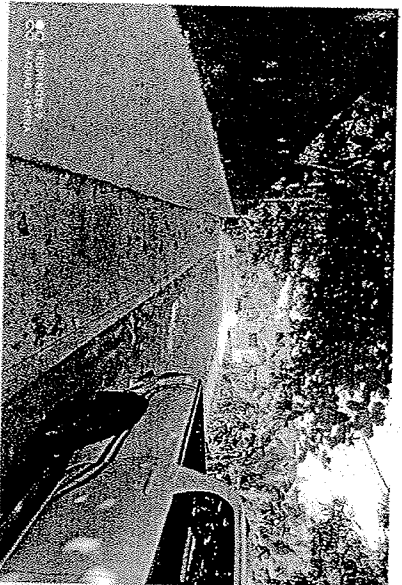




LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

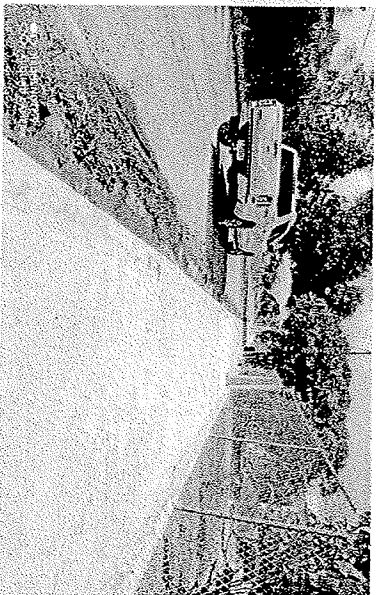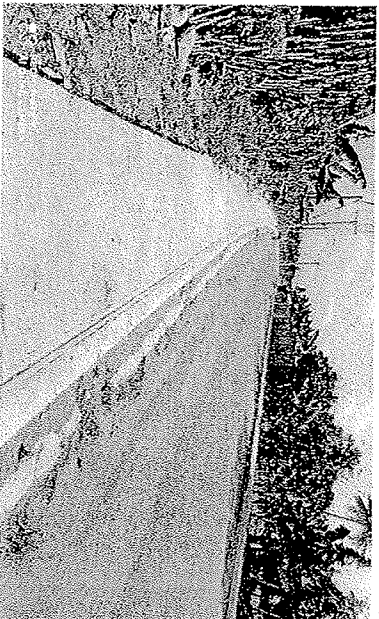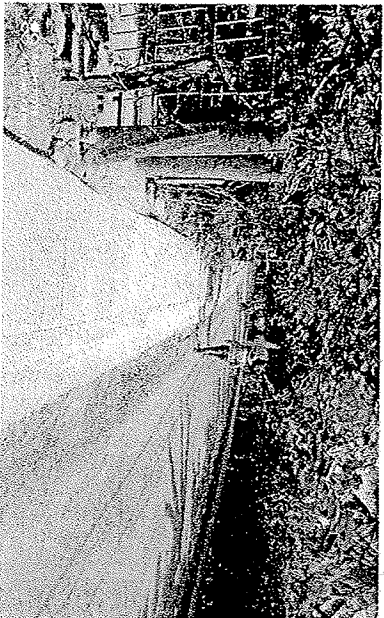


Suministra los datos de este reporte,

  
ING. SPAYLIN MENDOZA

Técnico

  
ING. RICHARD CABRERA

Técnico



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: HERMANAS MIRABAL

MUNICIPIO: VILLA TAPIA

DISTRITO MUNICIPAL: N/A

BARRIO Y/O SECTOR:

ENTRANDO POR EL COLEGIO LA ALTAGRACIA

2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social  
RNC ó Cédula:

YAMILSIS I. MARTINEZ T.
4022265091-9

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos: X
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:


CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.  
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	S/N	350790	2134858	350903	2134956	220.00	0.65	220.00	273.00	420.00
Tramo B	S/N	350789	2134932	350723	2134956	72.00	0.65	72.00	90.35	139.00
Tramo C	S/N	350805	2134960	350744	2134983	65.00	0.65	65.00	84.50	130.00
Tramo D	S/N	350844	2134979	350853	2135001	23.00	0.65	23.00	29.90	46.00
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

477.75      735



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										



**5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Se procedió a tomar un promedio en el ancho de la acera, por lo regular la ausencia en algunos casos.

**6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR**  
Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

**NOMBRE COMPLETO:**

Julio Leon Flores Sr.

**CÉDULA:**

0510014007-2

**CODIA:**

8831

**FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:**

19/04/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

