

Santo Domingo, D.N.
17 de mayo de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho


Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución Altamira**

En la visita técnica realizada el 22 de marzo del 2023 se validó la ejecución de 802.98 metros cuadrados de aceras y 1,269.7 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del "Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales".

La supervisión externa ha validado la ejecución de 700.93 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 802.98 metros cuadrados de acera y 1,970.63 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 180201
REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: PUERTO PLATA
MUNICIPIO: ALTAMIRA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de septiembre de 2022

TÉCNICOS:
1. Ing. Richard Cabrera
2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE PRINCIPAL	5.9	0.44	1	5.9	2	2.596	11.8
TRAMO B	CALLE PRINCIPAL	124.1	0.63	2	124.1	2	156.366	248.2
TRAMO C	CALLE PRINCIPAL	5.4	0.76	1	7.9	1	4.104	7.9
TRAMO D	CALLE PRINCIPAL				37.6	1		37.6
TRAMO E	CALLE PRINCIPAL				85.9	2		171.8
TRAMO F	CALLE PRINCIPAL				39.7	1		39.7
TRAMO G	CALLE PRINCIPAL				66	2		132
TRAMO H	CALLE PRINCIPAL				16.2	1		16.2
TRAMO I	CAMINO REAL	208.86	1.00	1	218.2	1	208.86	218.2
TRAMO J	CAMINO REAL	99.47	1.00	1	122.8	1	99.47	122.8
TRAMO K	CAMINO REAL	106.59	1.00	1	13	1	106.59	13
TRAMO L	CAMINO REAL	193.35	1.00	1			193.35	
TRAMO M	CAMINO REAL	31.64	1.00	1	46.5	1	31.64	46.5
TRAMO N	CAMINO REAL				102	2		204
TRAMO O								
TRAMO DJ								
TRAMO DK								
Total							802.98	1269.70

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,156,709.30
Monto desembolsado RD\$ 2,078,354.66 (50%)
Avance de obra 101.15%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: PUERTO PLATA
MUNICIPIO: ALTAMIRA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de septiembre de 2022


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se certifica que el Gobierno Local ha ejecutado 802.98 metros cuadrados de aceras y 1,269.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. En este levantamiento pudimos observar que las aceras y contenes se están ejecutando correctamente.
2. En la primera visita realizada no se completó en su totalidad, notamos que las aceras no tienen el ancho mínimo en algunos casos que sí se podían hacer.
3. En una segunda visita se cumplió con el metraje asignado por el programa.

IMÁGENES

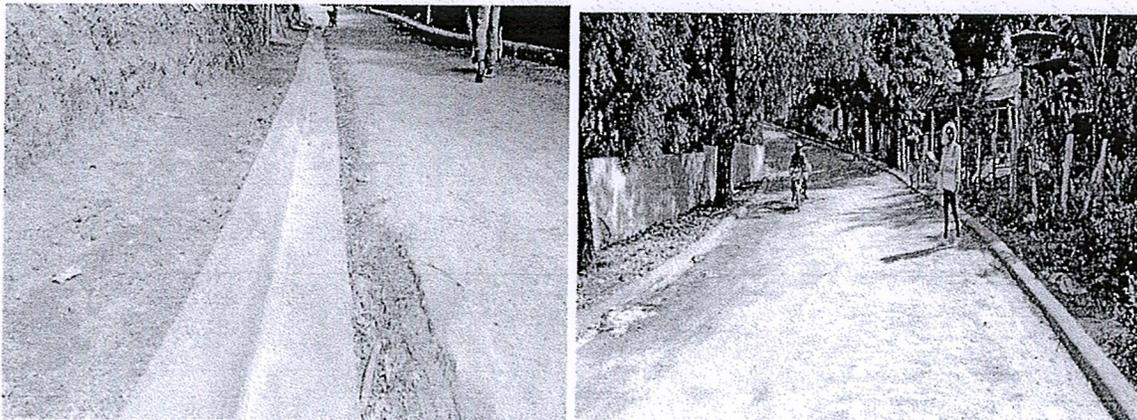



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

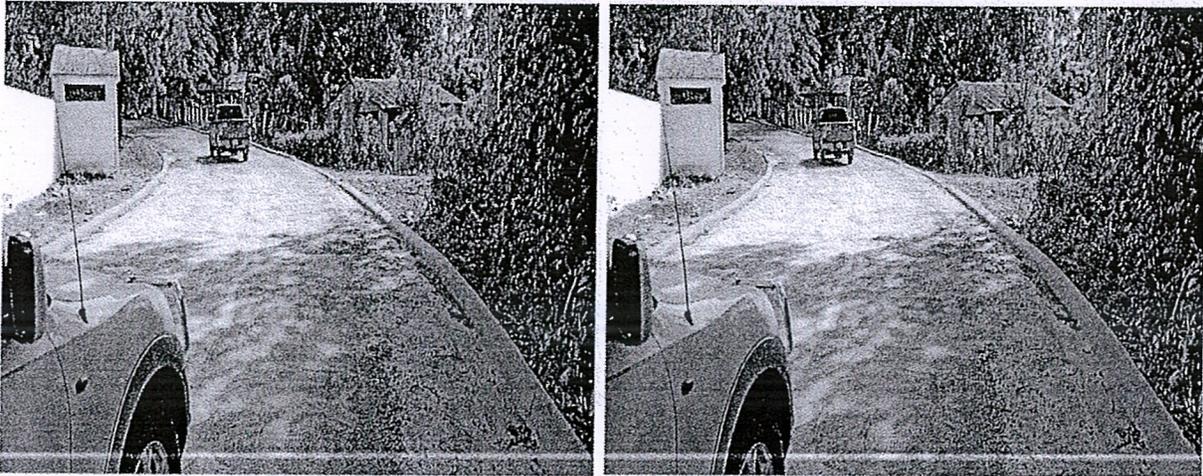

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ARQ. KEILIN MORA

Técnico



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: PUERTO PLATA

MUNICIPIO: ALTAMIRA

DISTRITO MUNICIPAL: ALTAMIRA

BARRIO Y/O SECTOR:

BAJABONICO ARRIBA, ESCUELA DANIEL VARGAS CHARCO DE LA PIEDRA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social

RNC ó Cédula:

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE CONTENES NUEVOS

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.



GEOLOCALIZACION
 PROVINCIA: PUERTO PLATA
 MUNICIPIO: ALTAMIRA
 DISTRITO MUNIC.PAL: ALTAMIRA
 BARRIO Y/O SECTOR: BAJABONICO ARriba
 CONSTRUCCION DE CONTENES NUEVOS

Leyenda

- TRAMO A LADO DERECHO
- TRAMO B LADO DERECHO
- TRAMO C LADO DERECHO
- TRAMO D LADO IZQUIERDO
- TRAMO E LADO IZQUIERDO

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A Lado Derecho	DESDE EL INICIO HASTA INICIO DE BADEN	19°42'22.47"N	70°48'11.54"O	19°42'18.46"N	70°48'7.69"O			167.94		167.94
Tramo B Lado Derecho	DESDE CRUZAR EL BADEN HASTA LA ENTRADA DE LA RUTA DAMAJAGUA	19°42'18.43"N	70°48'7.63"O	19°42'15.84"N	70°48'2.73"O			163.65		163.65
Tramo C Lado Derecho	DESDE ENTRADA DE RUTA DAMAJAGUA HASTA SALIDA DE RUTA DAMAJAGUA	19°42'15.75"N	70°48'2.48"O	19°42'15.60"N	70°48'1.88"O			18.00		18.00
Tramo D Lado Izquierdo	DESDE EL INICIO HASTA INICIO DE BADEN	19°42'22.67"N	70°48'11.33"O	19°42'18.64"N	70°48'7.55"O			167.94		167.94
Tramo E Lado Izquierdo	DESDE CRUZAR EL BADEN HASTA COMMUNITY MARKET	19°42'18.59"N	70°48'7.46"O	19°42'15.79"N	70°48'1.93"O			169.69		183.4
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										

700.93

SERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Total de Metros de contenes igual a 700.93 ml

5- FOTOGRAFÍAS DE LA CALLE A INTERVENIR

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

YABERLIN VENTURA TORIBIO

CÉDULA:

094-0024487-8

CODIA:

40742


FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:


11 DE MARZO DEL 2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



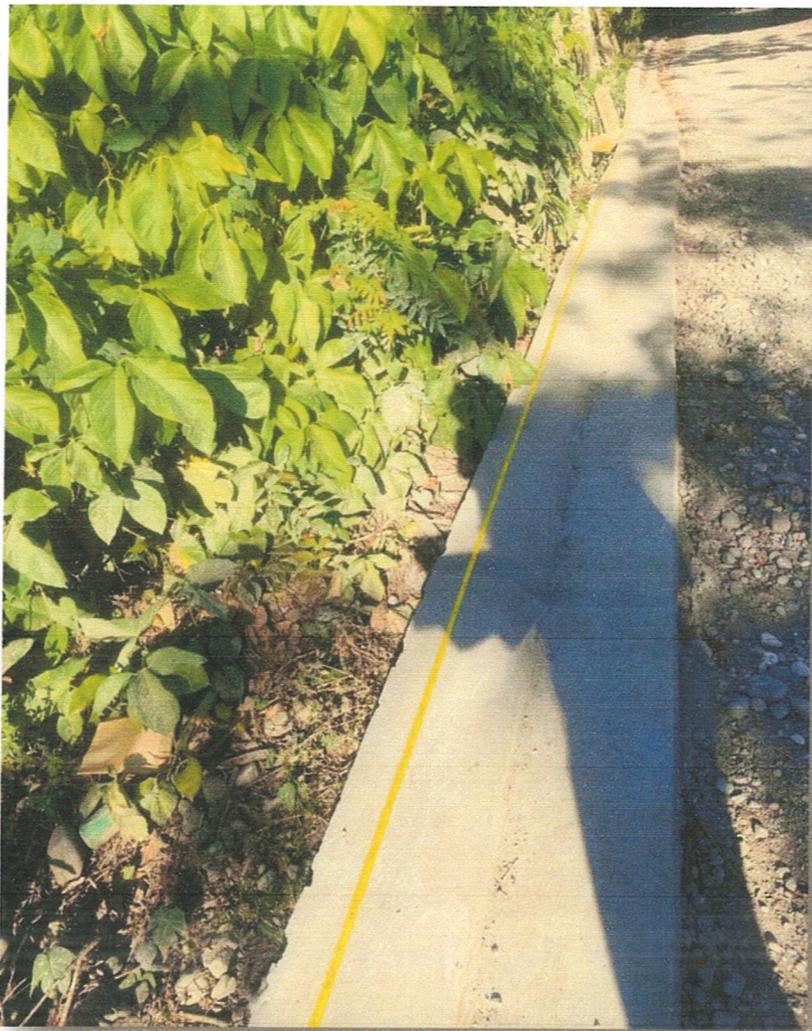

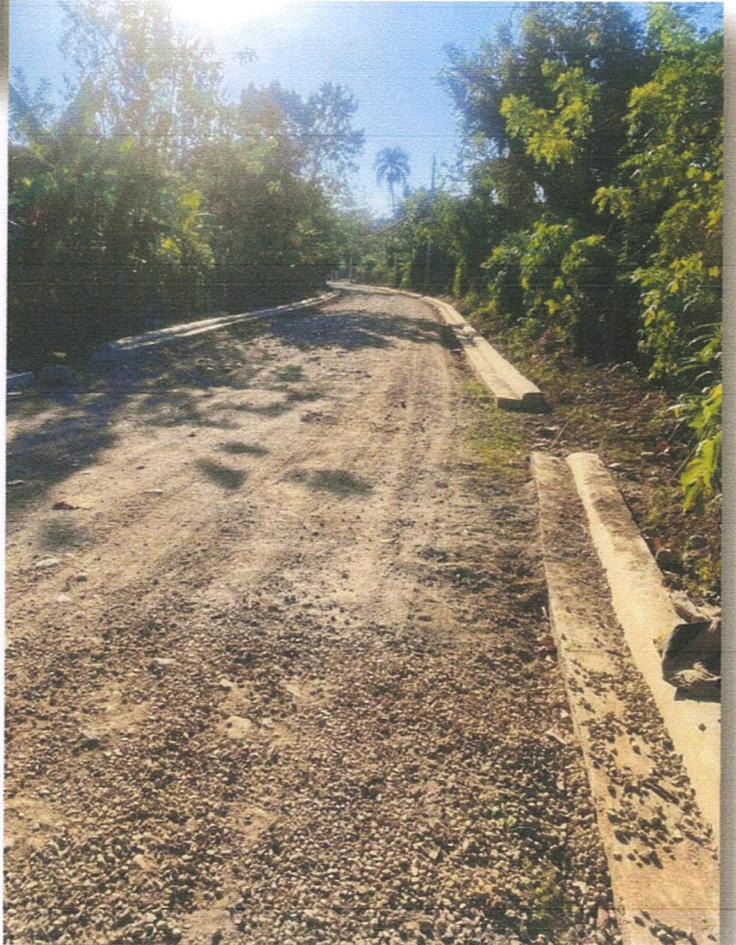




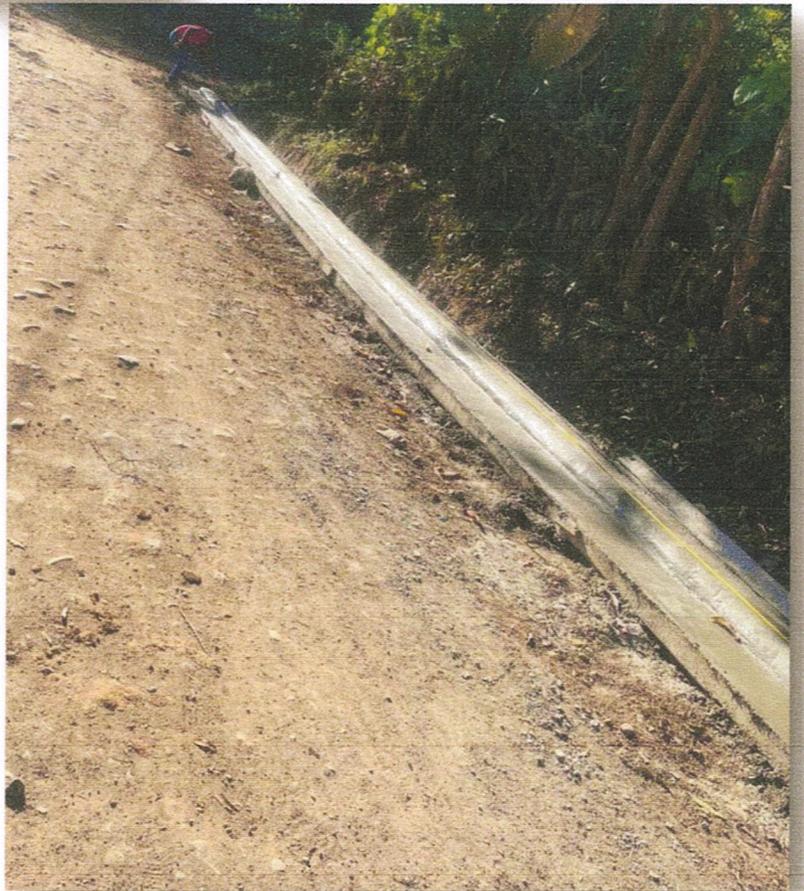







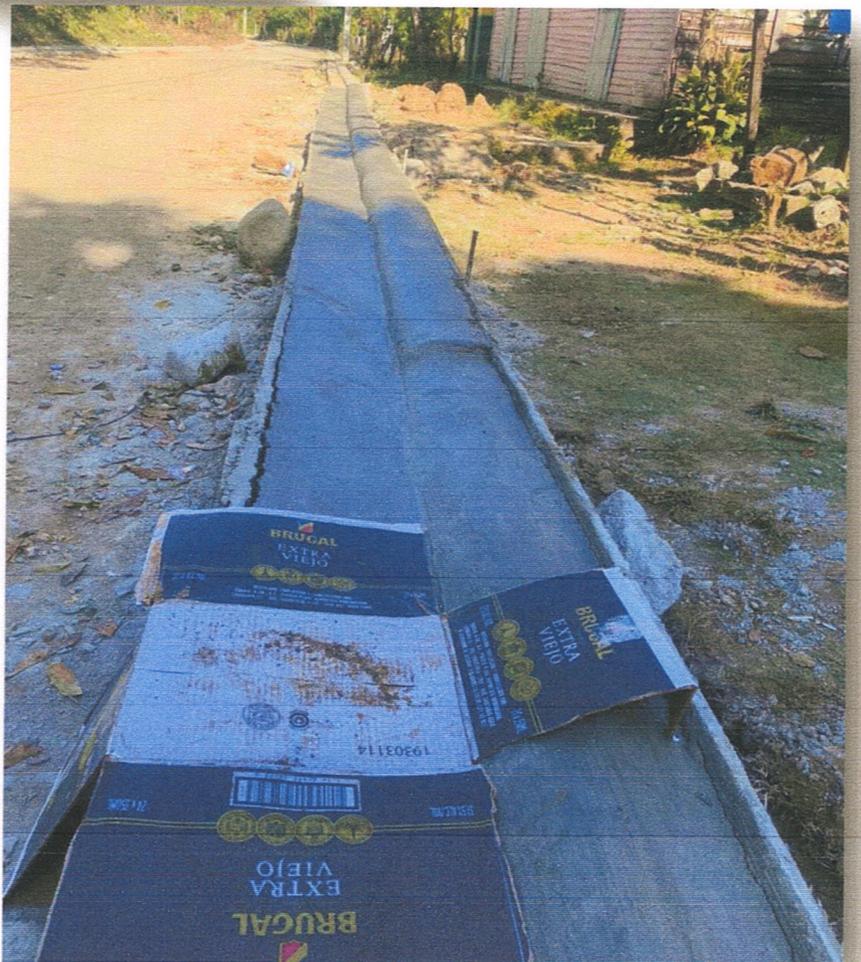

January 11/03/2023

Martes

4

Tuesday

4-361

* Supervisión Altamiró

- Basabonico Arriba
Sector → Escuela Daniel Vargas
Chorco de la Piedra.

Medida = 18 mt + 4.5m + 40m
+ 50ml + 50 ML + 5
+ 5.00.

- Inicia 07 hasta inicio de Baden

- Después del vadem. hasta entrada Jabuta Pomaiaja
50 mt + 50 ml + 50 ml + 13.65
~~11.00~~

7.60 del otro lado para Sumar. Restar
5.85

Des entrada de la Ruta Pomaiaja hasta
la salida.

18 ml.

700.93

LADO DERECHO

349.59 ML

LADO IZQ.

351.34 ML

Jorge A. Ramirez
JAL/ST/KL

Jabalin Ventura
Jabalin Ventura

Febrero February		M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						
