



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 180601

**REGIÓN:** CIBAO NORTE

**PROVINCIA:** PUERTO PLATA

**MUNICIPIO:** LUPERÓN

**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 28 de septiembre de 2022

1. Ing. Staylin Mendoza

**TÉCNICOS:** 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE 14				253.70	2		507.4
TRAMO B	CALLE 14				133.15	2		266.3
TRAMO C	CALLE 14				200.20	2		400.4
TRAMO D	CALLE CASA DEL SOL (LOS MAESTROS)				187.10	2		374.2
TRAMO E	CALLE CASA DEL SOL (LOS MAESTROS)				102.7	2		205.4
TRAMO F	CIUDAD MARINA				356.7	2		713.4
TRAMO G	CIUDAD MARINA				140.5	2		281
TRAMO H	CIUDAD MARINA				89.6	2		179.2
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0.00	2927.30

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,622,137.58

Monto desembolsado RD\$ 3,622,137.59 (100%)

Avance de obra 204.41%



## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de septiembre de 2022

PROVINCIA: PUERTO PLATA

MUNICIPIO: LUPERÓN

DISTRITO MUNICIPAL: -


### INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia de que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,927.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.


#### NOTAS

1. Buena ejecución de los contenes.
2. Debido al plan de asfaltado próximo solo se ejecutaron contenes.

#### IMÁGENES

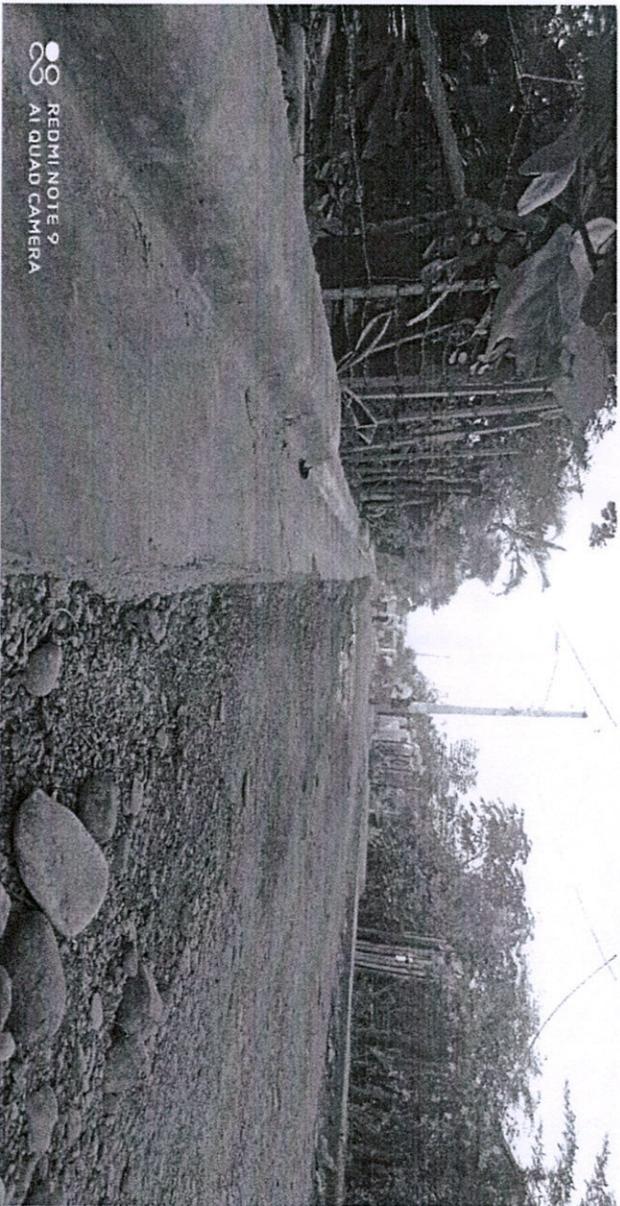

REDMI NOTE 9  
AI QUAD CAMERA



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,



ING. STAYLIN MENDOZA  
Técnico

CÉSAR DE LOS SANTOS  
Técnico

