



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 180602

**REGIÓN:** CIBAO NORTE

**PROVINCIA:** PUERTO PLATA

**MUNICIPIO:** LUPERÓN

**DISTRITO MUNICIPAL:** LA ISABELA

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 11 de mayo de 2023

1. Ing. Richard Cabrera

**TÉCNICOS:** 2. Arq. Keilin Mora


| TRAMOS       | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A      | CALLE 19 DE JUNIO  | 210.50                 | 1.55                | 2                            | 230.65                | 2                              | 652.55               | 461.3                 |
| TRAMO B      | CALLE 19 DE JUNIO  | 27.70                  | 1.22                | 1                            | 12.30                 | 1                              | 33.794               | 12.3                  |
| TRAMO C      | CALLE LAS PAREDES  | 197.70                 | 1.00                | 1                            | 197.70                | 1                              | 197.7                | 197.7                 |
| <b>Total</b> |                    |                        |                     |                              |                       |                                | <b>884.04</b>        | <b>671.30</b>         |

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,788,448.64

Monto desembolsado RD\$ 2,788,448.64 (100%)

Avance de obra 100.09%



# LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: PUERTO PLATA

MUNICIPIO: LUPERÓN

DISTRITO MUNICIPAL: LA ISABELA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 11 de mayo de 2023


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 884.04 metros cuadrados de aceras y 671.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS

1. Estas aceras y contenes que observamos en este levantamiento están defectuosas, es decir, que su terminación no es la adecuada.
2. En la mayoría de los tramos que levantamos, están igual sobre todo en la platea de los contenes.
3. Todas las aceras están estampadas de color rojo y tienen un ancho de 1.50 m debido a que es la avenida principal del pueblo.
4. Se construyeron muros de contención en forma de talud para el soporte de las aceras, el cual aumento el costo de la obra el cual soporta toda la aceras estampadas en la avenida principal

### IMÁGENES

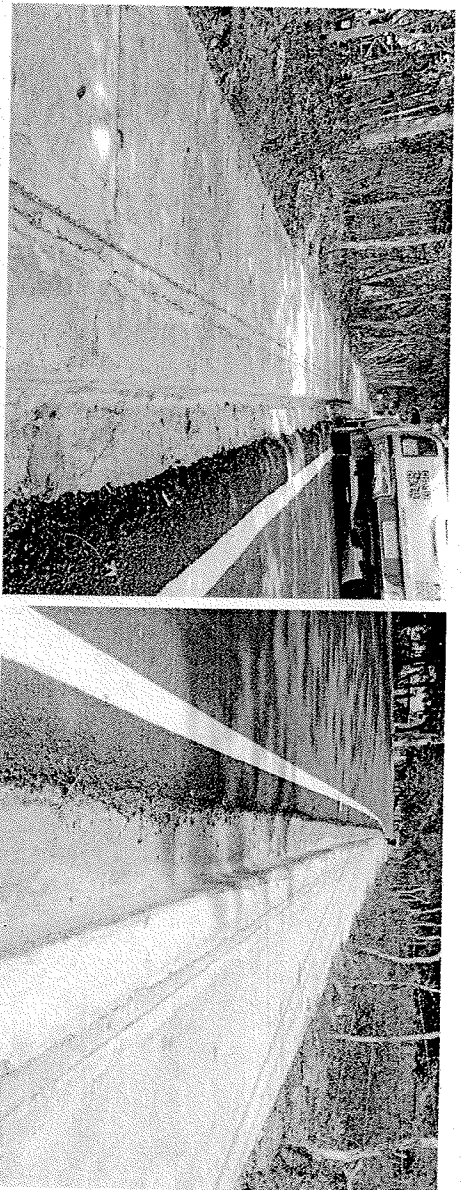




LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

  
ING. RICHARD CABRERA

Técnico

  
ARQ. KEILIN MORA

Técnico
