



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de junio de 2023


TÉCNICOS: 1. Arq. Zunilda Del Rosario  
2. Felipe Reyes

CODIGO: 090104  
REGIÓN: CIBAO NORTE  
PROVINCIA: ESPAILLAT  
MUNICIPIO: MOCA  
DISTRITO MUNICIPAL: JUAN LÓPEZ

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (M)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR: EL MAMEY, CALLE DOMINGO ANTONIO FERREIRA	10.60	2.35	1.00			24.91	
TRAMO B		2.70	0.50	1.00			1.35	
TRAMO C		79.50	2.79	1.00			221.81	
TRAMO D		273.90	1.88	1.00			513.56	
TRAMO E		97.60	1.55	1.00			151.28	
TRAMO F		8.50	1.55	1.00			13.18	
TRAMO G		4.70	1.20	1.00			5.64	
TRAMO H		12.80	2.55	1.00			32.64	
TRAMO I		32.60	1.57	1.00			51.05	
TRAMO J		4.90	1.20	1.00			5.88	
TRAMO K		10.50	0.97	1.00			10.19	
TRAMO L		22.50	0.74	1.00			16.65	
TRAMO M		7.40	0.60	1.00			4.44	
TRAMO DO		39.90	0.81	1.00			32.32	
TRAMO DP		3.70	0.70	1.00			2.59	
TRAMO DQ		12.60	1.12	1.00			14.11	
TRAMO DR		36.70	0.99	1.00			36.33	
TRAMO DS		45.20	0.79	1.00			35.71	
TRAMO DT		15.30	1.08	1.00			16.52	
TRAMO DU		44.20	0.68	1.00			30.06	
TRAMO DV		3.50	1.70	1.00			5.95	
TRAMO DW	SECTOR: EL MAMEY, CALLE: CIPRIAN BENCOSME	24.40	2.18	1.00			53.07	
TRAMO DX		7.70	1.70	1.00			13.09	
TRAMO DY		4.00	2.75	1.00			11.00	

090104 - LEVANTAMIENTO DE INSPECCION 12-6-2023

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686




LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO DZ	CALLE: CIPRIAN BENCOSME, DETRÁS DE LOS ROBLES HASTA BRIANA				60.50	1.00		60.50
TRAMO EA		203.40	1.60	1.00	203.40	1.00	325.44	203.40
TRAMO EB		5.00	1.70	1.00	5.00	1.00	8.50	5.00
TRAMO EC		250.00	1.91	1.00	250.00	1.00	477.50	250.00
TRAMO ED		60.60	1.89	1.00	60.60	1.00	114.53	60.60
TRAMO EE	CALLE: CIPRIAN BENCOSME, DESDE LA ENTRADA DE LOS TURCOS HASTA EL CLUB DE NARCISO BENCOSME	239.00	1.56	1.00	239.00	1.00	371.65	239.00
TRAMO EF		6.70	4.10	1.00	6.70	1.00	27.47	6.70
TRAMO EG		66.50	2.52	1.00	66.50	1.00	167.58	66.50
TRAMO EH					26.50	1.00		26.50
TRAMO EI	CALLE: LOS TURCOS, FRENTE A LA VIVIENDA DEL SR. BARTOLO	44.30	0.78	1.00	44.30		34.55	
TRAMO EJ		67.50	0.80	1.00	67.50	1.00	54.00	67.50
TRAMO EK	SECTOR: LOS TEJADA ARRIBA	160.70	0.90	1.00	160.70	1.00	144.63	160.70
TRAMO EL		39.00	1.14	1.00	39.00	1.00	44.46	39.00
TRAMO EM					33.20	1.00		33.20
Total							3,073.63	1,218.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,209,201.23  
Monto desembolsado RD\$ 4,209,201.24 (100%)  
Avance de obra 163.51%



# LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: MOCA

DISTRITO MUNICIPAL: JUAN LÓPEZ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de junio de 2023



## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 3,073.63 metros cuadrados de aceras y 1,218.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS

1. Esta obra se ejecutó por administración.
2. En el proceso de ejecución en algunos tramos considerables se le colocó malla electrosoldada 20x20
3. En el tramo antes mencionado se colocaron rellenos con un promedio aproximadamente de 0.80 m, de tal manera que fue necesario colocar un muro encachado para contener dicho relleno.

### IMÁGENES

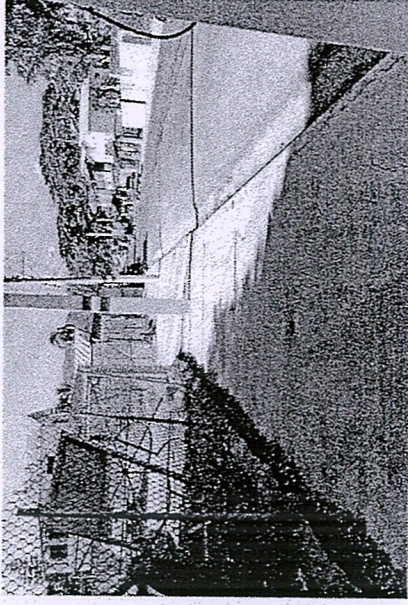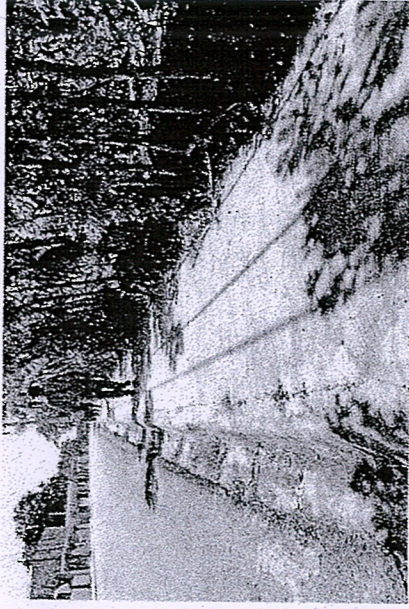



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: MOCA

DISTRITO MUNICIPAL: JUAN LÓPEZ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de junio de 2023



## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 3,073.63 metros cuadrados de aceras y 1,218.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS


1. Esta obra se ejecutó por administración.
2. D2.3, 20 x 20, Rollo 2.4x40 m.
3. En el tramo antes mencionado se colocaron rellenos con un promedio aproximadamente de 0.80 m, de tal manera que fue necesario colocar un muro encachado para contener dicho relleno.

### IMÁGENES

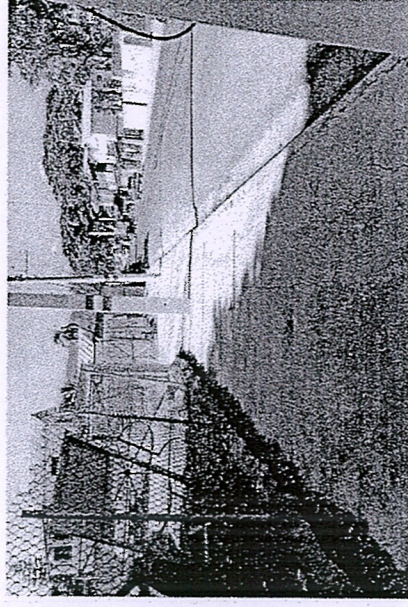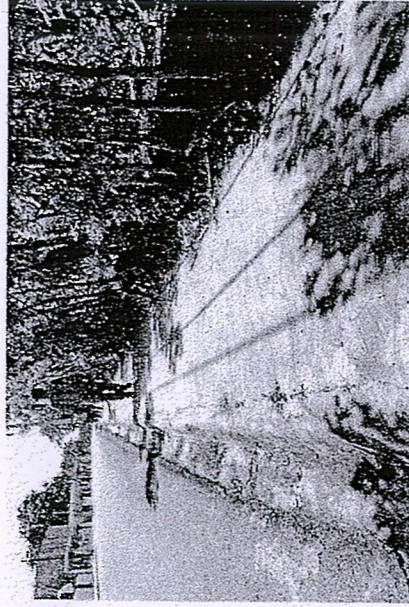



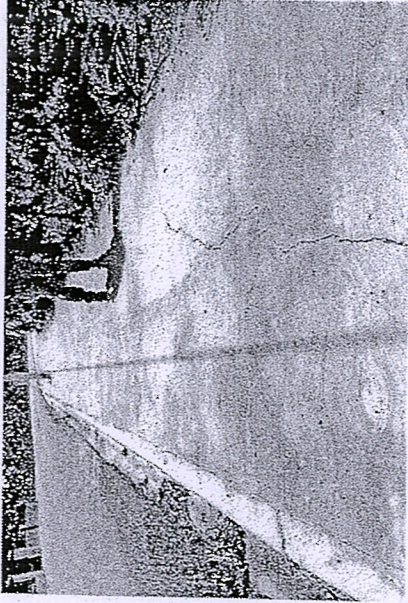

LIGA MUNICIPAL  
DOMINICANA



Suministra los datos de este reporte,

  
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO  
Técnico

  
FELIPE REYES  
Técnico

