

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 200103
REGIÓN: CIBAO NORDESTE
PROVINCIA: SAMANÁ
MUNICIPIO: SAMANÁ
DISTRITO MUNICIPAL: ARROYO BARRIL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de junio de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ Sanchez-Samana	56.00	1.19	1.00	56.00	1.00	66.64	56.00
TRAMO B	C/ Sanchez-Samana	241.88	1.00	1.00	215.40	1.00	241.88	215.40
TRAMO C	C/ Sanchez-Samana	162.69	1.05	1.00	143.10	1.00	170.82	143.10
TRAMO D	C/ Sanchez-Samana	15.50	2.26	1.00	15.50	1.00	35.03	15.50
TRAMO E	C/ Sanchez-Samana	62.90	1.83	1.00	62.90	1.00	115.11	62.90
TRAMO F	C/ Sanchez-Samana	158.10	1.05	1.00	158.10	1.00	166.01	158.10
TRAMO G	Calle del Play (Arroyo Rancho Español)				264.90	1.00		264.90
TRAMO H	SECTOR LA PASCUALA (CALLEJON DE LOS SUAREZ)				117.50	2.00		235.00
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							795.49	1,150.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,800,328.16
 Monto desembolsado RD\$ 3,800,328.16 (100%)
 Avance de obra 108.80%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE
PROVINCIA: SAMANÁ
MUNICIPIO: SAMANÁ
DISTRITO MUNICIPAL: ARROYO BARRIL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de junio de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 795.49 metros cuadrados de aceras y 1,150.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.




NOTAS

1. En fecha de 08/04/2022 se realizó una primera visita a este territorio donde, hasta la fecha, habían construídos 26.6 m2 de aceras y 497.8 ml de contenes.
En fecha de 27/05/2022 se realizó una segunda visita a este territorio donde se midió un total
2. acumulado (incluyendo lo medido en la primera visita) de 795.49 m2 de aceras y 651.00 ml de contenes.
En fecha de 05/08/2022 se realizó una tercera visita a este territorio donde se midió un total
3. acumulado (incluyendo lo medido en las primeras dos visitas) de 795.49 m2 de aceras y 915.90 ml de contenes.
En cuanto al aspecto estructural, los contenes construídos hasta la fecha cumplen con los criterios
4. estipulados. Se le indicó al alcalde mejorar la terminación de los contenes para darle más estética al proyecto.
5. Esta es la cantidad de contenes y aceras construidos hasta el momento de la visita.
6. En fecha del 02/06/2023 se realizó la última visita donde pudimos observar lo construido anteriormente y levantar el restante donde se da por concluido y con un 108.80% dicho programa.




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

IMÁGENES

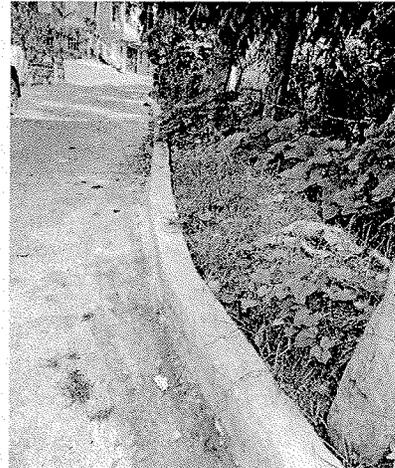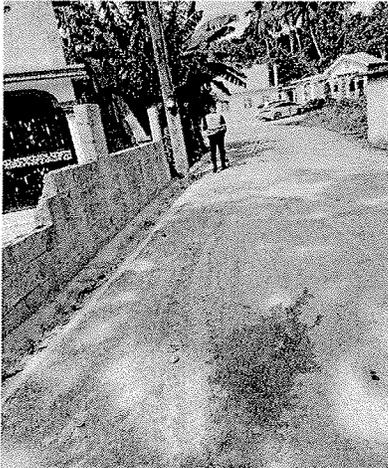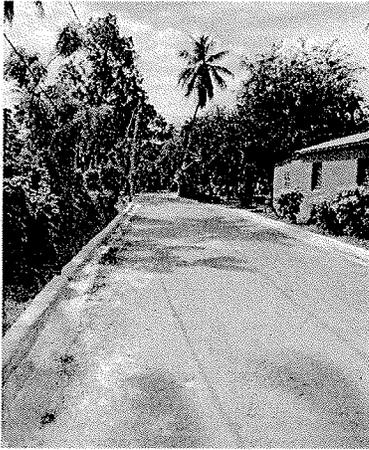

Suministra los datos de este reporte,




ING. ANA INDHIRA RAMÍREZ
Técnico


FELIPE REYES
Técnico
