

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 200103

REGION: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: SAMANÁ

MUNICIPIO: SAMANÁ

DISTRITO MUNICIPAL: ARROYO BARRIL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 27-05-2022


1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Arq. Zúñilda Del Rosario

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ Sanchez-Samana	56.00	1.19	1	56.00	1	66.64	56
TRAMO B	C/ Sanchez-Samana	241.88	1.30	1	215.40	1	241.88	215.4
TRAMO C	C/ Sanchez-Samana	162.69	1.35	1	143.10	1	170.8245	143.1
TRAMO D	C/ Sanchez-Samana	15.50	2.26	1	15.5	1	35.03	15.5
TRAMO E	C/ Sanchez-Samana	62.90	1.33	1	62.9	1	115.107	62.9
TRAMO F	C/ Sanchez-Samana	158.10	1.35	1	158.1	1	166.005	158.1
TRAMO G	Calle del Play (Arroyo Rancho Español)				264.9	1		264.9
TRAMO H								
Total							795.4865	915.9

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado	FD\$ 3,800,328.16
Monto desembolsado	FD\$ 1,900,164.08
Avance de obra	50%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 27-05-2022

PROVINCIA: SAMANÁ

MUNICIPIO: SAMANÁ

DISTRITO MUNICIPAL: ARROYO BARRIL

REPORTE


A la fecha de 27-05-2022 se ha ejecutado 795.49 metros cuadrados de aceras y 915.90 metros lineales de contén, lo que corresponde al 92.24% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. En fecha de 08/04/2022 se realizó una primera visita a este territorio donde, hasta la fecha, habían construidos 26.6 m² de aceras y 497.8 ml de contenes.
2. En fecha de 27/05/2022 se realizó una segunda visita a este territorio donde se midió un total acumulado (incluyendo lo medido en la primera visita) de 795.49 m² de aceras y 651.00 ml de contenes.
3. En fecha de 05/08/2022 se realizó una tercera visita a este territorio donde se midió un total acumulado (incluyendo lo medido en las primeras dos visitas) de 795.49 m² de aceras y 915.90 ml de contenes.
4. En cuanto al aspecto estructural, los contenes construidos hasta la fecha cumplen con los criterios estipulados. Se le indicó al alcalde mejorar la terminación de los contenes para darle más estética al proyecto.
5. Esta es la cantidad de contenes y aceras construidos hasta el momento de la visita.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

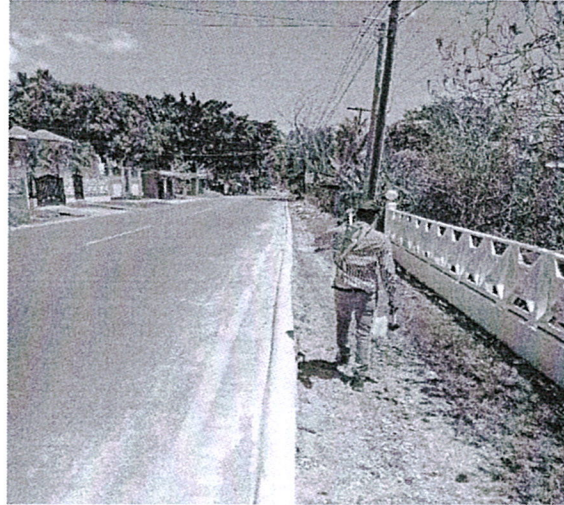

Suministra los datos de este reporte,

Edward A.

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

Zunilda Del Rosario G.

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

