

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 200201

REGION: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: SAMANÁ

MUNICIPIO: SÁNCHEZ

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de abril de 2023

1. Ing. Staylin Mendoza

TÉCNICOS: 2. Arq. Keilyn Mora

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m ²) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|--------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| TRAMO A | SECTOR VILLA IRIS | | | | | | | |
| TRAMO B | CALLE PERPENDICULAR A LA DUARTE | | | | 109.00 | 2 | | 218 |
| TRAMO C | CALLE A | | | | 105.75 | 2 | | 211.5 |
| TRAMO D | CALLE B | | | | 30.60 | 2 | | 61.2 |
| TRAMO E | BARRIO EL PLAY | 76.70 | 1.00 | 1 | 182.3 | 2 | 76.7 | 364.6 |
| TRAMO F | BARRIO EL PLAY A | 4.00 | 1.00 | 1 | 97.5 | 2 | 4 | 195 |
| TRAMO G | BARRIO EL PLAY B | 32.90 | 1.18 | 2 | 138.2 | 2 | 77.644 | 276.4 |
| TRAMO H | BARRIO EL PLAY C | 14.05 | 0.9 | 2 | 15.15 | 2 | | 30.3 |
| TRAMO I | BARRIO EL PLAY D | | | | 23.8 | 1 | | 23.8 |
| TRAMO J | LA MAJAGUA CALLE DUARTE | 50.00 | 1.03 | 1 | 492 | 1 | 51.5 | 492 |
| Total | | | | | | | 209.84 | 1872.80 |


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,264,679.42

Monto desembolsado RD\$ 2,632,339.71 (50%)

Avance de obra 100.55%

LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: SAMANA

MUNICIPIO: SANCHEZ

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 209,84 metros cuadrados de aceras y 1,872,80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Estas aceras y contenes cumplieron con el programa en cuanto a la ejecución total.
2. Pero pudimos notar que la terminación de la batea estan en la mayoría de los casos con mala terminación.



IMÁGENES


Suministra los datos de este reporte,

Técnico

ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

ARQ. KEILIN MORA

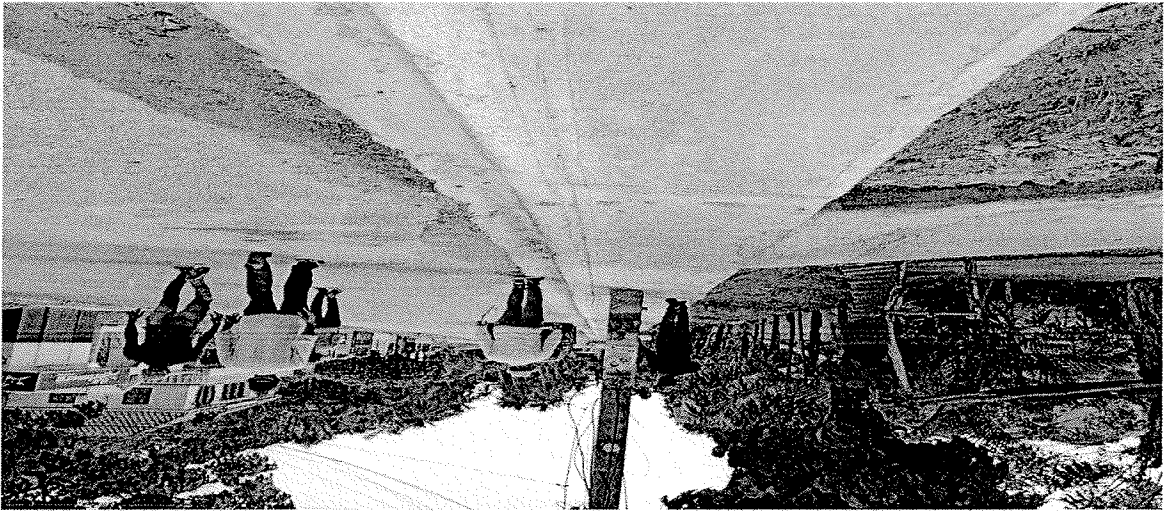

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

