



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 200101

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: SAMANÁ

MUNICIPIO: SAMANÁ

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de julio de 2022

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ SANTA BARBARA (CASCO URBANO)	172.80	2.05	1	172.80	1	354.24	172.8
TRAMO B	C/ MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	59.80	2.11	1	59.80	1	126.3275	59.8
TRAMO C	C/ MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	40.00	2.06	1	40.00	1	82.41666667	40
TRAMO D	C/ CRISTÓBAL COLON	138.00	2.06	1	138	1	284.5770833	138
TRAMO E	C/ MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	89.40	2.06	1	89.4	1	184.5375347	89.4
TRAMO F	C/ M. TRINIDAD SÁNCHEZ - AV. CIRCUNVALACIÓN	184.30	2.08	1	184.3	1	383.5570435	184.3
TRAMO G	FCO. ROSARIO SÁNCHEZ - AVE. CIRCUNVALACIÓN	148.80	2.11	1	148.8	1	314.4204063	148.8
TRAMO H	C/ FRCO. ROSARIO SÁNCHEZ	176.80	2.23	1	176.8	1	395.0320901	176.8
TRAMO I	AV. MALECÓN	101.80	2.23	1	101.8	1	227.45626	101.8
TRAMO J	CARR. LA ENTRADA ALGARROBO				682.2	2		1364.4
Total							2352.56	2476.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 6,206,822.76

Monto desembolsado RD\$ 6,206,822.76 (100%)

Avance de obra 156.98%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de julio de 2022

PROVINCIA: SAMANÁ

MUNICIPIO: SAMANÁ

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,352.56 metros cuadrados de aceras y 2,476.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. La ejecución de la obra es vía gobierno local.
2. La calidad de la terminación cumple con las normas sugeridas para estos fines.
3. En el Casco Urbano el ancho de las aceras es variable, de 1.80 m, 2.50m y 3.30 m en algunos tramos.
4. En la zona de Los Algarrobos, la Empresa Distribuidora de Electricidad (EDE) ha subido sus camiones en los contenes provocando daños en éstos.

IMÁGENES

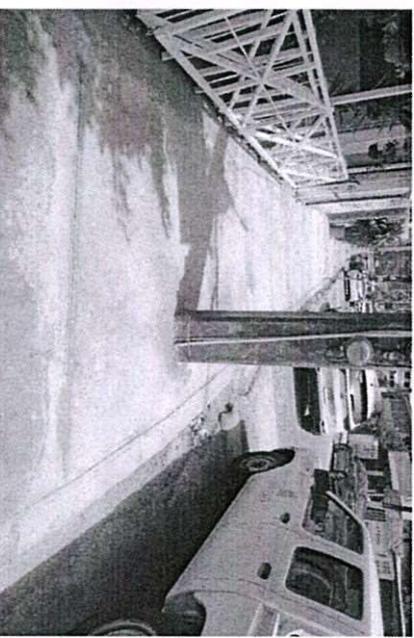



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

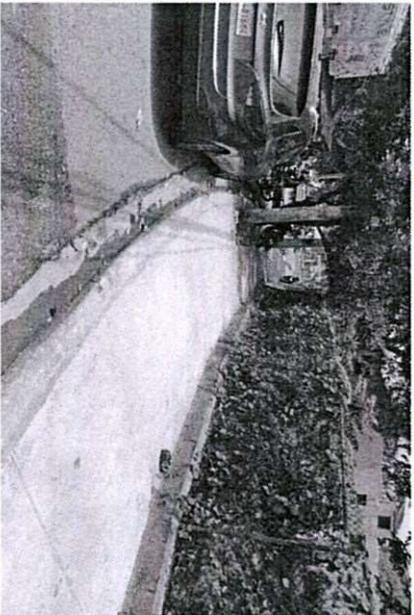

Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILLO MERCADO
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

