

# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 060301  
**REGIÓN:** CIBAO NORDESTE  
**PROVINCIA:** DUARTE  
**MUNICIPIO:** CASTILLO  
**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 26 de julio de 2022


1. Ing. Edward Acosta

**TÉCNICOS:**

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/PRINCIPAL	102.10	1.00	1	102.10	1	102.1	102.1
TRAMO B	C/Principal	48.30	0.70	1	48.30	1	33.81	48.3
TRAMO C	C/Principal	94.70	1.00	1	94.70	1	94.7	94.7
TRAMO D	C/Principal	25.40	1.18	1	25.4	1	29.972	25.4
TRAMO E	C/Principal	39.40	0.90	1	39.4	1	35.46	39.4
TRAMO F	C/Principal				51	1		51
TRAMO G	C/PRINCIPAL				55.8	1		55.8
TRAMO H	C/Principal	231.00	0.95	1	231	1	219.45	231
TRAMO I	Prolongacion Jaraguata	351.00	1.00	2	351	2	702	702
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>1217.49</b>	<b>1349.70</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,310,280.73  
Monto desembolsado RD\$ 4,310,280.73 (100%)  
Avance de obra 121.23%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** CIBAO NORDESTE

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 26 de julio de 2022

**PROVINCIA:** DUARTE

**MUNICIPIO:** CASTILLO

**DISTRITO MUNICIPAL:** -

## **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,217.49 metros cuadrados de aceras y 1,349.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.


### **NOTAS**

1. Las aceras y contenes medidos durante la inspeccion cumplen con las especificaciones de calidad que demanda la zona.




2. Este informe pretende justificar el cierre de los primeros fondos asignados al Ayuntamiento de Castillo, reuniendo las volumetrias levantadas por los técnicos del Depto. De Asesoría y Construcciones Municipales en la visita realizada el pasado 7 de julio del año 2022 y la volumetría levantada y suministrada por la supervisión efectuada por el CODIA en fecha del pasado 18 de julio 2022.

### **IMÁGENES**





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

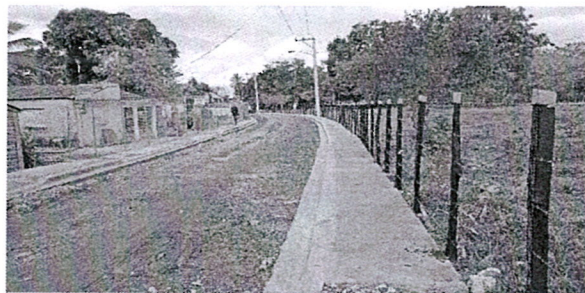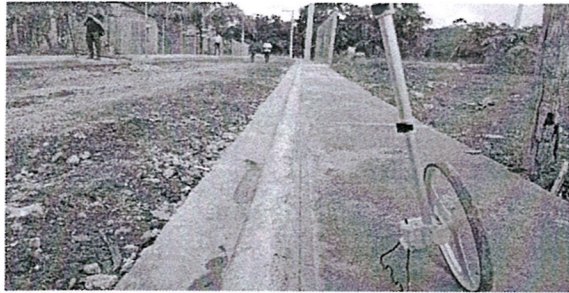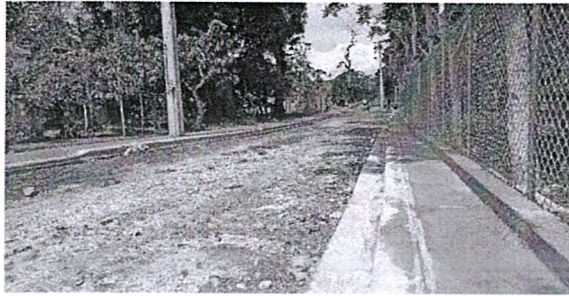

Suministra los datos de este reporte,

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

Técnico

