



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 020109
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: AZUA
MUNICIPIO: AZUA
DISTRITO MUNICIPAL: LAS LOMAS


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 30 de mayo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SEC. LA CABULLITA C/ 3ERA				89.20	1.00		89.20
TRAMO B	SEC. LA CABULLITA C/ 3ERA				104.30	1.00		104.30
TRAMO C	LA YAYITA, SEC. LOS TOCONES C/ DEL PLAY				275.60	1.00		275.60
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							-	469.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,032,904.85
Monto desembolsado RD\$ 1,516,452.43 (50%)
Avance de obra 39.80%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: AZUA

DISTRITO MUNICIPAL: LAS LOMAS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 30 de mayo de 2023



INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 30/05/2023 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 469.10 metros lineales de contén, lo que corresponde al 39.8% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS



1. Este gobierno local esta construyendo por contrato
2. Lo presentado en este reporte de inspección es lo construido hasta el momento

IMÁGENES

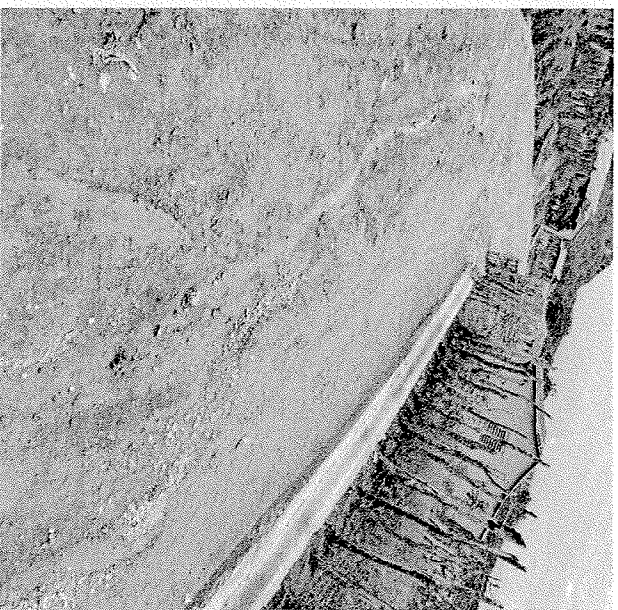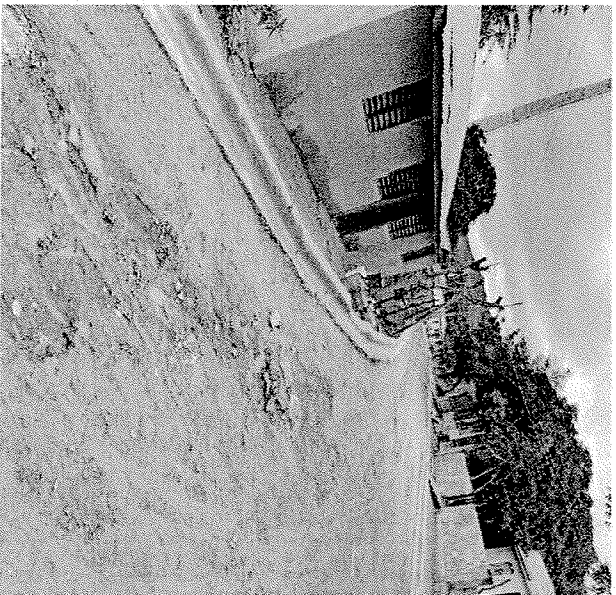



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

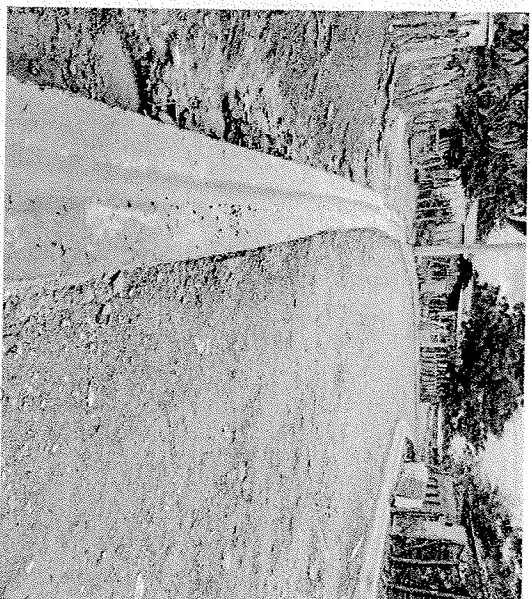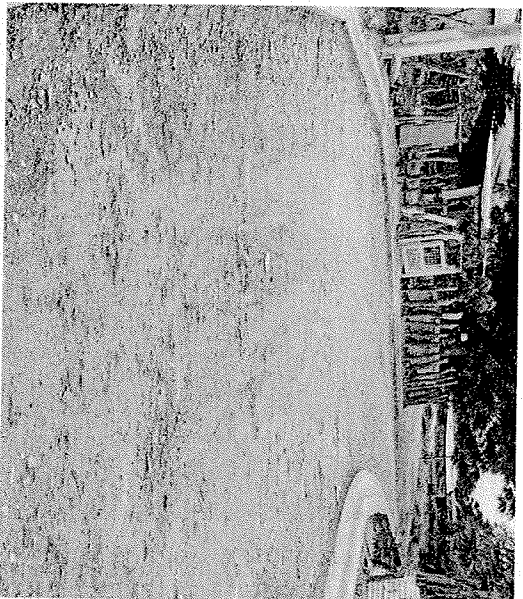

Suministra los datos de este reporte.

ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico

CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

