

**LIGA MUNICIPAL
-- DOMINICANA --**

Santo Domingo, D.N.
07 de febrero de 2024

Al:

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto:

Remisión de informe de Avance de Cambita Garabito.

En la visita técnica realizada el 24 de enero de 2024 se validó la ejecución de 1,416.23 metros cuadrados de aceras y 1,355.80 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.


La supervisión externa ha validado la ejecución de 490.40 metros cuadrados de aceras y 312 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,906.63 metros cuadrados de aceras y 1,667.8 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 90 % de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz

Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 210401 **REGIÓN:** VALDESIA **PROVINCIA:** SAN CRISTÓBAL **MUNICIPIO:** CAMBITA GARABITOS **DISTRITO MUNICIPAL:** -
FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de enero de 2024 **TÉCNICOS:** 1. Ing. Staylin Mendoza | 2. Felipe Reyes

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A | LA TORONJA | 258.20 | 1.02 | 1.00 | 239.00 | 1.00 | 263.36 | 239.00 |
| TRAMO B | LA TORONJA | 113.80 | 1.00 | 1.00 | 113.80 | 1.00 | 113.80 | 113.80 |
| TRAMO C | LA TORONJA | 133.00 | 1.00 | 1.00 | 133.00 | 1.00 | 133.00 | 133.00 |
| TRAMO D | LA TORONJA | 45.00 | 3.06 | 1.00 | | | | 137.70 |
| TRAMO E | LA TORONJA | 92.80 | 1.00 | 1.00 | 110.70 | 1.00 | 92.80 | 110.70 |
| TRAMO F | EL CAJON | 71.40 | 1.00 | 2.00 | 71.40 | 2.00 | 142.80 | 142.80 |
| TRAMO G | EL CAJON | 73.40 | 1.00 | 2.00 | 73.40 | 2.00 | 146.80 | 146.80 |
| TRAMO H | EL CAJON | 47.80 | 1.15 | 1.00 | 69.35 | 2.00 | 54.97 | 138.70 |
| TRAMO I | EL MURO | 165.50 | 1.00 | 2.00 | 165.50 | 2.00 | 331.00 | 331.00 |
| Total | | | | | | | 1,416.23 | 1,355.80 |

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
 Monto asignado RD\$ 4,846,696.17
 Monto desembolsado RD\$ 4,846,696.18 (100%)
 Avance de obra 109.64%



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: CAMBITA GARABITOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de enero de 2024

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,416.23 metros cuadrados de aceras y 1,355.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Los trabajos están siendo ejecutados por contrato
2. Tienen buena terminación tanto las aceras como los contenes.
3. El tramo D, las aceras fueron construidas en la calzada.
4. Los tramos F Y G, las aceras fueron construidas en la calzada.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

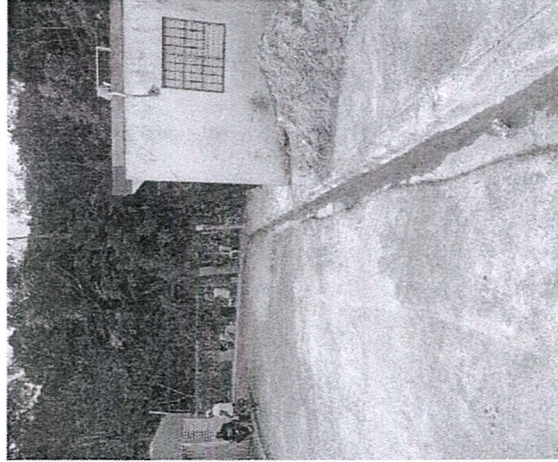

Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico



FÉLIPE REYES

Técnico



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SAN CRISTOBAL

MUNICIPIO: CAMBITA GARABITO

DISTRITO MUNICIPAL: _____

BARRIO Y/O SECTOR: _____

EL CAJON,CALLE LA TRINITARIA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social

RNC ó

Cédula:

CORPO MONTERO ENCARNACION

099-0002195-9

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)


- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

AYUNTAMIENTO DE CAMBITA

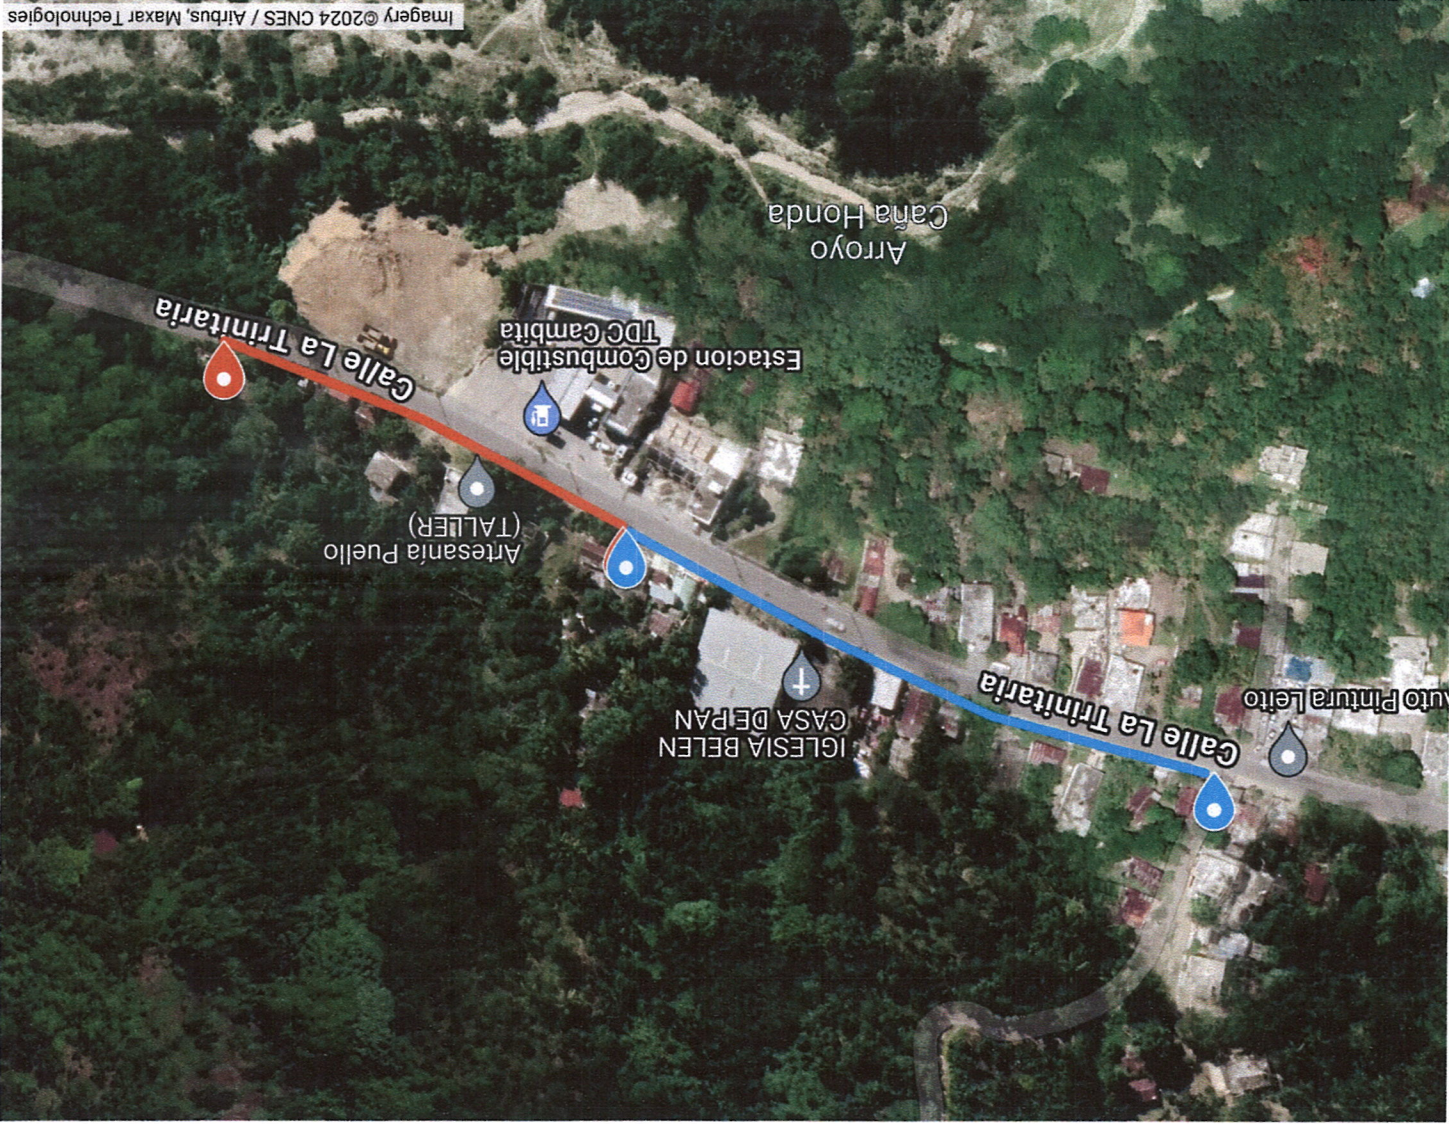

Capa sin título

- INICIO A
- TRAMO A
- FINAL TRAMO A
- INICIO TRAMO B
- TRAMO B
- TRAMO B
- TRAMO B

levantamiento de acera y
contenes



TRAMO A



TRAMO B

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- cumple con plantilla parámetro de construcción y calidad en Hormigon
- tambien cumple con el ancho requerido para la zona urbana.


6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO: Alis Joel Mercedes Urbatec
FIRMA: [Firma manuscrita]
CÉDULA: 402-2112386-8
CODIA: 35877
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA: 01/12/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



[Firma manuscrita]
Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal
