



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 220109

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: SAN JUAN

DISTRITO MUNICIPAL: LAS MAGUANAS-HATO NUEVO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de febrero de 2023


1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Sec. Pasatiempo C/ principal				20.20	2.00		40.40
TRAMO B	Sec. Pasatiempo C/ principal				19.40	2.00		38.80
TRAMO C	Sec. Pasatiempo C/ principal				19.20	2.00		38.40
TRAMO D	Sec. Pasatiempo C/ principal				89.15	2.00		178.30
TRAMO E	maguana al medio C/fausto ramirez				79.70	2.00		159.40
TRAMO F	Frente al centro educativo maguana	36.05	1.00	1.00	36.05	1.00		36.05
TRAMO G	Al medio C/ Virgilio Romero				73.60	2.00		147.20
TRAMO H	Al medio C/ Virgilio Romero				16.00	1.00		16.00
TRAMO I	Sec. Higuero C/ principal				73.40	2.00		146.80
TRAMO J	Frente al centro de primer nivel	143.25	1.00	2.00	143.25	2.00	286.50	286.50
TRAMO DL								
Total							286.50	1,087.85

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,169,665.84
Monto desembolsado RD\$ 3,169,665.84 (100%)
Avance de obra 97.18%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de febrero de 2023

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: SAN JUAN

DISTRITO MUNICIPAL: LAS MAGUANAS-HATO NUEVO



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 286.50 metros cuadrados de aceras y 1,087.85 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



- 1.** Este ayuntamiento ejecuto por contrato.
- 2.** Lo visto hasta el momento cumple con los parametros exigido.
- 3.** En dicho levantamiento estuvieron presente el Director municipal.

IMÁGENES

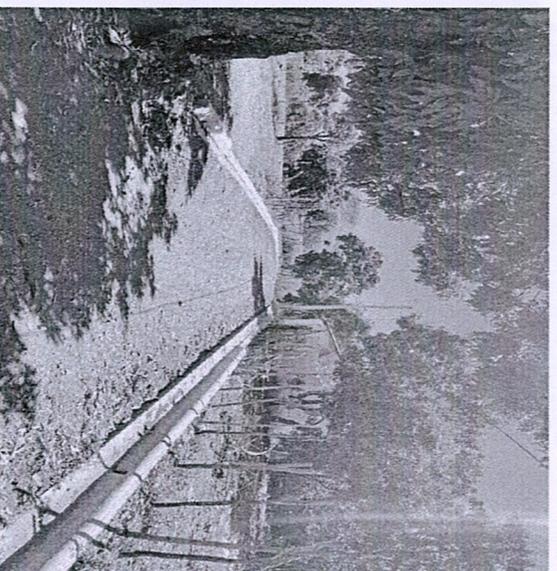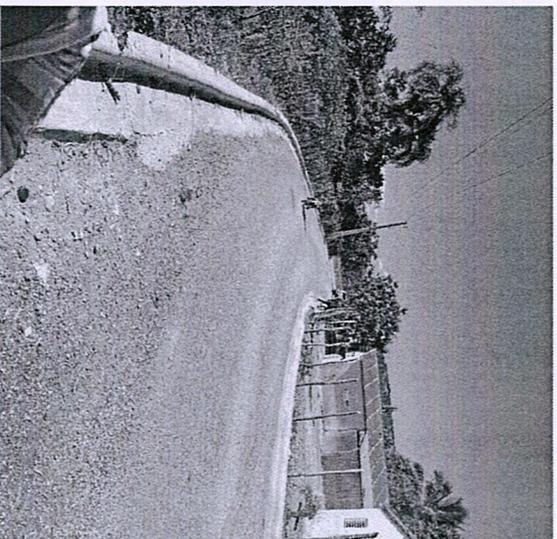



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

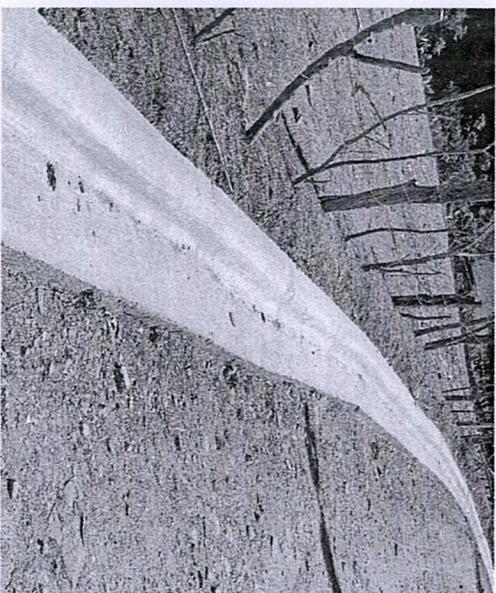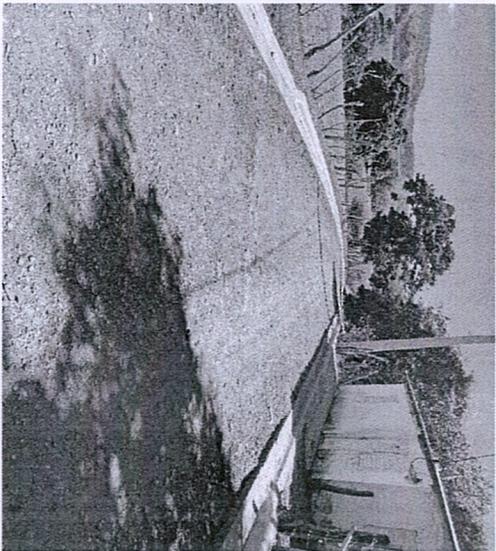

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMIREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

