



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 190102

**REGIÓN:** CIBAO NORDESTE

**PROVINCIA:** HERMANAS MIRABAL

**MUNICIPIO:** SALCEDO

**DISTRITO MUNICIPAL:** JAMAO AFUERA

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 22-04-2022

1. Ing. Richard Cabrera

**TÉCNICOS:** 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	RAFAEL VASQUEZ	23.20	1.00	1.00	205.90	1.00	23.20	205.90
TRAMO B	LA ECOLOGICA				203.00	2.00		406.00
TRAMO C	LA ECOLOGICA				212.80	2.00		425.60
TRAMO D	LA ECOLOGICA				350.00	1.00		350.00
<b>Total</b>							<b>23.20</b>	<b>1,387.50</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,067,610.25

Monto desembolsado RD\$ 3,067,610.26 (100%)

Avance de obra 122.14%



**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** CIBAO NORDESTE  
**PROVINCIA:** HERMANAS MIRABAL  
**MUNICIPIO:** SALCEDO  
**DISTRITO MUNICIPAL:** JAMAO AFUERA


**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 22-04-2022

#### **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 23.20 metros cuadrados de aceras y 1,387.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

#### **NOTAS**



1. Esta es la cantidad de metros de contén y metros cuadrados de aceras construidos hasta el momento de la visita.

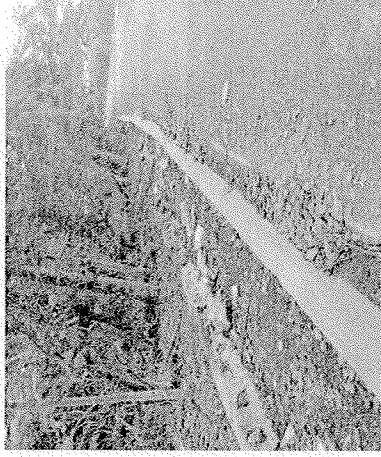


**IMÁGENES**



LIGA MUNICIPAL  
—DOMINICANA—

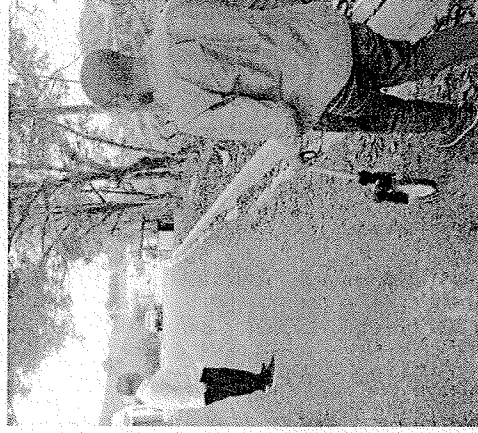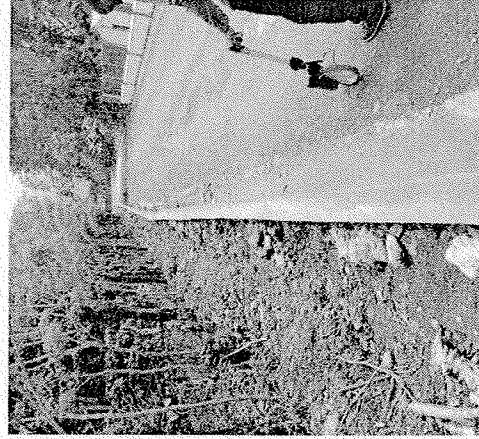



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA  
Técnico

ING. STAYLIN MENDOZA  
Técnico

