

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 130201

REGIÓN: CIBAO SUR

PROVINCIA: LA VEGA

MUNICIPIO: CONSTANZA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de enero de 2025

1. Arq. Keilin Mora

TÉCNICOS: 2. Ing. Félix Tavárez

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	ENTRADA EL EVANGELICO	41.60	0.76	2.00	68.90	2.00	63.56	137.8
TRAMO B	ENTRADA EL EVANGELICO	19.10	0.40	1.00	80.80	2.00	7.64	161.6
TRAMO C	ENTRADA EL EVANGELICO	39.95	0.83	2.00	45.35	2.00	65.94	90.7
TRAMO D	CIRIACO RAMIREZ (MATA DE MANGO)	245.60	1.00	2.00	245.60	2.00	491.2	491.2
TRAMO E	CIRIACO RAMIREZ CALLEJON 1 (MATA DE MANGO)				123.30	2.00		246.6
TRAMO F	ALTO CERRO (SECTOR COLONIA)	153.55	1.47	2.00	116.75	2.00	451.437	233.5
TRAMO G	C/GREGORIO LUPERON (SECT. EL CERCADO)	98.3	0.62	2.00	227.75	2.00	121.892	455.5
TRAMO H	C/CIPRIAN	60.7	0.57	1.00	102.8	1.00	34.599	102.8
TRAMO I	AV. MELLA C/ DEL CORONEL				208.3	1.00		208.3
TRAMO J								
Total							1236.27	2128.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 6,368,528.27
Monto desembolsado RD\$ 3,184,264.14 (50%)
Avance de obra 107.13%



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

PROVINCIA: LA VEGA

MUNICIPIO: CONSTANZA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de enero de 2025



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,236.27 metros cuadrados de aceras y 2,128.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. La terminación de las aceras y contenes son de buena calidad.
2. La ejecución de la obra fue por administración.
3. Completaron a su totalidad el programa, dando cierre al mismo.

IMÁGENES

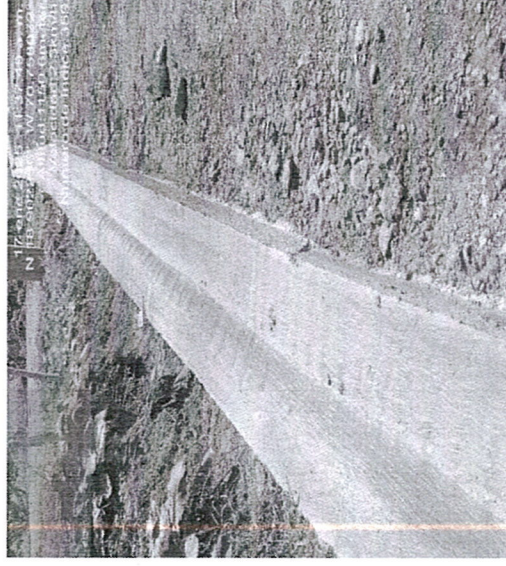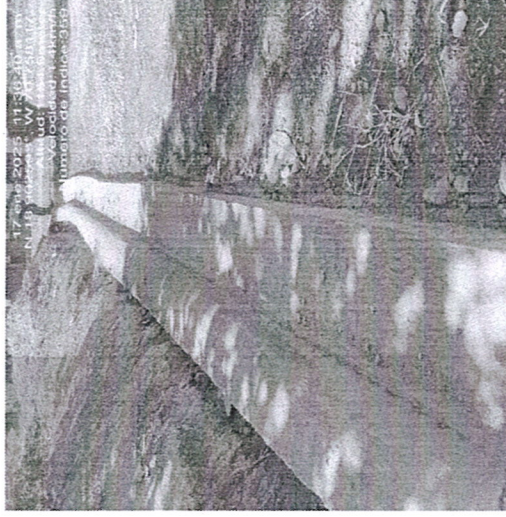



LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—



Suministra los datos de este reporte,




ARQ. KEILIN MORA

Técnico


ING. FÉLIX TAVÁREZ

Técnico

