



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 210503
 REGIÓN: VALDESIA
 PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL
 MUNICIPIO: VILLA ALTAGRACIA
 DISTRITO MUNICIPAL: MEDINA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de junio de 2023
 1. Ing. Danilo Mercado
 TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LOMA VERDE				15.20	1.00		15.20
TRAMO B	LOMA VERDE				56.30	1.00		56.30
TRAMO C	LOMA VERDE				58.00	1.00		58.00
TRAMO D	LOMA VERDE	16.40	0.80	1.00	16.40	1.00	13.12	16.40
TRAMO E	ENTRADA DE CASTAÑO	36.60	0.82	1.00			30.01	
TRAMO F	ENTRADA DE CASTAÑO	48.00	1.13	1.00			54.24	
TRAMO G	CALLE DE JESUS				28.00	1.00		28.00
TRAMO H	CALLE DE JESUS				28.30	1.00		28.30
TRAMO I	ENTRADA DE CASTAÑO	49.20	1.00	1.00	9.20	1.00	49.20	9.20
TRAMO J	ENTRADA DE CASTAÑO				340.30	2.00		680.60
TRAMO K	LOS REYNOSO				62.10	1.00		62.10
TRAMO L	SUPER COLMADO JK				20.10	1.00		20.10
TRAMO M	CALLE DEL JK				34.00	1.00		34.00
TRAMO N	LOS REYNOSO				39.50	1.00		39.50
TRAMO O	LOS REYNOSO				27.30	1.00		27.30
TRAMO P	LOS REYNOSO				122.60	1.00		122.60
TRAMO Q	PEDRERO				306.40	2.00		612.80
Total							146.57	1,810.40

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,372,909.38
 Monto desembolsado RD\$ 3,372,909.38 (100%)
 Avance de obra 143.72%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de junio de 2023

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: VILLA ALTAGRACIA

DISTRITO MUNICIPAL: MEDINA

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 146.57 metros cuadrados de aceras y 1,810.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Este distrito ejecutó por contrato.
Se pudo observar demoliciones, corte de terreno, remoción de empalizada, telford y corte de árboles,
2. esto con la finalidad de ampliar de la vía.
3. Esta obra cumple con los estándares de calidad recomendado por el programa.


IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

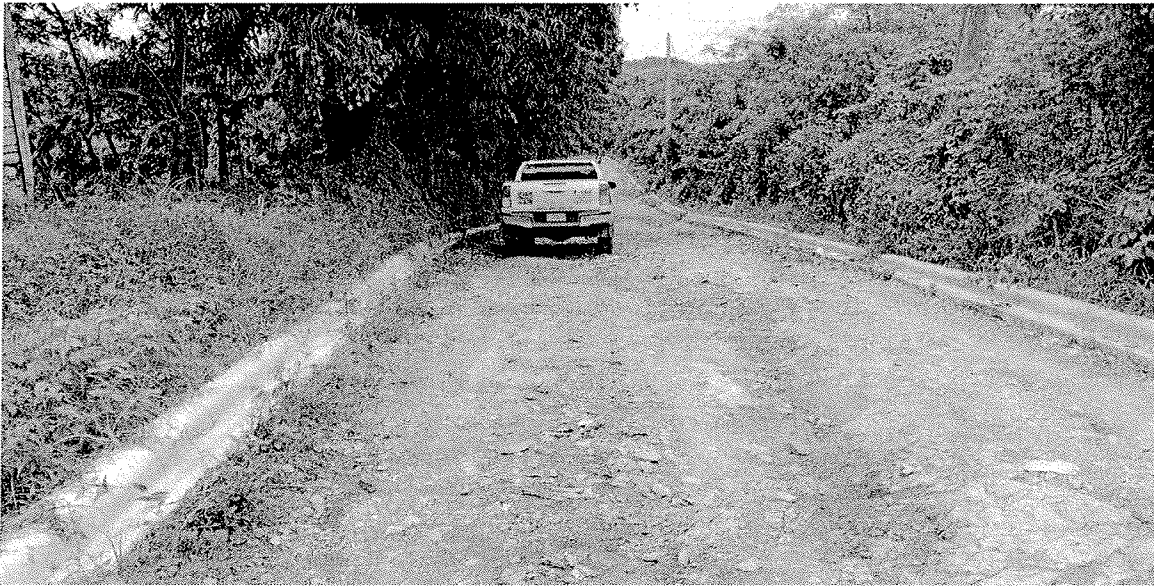





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILO MERCADO
Técnico


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

