



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 210503

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: VILLA ALTAGRACIA

DISTRITO MUNICIPAL: MEDINA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 10 de mayo de 2022


1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LOMA VERDE				15.20	1		15.2
TRAMO B	LOMA VERDE				56.30	1		56.3
TRAMO C	LOMA VERDE				58.00	1		58
TRAMO D	LOMA VERDE	16.40	0.80	1	16.4	1	13.12	16.4
TRAMO E	ENTRADA DE CASTAÑO	36.60	0.82	1			30.012	
TRAMO F	ENTRADA DE CASTAÑO	48.00	1.13	1			54.24	
TRAMO G	CALLE DE JESUS				28	1		28
TRAMO H	CALLE DE JESUS				28.3	1		28.3
TRAMO I	ENTRADA DE CASTAÑO	49.20	1.00	1	9.2	1	49.2	9.2
TRAMO J	ENTRADA DE CASTAÑO				340.3	2		680.6
TRAMO K	LOS REYNOSO				62.1	1		62.1
TRAMO L	SUPER COLMADO JK				20.1	1		20.1
TRAMO M	CALLE DEL JK				34	1		34
TRAMO N	LOS REYNOSO				39.5	1		39.5
TRAMO O	LOS REYNOSO				27.3	1		27.3
TRAMO P	LOS REYNOSO				122.6	1		122.6
Total							146.572	1197.6

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado	RD\$ 3,372,909.38	
Monto desembolsado	RD\$ 1,686,454.69	50%
Avance de obra	96.97%	



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL
MUNICIPIO: VILLA ALTAGRACIA
DISTRITO MUNICIPAL: MEDINA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 10 de mayo de 2022



REPORTE


A la fecha de 10/05/2022 se ha ejecutado 146.57 metros cuadrados de aceras y 1,197.60 metros lineales de contén, lo que corresponde al 96.97% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este distrito esta ejecutando por contrato.
2. Se pueden observar demoliciones, corte de terreno, remoción de empalizada, telford y corte de árboles, esto con la finalidad de ampliar de la vía.
3. Se puede observar el buen estado de los contenes y acera ejecutada hasta el momento.
4. El director nos informa que seguirá ejecutando contenes para así cubrir las demás localidades que están a la espera de estos.

IMÁGENES

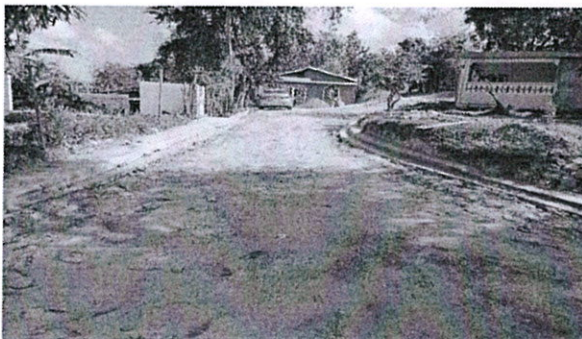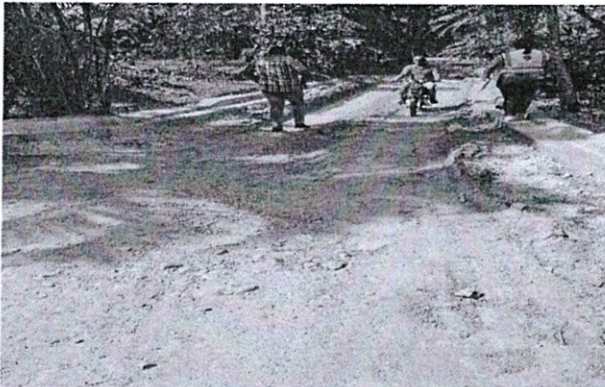




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico


ELIZABETH GARCÍA

Técnico





JUNTA MUNICIPAL MEDINA

Trabajando de la Mano con el Pueblo

Rnc.:430058238

Sindicatura



Distrito Municipal Medina, Mun. Villa Altagracia,
Prov. San Cristóbal, R.D.
01 de Julio 2022

Al: **Ing. Valentin Santos Garcia**
SubSecretario de apoyo Municipal de Obras Publica,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial.
Su Despacho.

Asunto: Informe sobre el estado del programa en el Aceras y Contenes.

Distinguidos señor:

Respetuosamente, nos dirigimos a usted y a la institución que dignamente representa, con la finalidad de saludarle y al tiempo remitirle un informe sobre el estado del programa en el Aceras y Contenes en este Distrito Municipal Medina hemos construido un total de 1,202.2 Metros Lineales de contenes y 146.69 m² de aceras de los cuales en la sección castaño se realizó la construcción de **SEISCIENTOS SESENTA (660) metros lineales de contenes** y **OCHENTA Y SEIS PUNTO NOVENTA (86.90) metros de aceras**, con un monto de Un Millón Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Ocho pesos con Treinta y Tres Centavos (RD\$1,499,968.33) y en la sección de Loma Verde en la calle principal Los Mejía y los reinoso se construyó **QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PUNTO CERO DOS (542.02) Metros Lineales** y **CINCUENTA Y NUEVE PUNTO SETENTA Y NUEVE (59.79) de Aceras** de donde se realizó un pago Inicial de RD\$190,000.00 pesos.


La modalidad de ejecución de dicha obra ha sido mediante contrato al ingeniero contratista **ABEL ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ**, ya que contamos con el portal DGCP y dentro la propuesta recibida fue la que más se ajustó con el pliego de condiciones demandadas.

Anexos:

Copia de reporte de la supervisión de la LMD
Carta recibida por la Liga Municipal donde solicita dicho informe

Dándole las gracias de antemano, le saludan por la Junta Municipal,

Atentamente:


Sr. Wandy Tomas Nivar Brito
Director Municipal





**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
20 de junio de 2022

SAOPPOT-752-2022

Al: Señor
Wandy Tomas Nivar Brito
Director
Distrito Municipal de Medina
Su Despacho

Asunto: **Solicitud de informe estado del programa de construcción de aceras y contenes en su territorio**

Luego de un cordial saludo le estamos solicitando, en el marco del programa de Apoyo a los Gobiernos Locales para Obras de infraestructuras de Competencia Municipal, para la construcción de aceras y contenes, un informe sobre el estado de la obra de construcción para la cual se les ha suministrado fondos. Dicho informe debe de estar debidamente firmado y sellado por la autoridad competente y debe de contener las siguientes informaciones;

Modalidad de ejecución de la obra utilizada: Si realizaron una licitación a través del portal de la DGCP, si están ejecutando por administración directa u otra forma (Dar detalles).

Estatus de ejecución de la obra: Si han iniciado o están en proceso (En caso de no haber iniciado indicar razones)

Estatus de los fondos recibidos: Si están ejecutando, indicar si han agotado los fondos transferidos a la fecha. (en caso de haber recibido y ejecutado el 50% de los fondos asignados, deben de solicitar la cubicación por escrito para proceder a transferir el resto de los fondos)

Agradeciendo de antemano la acogida a esta solicitud, la cual permitirá eficientizar la ejecución de manera satisfactoria del referido programa.

Sin otro particular por el momento, le saluda,
Muy atentamente,


Ing. Valentin Santos Garcia
Subsecretario

Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial

