

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 220203

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: BOHECHÍO

DISTRITO MUNICIPAL: YAQUE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de febrero de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE PRINCIPAL(LATERAL DERECHO)	141.60	1.00	1	141.60	1	141.6	141.6
TRAMO B	CALLE PRINCIPAL	167.90	1.00	1	167.90	1	167.9	167.9
TRAMO C	CALLE PRINCIPAL				10.90	1		10.9
TRAMO D	CALLE PRINCIPAL				234.50	1		234.5
TRAMO E	CALLE PRINCIPAL	121.10	1.00	1	121.1	1	121.1	121.1
TRAMO F	CALLE PRINCIPAL				29.5	1		29.5
TRAMO G	CALLE PRINCIPAL				11.7	1		11.7
TRAMO H	CALLE PRINCIPAL				37	1		37
TRAMO I	CALLE PRINCIPAL	87.20	1.00	1	87.2	1	87.2	87.2
TRAMO J	CALLE PRINCIPAL				20	1		20
TRAMO DL	CALLE PRINCIPAL	102.65	1.00	1	102.65	1	102.65	102.65
TRAMO DM	CALLE PRINCIPAL				35.3	1		35.3
TRAMO DN	CALLE PRINCIPAL	153.40	1.00	1	153.4	1	153.4	153.4
TRAMO DO	CALLE PRINCIPAL				72.5	1		72.5
Total							773.85	1225.25

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,060,126.90

Monto desembolsado RD\$ 3,060,126.91 (100%)

Avance de obra 131.53%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN: EL VALLE**  
**PROVINCIA: SAN JUAN**  
**MUNICIPIO: BOHECHÍO**  
**DISTRITO MUNICIPAL: YAQUE**

**FECHA DE VISITA TÉCNICA: 0 de enero de 1900**



## **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 773.85 metros cuadrados de aceras y 1,225.25 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## **NOTAS**


1. Este distrito esta ejecutando por administración.
2. Se puede apreciar los contenes y aceras con su pendiente correcta y altura adecuada con respeto al nivel de la calle.
3. Tienen ejecutado los sectores Guayuyal y Corocito.
4. En este levantamiento estuvieron presente las autoridades municipales.

## **IMÁGENES**

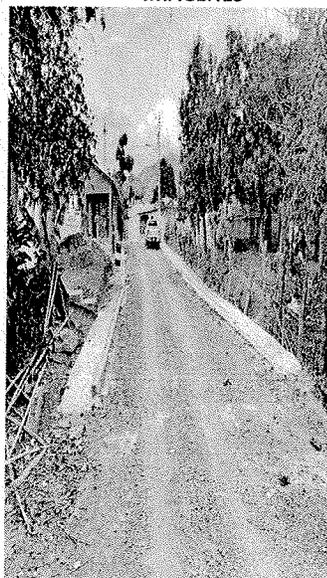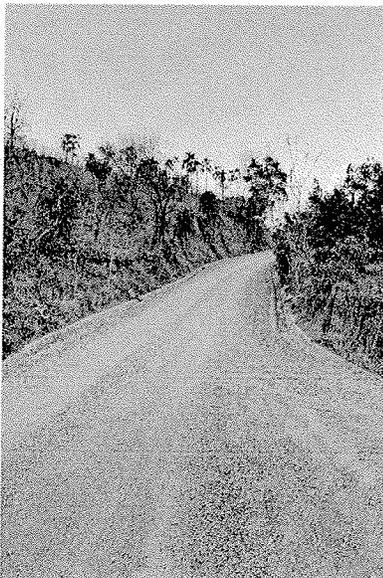




LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

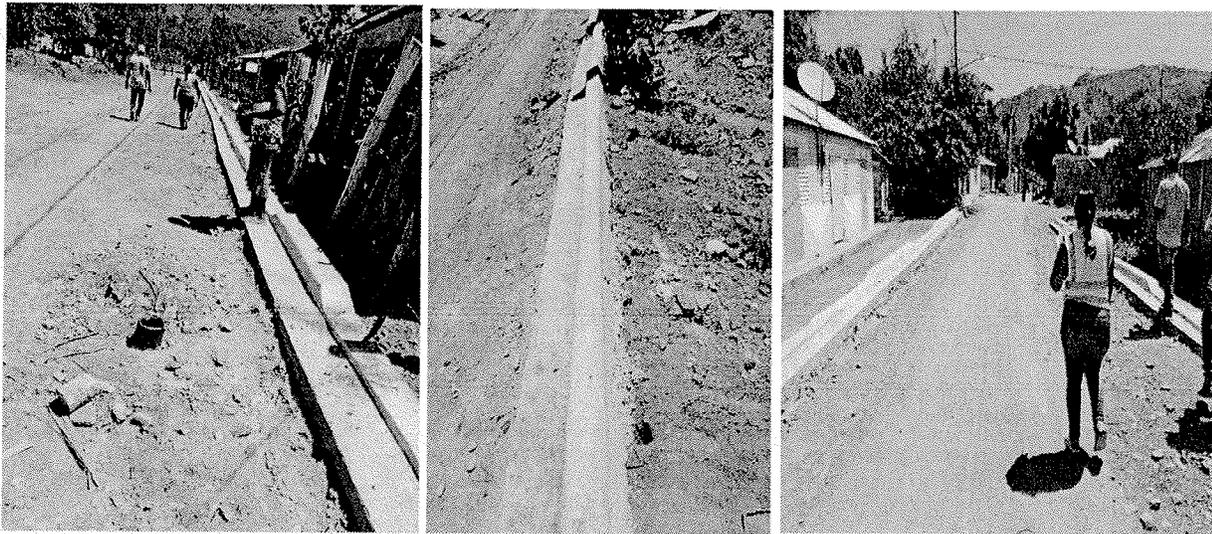

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ  
Técnico

  
CÉSAR DE LOS SANTOS  
Técnico
