



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 230201

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS

MUNICIPIO: LOS LLANOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 26 de mayo de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A | SECTOR EL LICEO | 92.90 | 1.00 | 2.00 | 92.90 | 2.00 | 185.80 | 185.80 |
| TRAMO B | SECTOR EL LICEO | 34.00 | 1.00 | 2.00 | 34.00 | 2.00 | 68.00 | 68.00 |
| TRAMO C | SECTOR EL LICEO | | | | 98.50 | 1.00 | | 98.50 |
| TRAMO D | SECTOR EL LICEO | 237.30 | 1.00 | 2.00 | 237.30 | 2.00 | 474.60 | 474.60 |
| TRAMO E | SECTOR EL LICEO | 88.10 | 1.00 | 2.00 | 88.10 | 2.00 | 176.20 | 176.20 |
| TRAMO F | SECTOR EL LICEO | 55.00 | 1.00 | 2.00 | 55.00 | 2.00 | 110.00 | 110.00 |
| TRAMO G | | | | | | | | |
| TRAMO H | | | | | | | | |
| TRAMO I | | | | | | | | |
| TRAMO J | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 1,014.60 | 1,113.10 |

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,222,649.58

Monto desembolsado RD\$ 2,111,324.79 (50%)

Avance de obra 98.89%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS

MUNICIPIO: LOS LLANOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 26 de mayo de 2023


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,014.60 metros cuadrados de aceras y 1,113.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Este Ayuntamiento esta construyo por contrato.
2. Este cumple con los parametros exigidos.
3. Se observan de muy buena calidad.

IMÁGENES

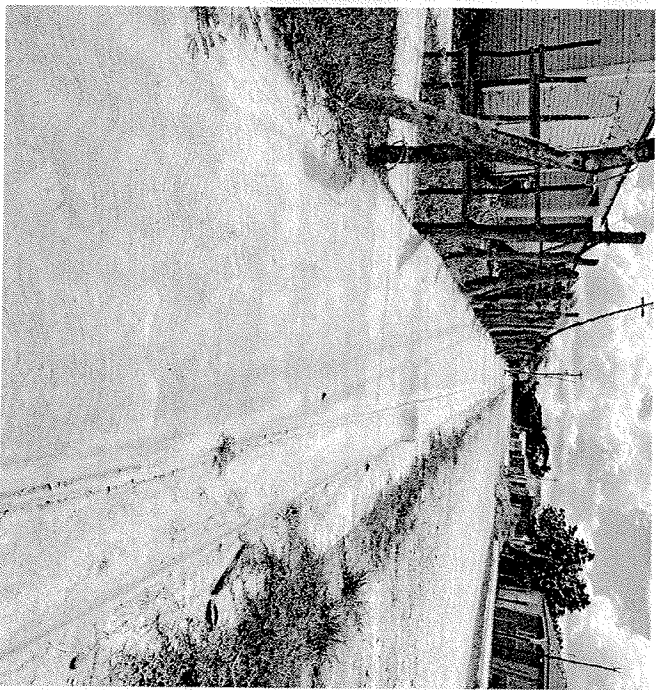




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

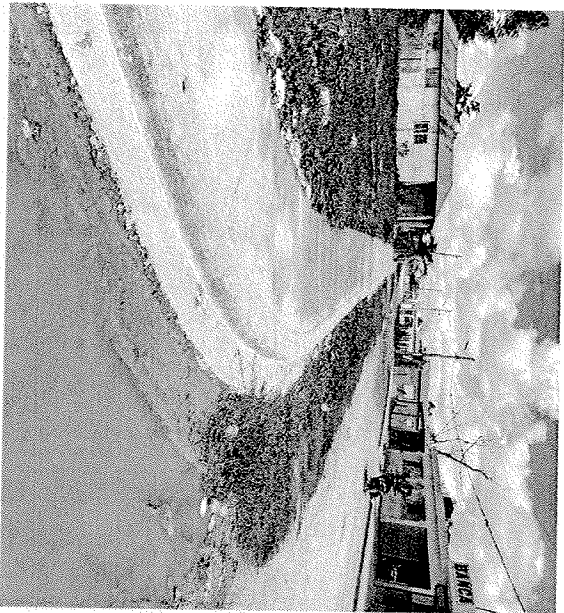

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMÍREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico
