

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 240201  
**REGIÓN:** CIBAO SUR  
**PROVINCIA:** SANCHEZ RAMÍREZ  
**MUNICIPIO:** CEVICOS  
**DISTRITO MUNICIPAL:** -


**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 23 de mayo de 2023

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Danilo Mercado  
 2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LA ALTAGRACIA	43.10	0.86	2.00	51.40	2.00	74.35	102.80
TRAMO B	SECTOR LA ALTAGRACIA	75.70	0.95	2.00	75.70	2.00	144.13	151.40
TRAMO C	SECTOR LA ALTAGRACIA	41.85	0.75	2.00	46.10	2.00	63.03	92.20
TRAMO D	SECTOR LA ALTAGRACIA	41.40	1.08	2.00	41.40	1.00	89.42	41.40
TRAMO E	SECTOR LA ALTAGRACIA	33.80	0.97	1.00	59.70	2.00	32.79	119.40
TRAMO F	SECTOR LA ALTAGRACIA	81.70	1.02	1.00	38.70	2.00	83.33	77.40
TRAMO G	SECTOR LA ALTAGRACIA	21.20	0.98	2.00	21.20	1.00	41.55	21.20
TRAMO H	SECTOR LA ALTAGRACIA	46.30	1.07	2.00	50.10	2.00	99.08	100.20
TRAMO I	SECTOR LA ALTAGRACIA	72.30	1.17	2.00	72.30	2.00	169.18	144.60
TRAMO J	SECTOR LA ALTAGRACIA	52.50	0.76	1.00	52.50	1.00	39.90	52.50
TRAMO K	SECTOR LA ALTAGRACIA	28.30	0.98	1.00	35.20	1.00	27.73	35.20
TRAMO L	LOS SOLARES				27.80	2.00		55.60
TRAMO M	LOS SOLARES	43.40	1.52	2.00	146.30	2.00	131.94	292.60
TRAMO N	LOS SOLARES	16.40	0.98	1.00	16.40	1.00	16.07	16.40
TRAMO O	LOS SOLARES				20.40	2.00		40.80
TRAMO P	LOS SOLARES				60.80	2.00		121.60
TRAMO Q	LOS SOLARES	36.40	0.73	1.00	36.40	1.00	26.57	36.40
TRAMO R	LOS SOLARES	54.40	0.82	2.00	58.80	1.00	89.22	58.80
<b>Total</b>							<b>1,128.30</b>	<b>1,560.50</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,549,364.68  
 Monto desembolsado RD\$ 3,549,364.69 (100%)  
 Avance de obra 148.52%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** CIBAO SUR

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 23 de mayo de 2023

**PROVINCIA:** SÁNCHEZ RAMÍREZ

**MUNICIPIO:** CEVICOS

**DISTRITO MUNICIPAL:** -



## **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,128.30 metros cuadrados de aceras y 1,560.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### **NOTAS**


1. La obra se realizó por Contrato.
2. En esta visita pudimos observar que en algunos tramos se removieron empalizadas para poder llevar a cabo el ancho adecuado de las aceras.
3. La calidad de los contenes y aceras ejecutados cumplen con las normas y criterios recomendados.

### **IMÁGENES**

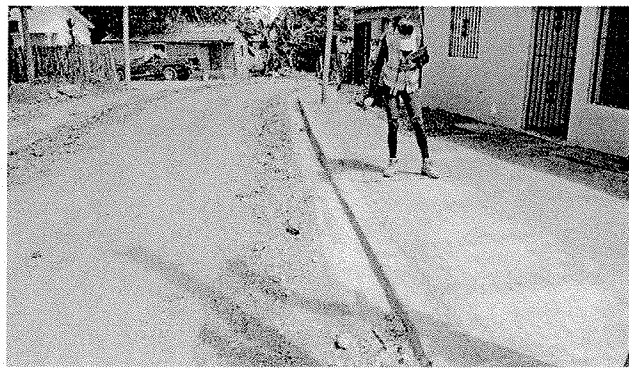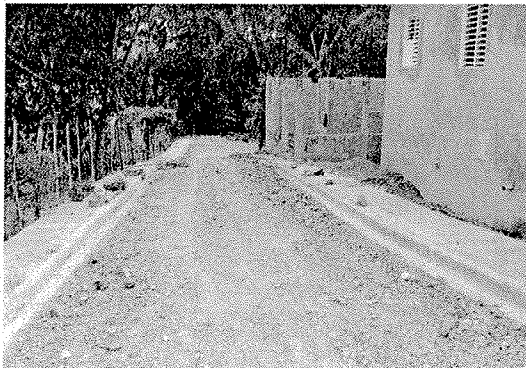



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

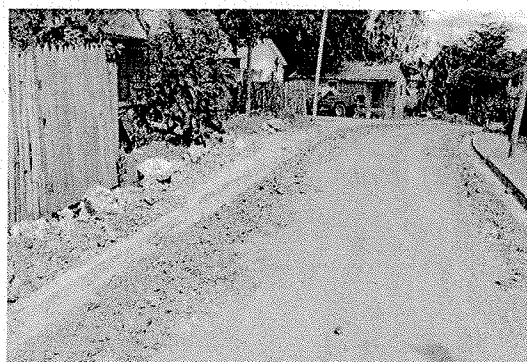

Suministra los datos de este reporte,

*Juan P. Mercado*  
ING. DANILO MERCADO  
Técnico

*Elizabeth*  
ELIZABETH GARCÍA  
Técnico

