

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

## SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


**CODIGO:** 240202  
**REGIÓN:** CIBAO SUR  
**PROVINCIA:** SÁNCHEZ RAMÍREZ  
**MUNICIPIO:** CEVICOS  
**DISTRITO MUNICIPAL:** LA CUEVA

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 3 de julio de 2023  
**TÉCNICOS:** 1. Ing. Richard Cabrera  
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	DUARTE	566.50	1.00	1	566.50	1	566.5	566.5
TRAMO B	CALLE 3	80.00	1.00	1			80	
TRAMO C	JUANCITO	534.00	1.00	1	454.00	2	534	908
<b>Total</b>							<b>1180.50</b>	<b>1474.50</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,156,000.59  
Monto desembolsado RD\$ 1,578,000.30 (50%)  
Avance de obra 162.21%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** CIBAO SUR

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 3 de julio de 2023

**PROVINCIA:** SÁNCHEZ RAMÍREZ

**MUNICIPIO:** CEVICOS

**DISTRITO MUNICIPAL:** LA CUEVA


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,180.50 metros cuadrados de aceras y 1,474.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS


1. ESTA OBRA ES EJECUTADA POR CONTRATA
2. LA ACERA Y CONTEN CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDA POR LA LMD
3. SE OBSERVO UNA BUENA TERMINACION EN CONTENES Y ACERAS

### IMÁGENES

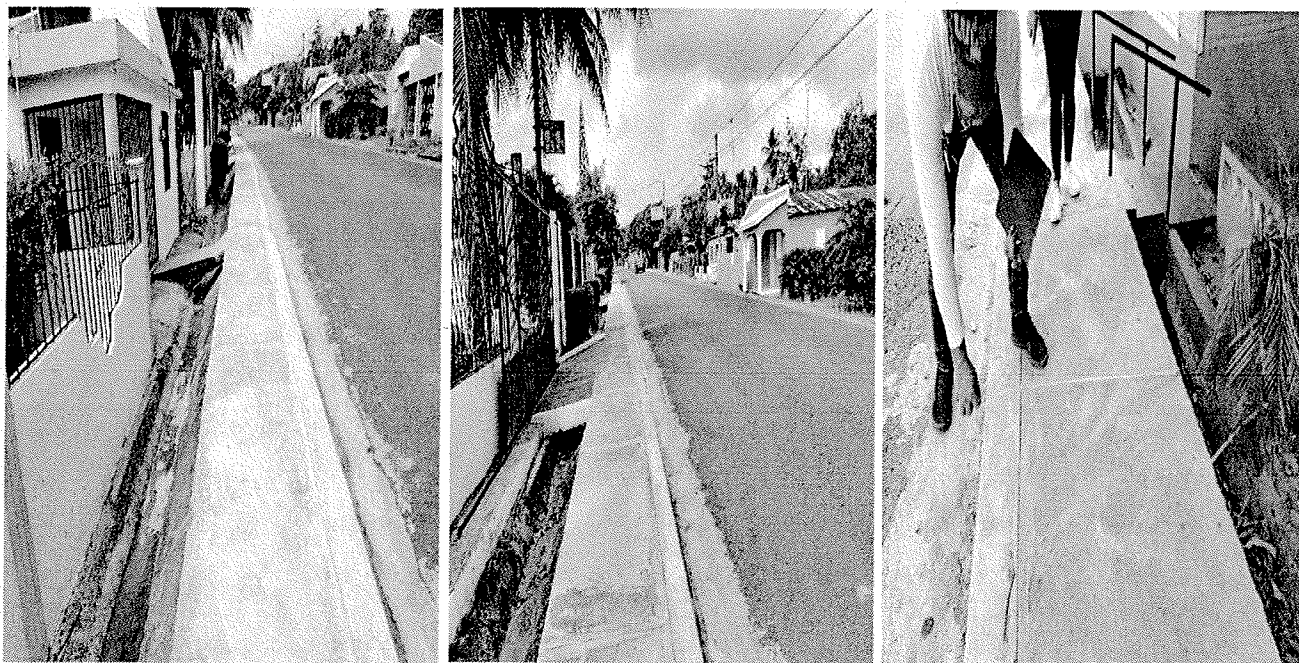



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

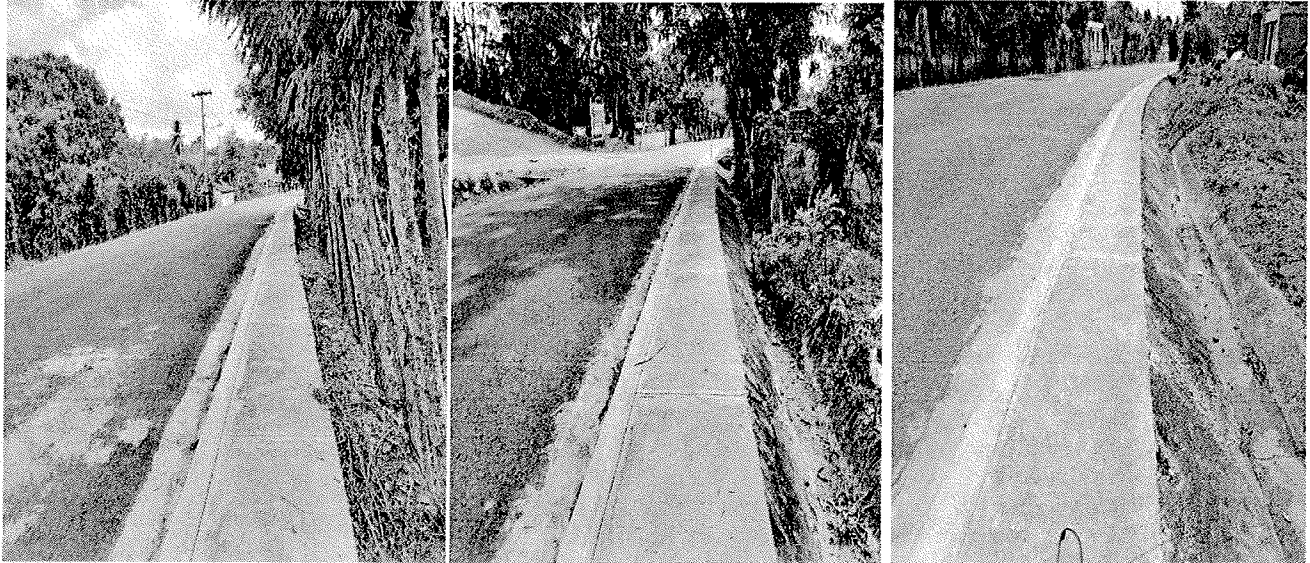

*Suministra los datos de este reporte,*

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico
