



Alcaldía Municipal de Villa La Mata

República Dominicana
RNC: 4-3001571-7

2110161



Villa La Mata, Prov. Sánchez Ramírez
27 de Abril del 2022

Señor:
ING. ANA LOURDES ROSA SANTOS

Distinguido Señor:

Cortésmente nos dirigimos a ustedes con la finalidad de comunicarles que este Honorable Ayuntamiento Municipal de Villa La Mata, conforme a lo aprobado por el consejo Municipal, para el presupuesto del año 2022, en lo relativo a fondos disponibles por concepto del aporte del Gobierno Central a través de La Liga Municipal, procedió a llevar a cabo un proceso de licitación por comparación de precios para la: **construcción de contenes y Aceras, en la carretera Principal de los sectores LOS PEGUEROS, EL LIMPIO Y LAS MERCEDES de villa la mata.**

En dicho proceso su oferta económica planteada para dicho proyecto resulto beneficiada. Por lo que le invitamos a pasar por las oficinas del Ayuntamiento de Villa la Mata para Completar el proceso de adjudicación de la Obra.

Nota: Este proceso se llevó a cabo cumpliendo con todos los requerimientos establecidos en la ley 340-06 de Compras y Contrataciones públicas y su reglamento de aplicación No. 543-12.

Agradeciéndoles su atención a la presente comunicación y deseándoles éxitos, se despide

Muy Deferentemente,


ING. MIGUEL ANT. MARTINEZ
Alcalde Municipal



SOLICITUD DE CUBICACION

Proyecto: Construcción de Aceras y Contenes en la Calle Principal

Cliente: Ayuntamiento Municipal de Villa la Mata

Proyecto realizado por: ING. ANA LOURDES ROSA SANTOS

Contacto: 809-513-6078

CODIA: 34042

RNC: 049-0063250-8

Al: Ing. Valentín Santos García (Subsecretario Municipal de Obras Públicas, Planeamiento Territorial)

Asunto: Solicitud de cubicación, Aceras y Contenes el cual estamos realizando en este Municipio.

Luego de un cordial saludo le estamos comunicando que la construcción de Aceras y Contenes de este Municipio, se realizó por medio de una Comparación de Precio en el portal de la DGCP.

El estado de dicha Obra que se está ejecutando, se encuentra con un porcentaje de ejecución de 100% de Contenes y un 25 % de Aceras, donde se han desembolsado el 50% de los fondos de dicho proyecto.

Por este medio estamos solicitando el desembolso del 50% restante para culminar con dicho proyecto.

Sin otro particular le saluda muy atentamente.

Ana Lourdes Rosa Santos
ING. ANA LOURDES ROSA SANTOS

Contratista



Proyecto: Construcción de Aceras y Contenes en la Calle Principal Cliente: Ayuntamiento Municipal de Villa la Mata Elaborado por: ING. ANA LOURDES ROSA SANTOS Contacto: 809-513-6078 CODIA: 34042 RNC: 049-0063250-8				
Partida	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
Fecha : 04/07/2022				
2230 GASTOS DIRECTOS				

1 Preliminares				
1.1	Letrero de Obra 8x4 Pies 2	PA	1.00	14,000.00
				RD\$14,000.00
1.2	Levantamiento Topográfico	ml	1,600.00	35.00
				RD\$56,000.00
1.3	Tarja	PA	1.00	9,000.00
				RD\$,000.00
1.4	Estampa Logo Ayuntamiento	PA	1.00	6,500.00
				RD\$00.00
Sub Total				RD\$70,000.00

2 Movimientos de Tierra				
2.1	Limpieza del Terreno	PA	1.0	12,000.00
				RD\$,000.00
2.2	Relleno Bajo Acera	m3	400.00	580.00
				RD\$58,000.00
2.3	Telford	m3	90.00	970.00
				RD\$87,300.00
Sub Total				RD\$145,000.00

3 Construcción de Aceras y Contenes

3.1	Construcción de Contenes	ml	1,500.00	1,035.00	RD\$1,552,500.00
3.2	Construcción de Aceras	m2	1,650.00	1,035.00	RD\$426,937,50.00
					Sub Total
					RD\$1,979,437.50

SUB-TOTAL GENERAL					RDS2,194,437.5
--------------------------	--	--	--	--	-----------------------

116	Gastos Indirectos	Unidad	Cantidad	Precio	Valor
116	Dirección Técnica	%	10	RD\$2,194,437.5	RD\$219,443.37.
116	Transporte	%	2	RD\$2,194,437.5	RD\$.43,888.75
116	Gastos Administrativos	%	2	RD\$2,194,437.5	RD\$43,888.75.
116	Codia	%	0.002	RD\$2,194,437.5	RD\$4,388.88
116	ITBIS	%	18	RD\$2,194,437.5	RD\$394,998.75
					Sub-Total
					RD\$706,608.5

TOTAL DEL PROYECTO RD\$2,901,046

ELAVORADO Y SUSTENTADO POR
Ana Lourdes Rosa Santos

ING. AMA LOURDES SANTOS ROSA

REVISADO POR

[Handwritten Signature]

ING. Miguel A. Martínez Alcalde Municipal



SOLICITUD DE CUBICACION

Proyecto: Construcción de Aceras y Contenes en la Calle Principal

Cliente: Ayuntamiento Municipal de Villa la Mata

Proyecto realizado por: ING. ANA LOURDES ROSA SANTOS

Contacto: 809-513-6078

CODIA: 34042

RNC: 049-0063250-8

08/07/2022

Al: Ing. EURIBIADES JIMENESZ. Supervisor del Proyecto Aceras y contenes, municipio de Villa La Mata

Asunto: Solicitud de cubicación, Aceras y Contenes el cual estamos realizando en este Municipio.

Luego de un cordial saludo le estamos comunicando que la construcción de Aceras y Contenes de este Municipio, se realizó por medio de una Comparación de Precio en el portal de la DGCP.

El estado de dicha Obra que se está ejecutando, se encuentra con un porcentaje de ejecución de 100% de Contenes y un 25 % de Aceras, donde se han desembolsado el 50% de los fondos de dicho proyecto.

Por este medio estamos solicitando el desembolso del 50% restante para culminar con dicho proyecto.

Sin otro particular le saluda muy atentamente.



Ana Lourdes Rosa Santos
ING. ANA LOURDES ROSA SANTOS
Contratista

*Recibida
09/07/22*

Proyecto	Cosntrucción de Aceras y Contenes en La Calle Principal	CODIA	34042	FECHA	13-07-2022
Cliente	Ayuntamiento de Villa la Mata	RNC	4900632508		
Responsable	ING. Ana Lourdes Rosa Santos	Contacto	809-513-6078		


		Cubicación No.1												
PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS														
No.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ACUMULADO PREVIO		ACTUAL		ACUMULADO				
		CANT.	UND	PU	VALOR	99	CANT.	VALOR	99	CANT.	VALOR			
A	Costos Directos:													
1	PRELIMINARES													
1.1	Leñero de obra	1.00	PA	14,000.00	14,000.00	0.00%	-	-	100.00%	1.00	14,000.00	100.00%	1.00	14,000.00
1.2	Levantamiento topografico	1,800.00	ml	35.00	63,000.00	0.00%	-	-	100.00%	1,800.00	63,000.00	100.00%	1,800.00	63,000.00
1.3	Tarja	1.00	PA	9,000.00	9,000.00	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-
1.4	Estampa Logo Ayuntamiento	1.00	PA	6,500.00	6,500.00	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-
					92,500.00						77,000.00			77,000.00
2	Movimiento de tierra													
2.10	Limpieza del terreno	1.00	PA	12,000.00	12,000.00	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00	-
2.20	Relleno bajo acera	400.00	M3	580.00	232,000.00	0.00%	-	-	25.00%	100.00	58,000.00	25.00%	100.00	58,000.00
2.30	Telford	90.00	M3	970.00	87,300.00	0.00%	-	-	100.00%	90.00	87,300.00	100.00%	90.00	87,300.00
					331,300.00						145,300.00			145,300.00
3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES													
3.10	Construcción de contenes	1,800.00	ML	890.00	1,602,000.00	0.00%	-	-	100.00%	1,800.00	1,602,000.00	100.00%	1,800.00	1,602,000.00
3.20	Construcción de aceras	1,930.00	ML	800.00	1,584,000.00	0.00%	-	-	25.00%	495.00	396,000.00	25.00%	495.00	396,000.00
					3,186,000.00						1,998,000.00			1,998,000.00
	COSTOS DIRECTOS				3,609,800.00						2,220,300.00			2,220,300.00


		Cubicación No.1												
B Costos Indirectos														
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	PU	VALOR	99	CANT.	VALOR	99	CANT.	VALOR	99	CANT.	VALOR
1	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00%			360,980.00						222,030.00			222,030.00
2	Transporte	3.00%			108,294.00						66,609.00			66,609.00
3	CODIA	0.10%			3,609.80						2,220.30			2,220.30
4	Gastos administrativos	2.00%			72,196.00						44,406.00			44,406.00
5	ITBIS	18.00%			64,976.40						39,965.40			39,965.40
					610,056.20						375,230.70			375,230.70
TOTAL GENERAL:					4,219,856.20	0.00%			61.51%		2,595,530.70	61.51%		2,595,530.70
APAGAR											2,595,530.70		2,595,530.70	

 ING. Embadas Jimenez Abreu INGENIERO SUPERVISOR CODIA		 ING. Ana Lourdes Rosa Santos CONTRATISTA
---	--	--

Antes



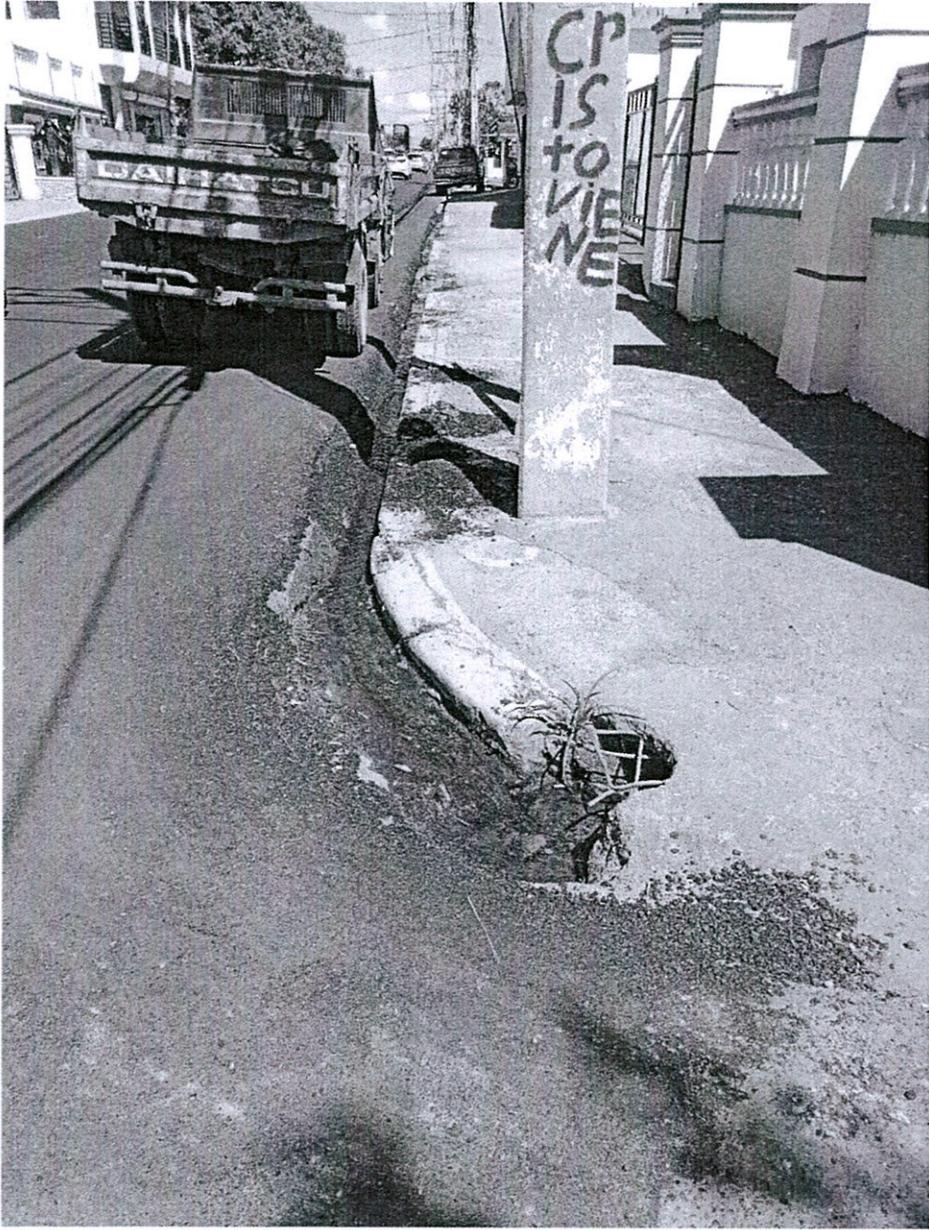


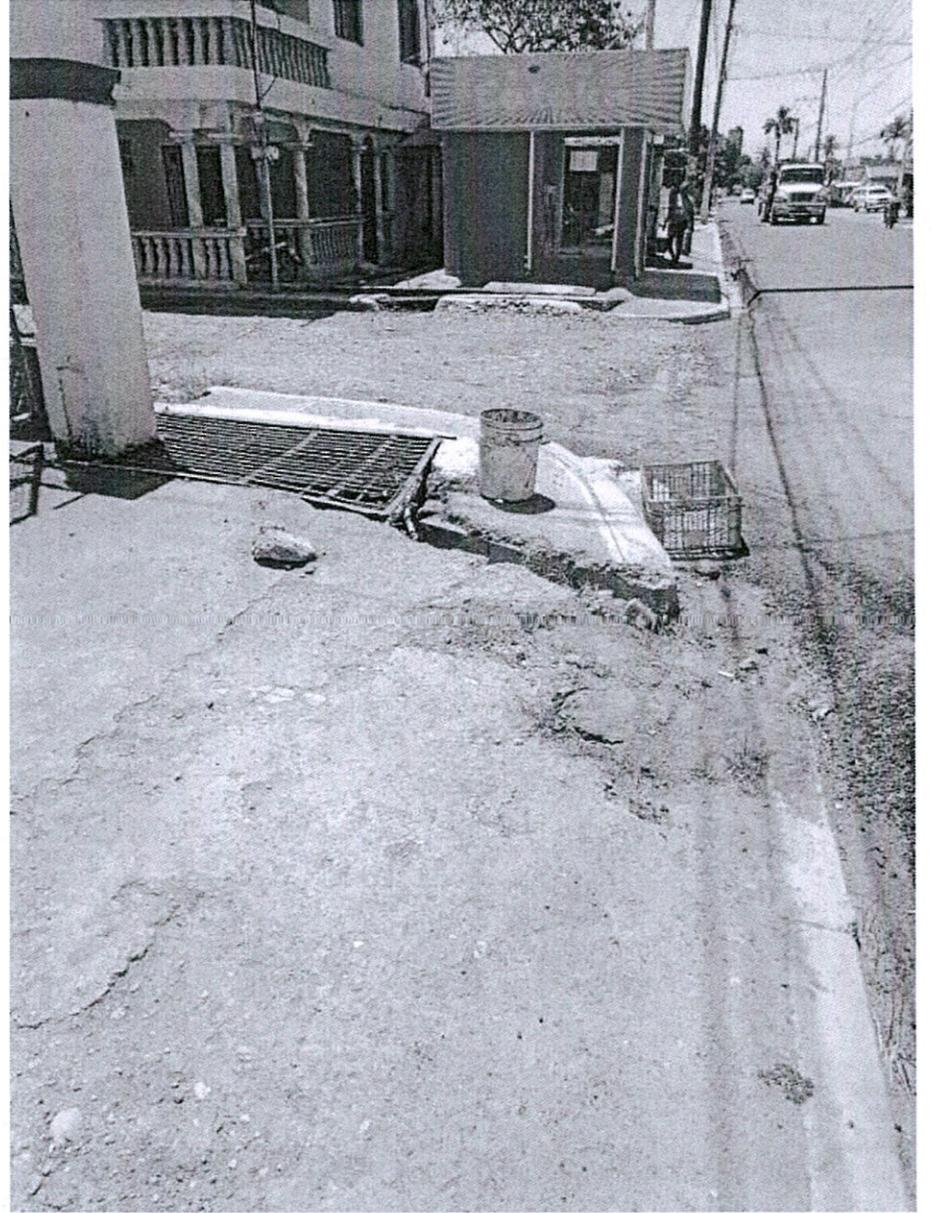





Villa la Mata

Durante

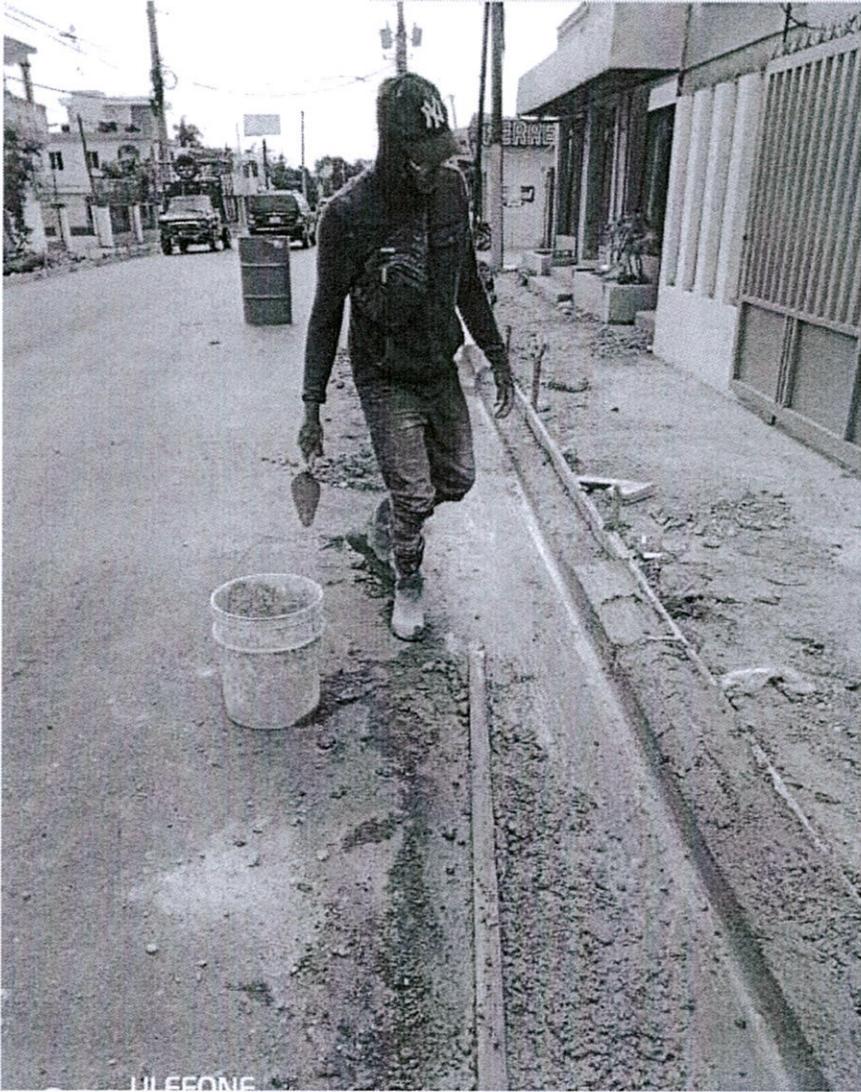


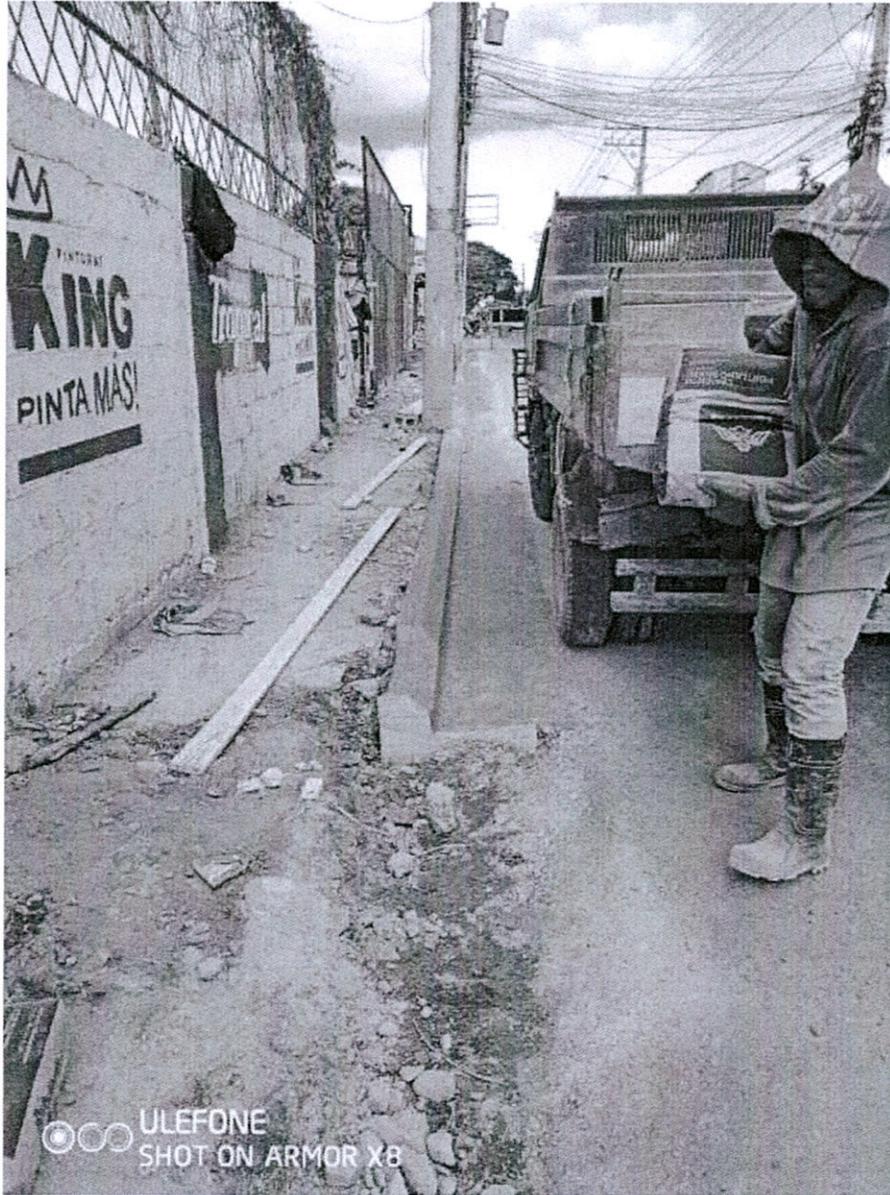

ULEFONE
SHOT ON ARMOR X8

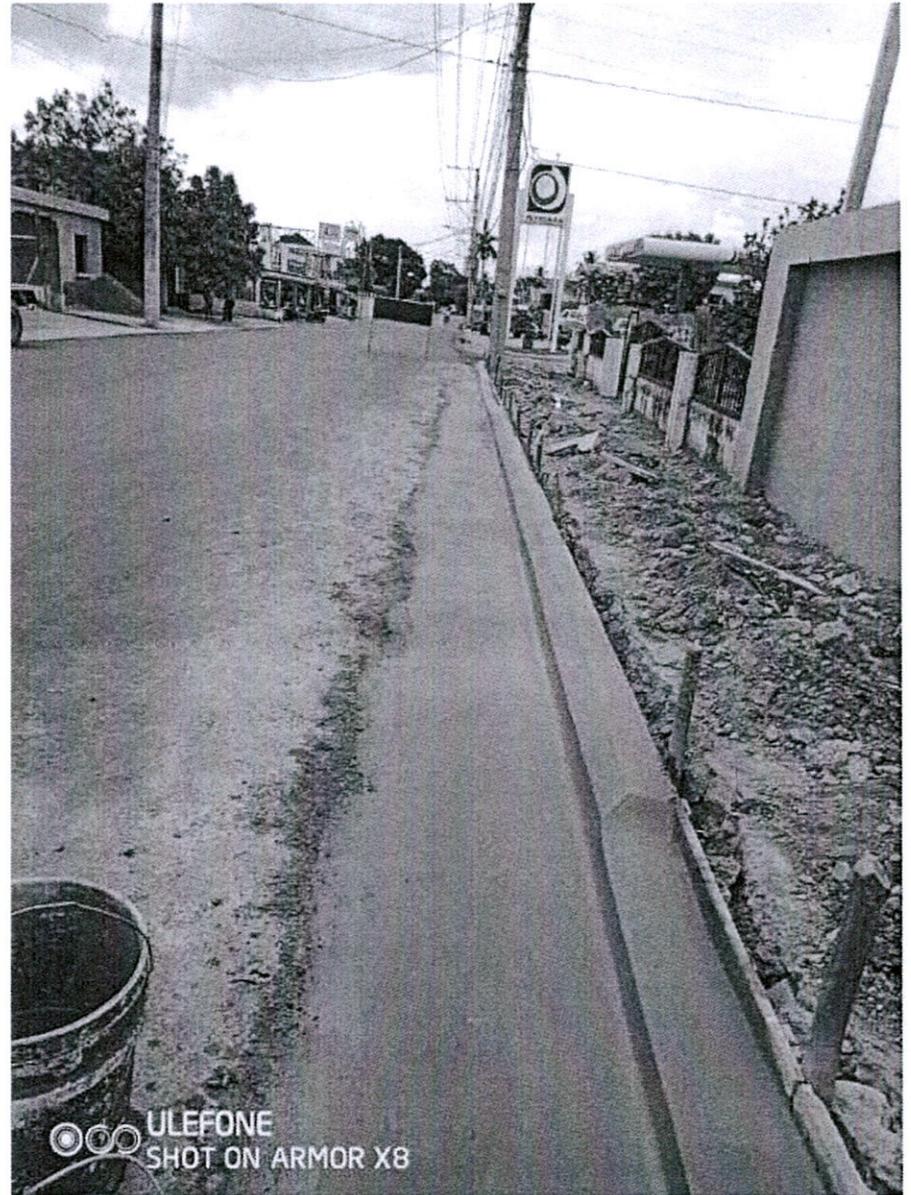



ULEFONE
SHOT ON ARMOR X8

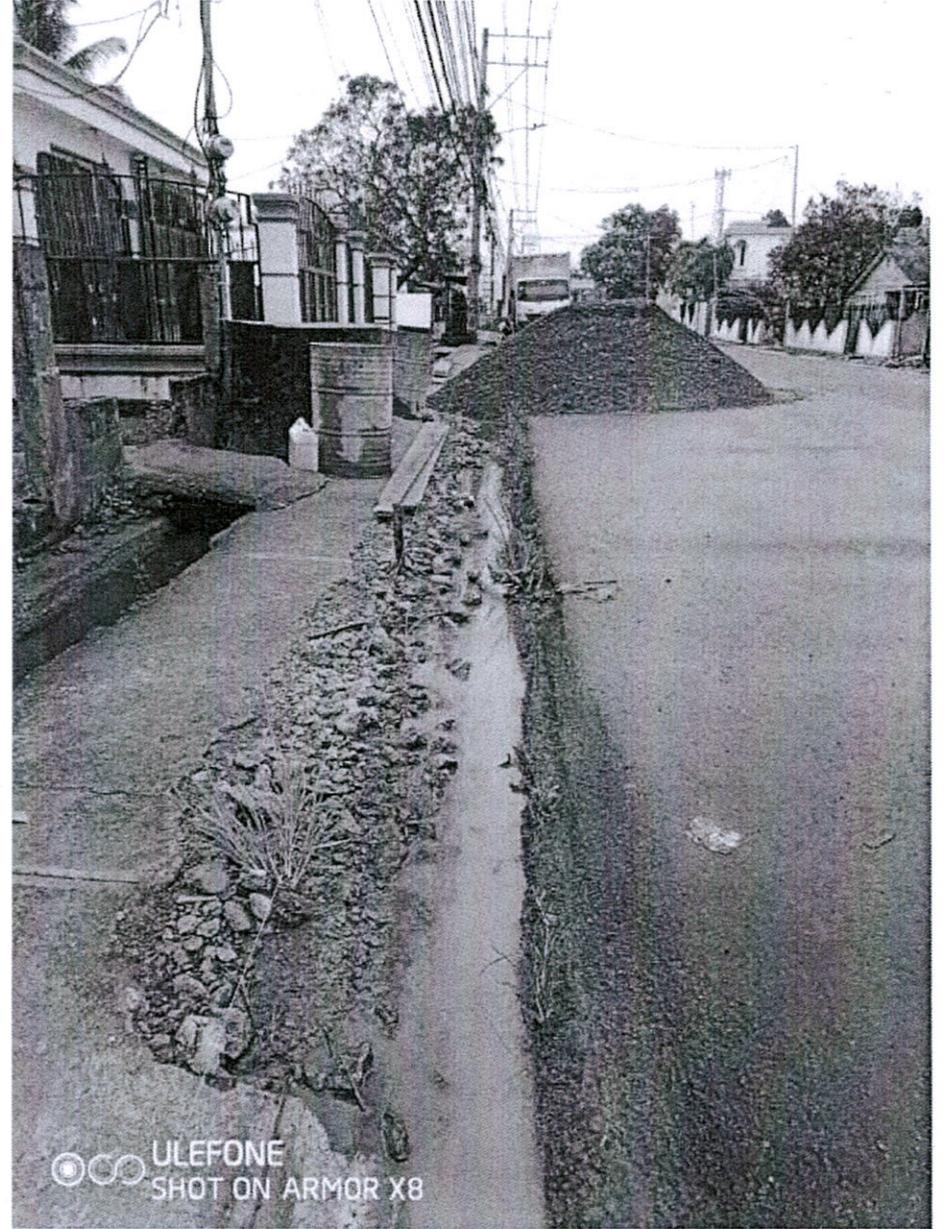





Villa la Mata

Actualmente

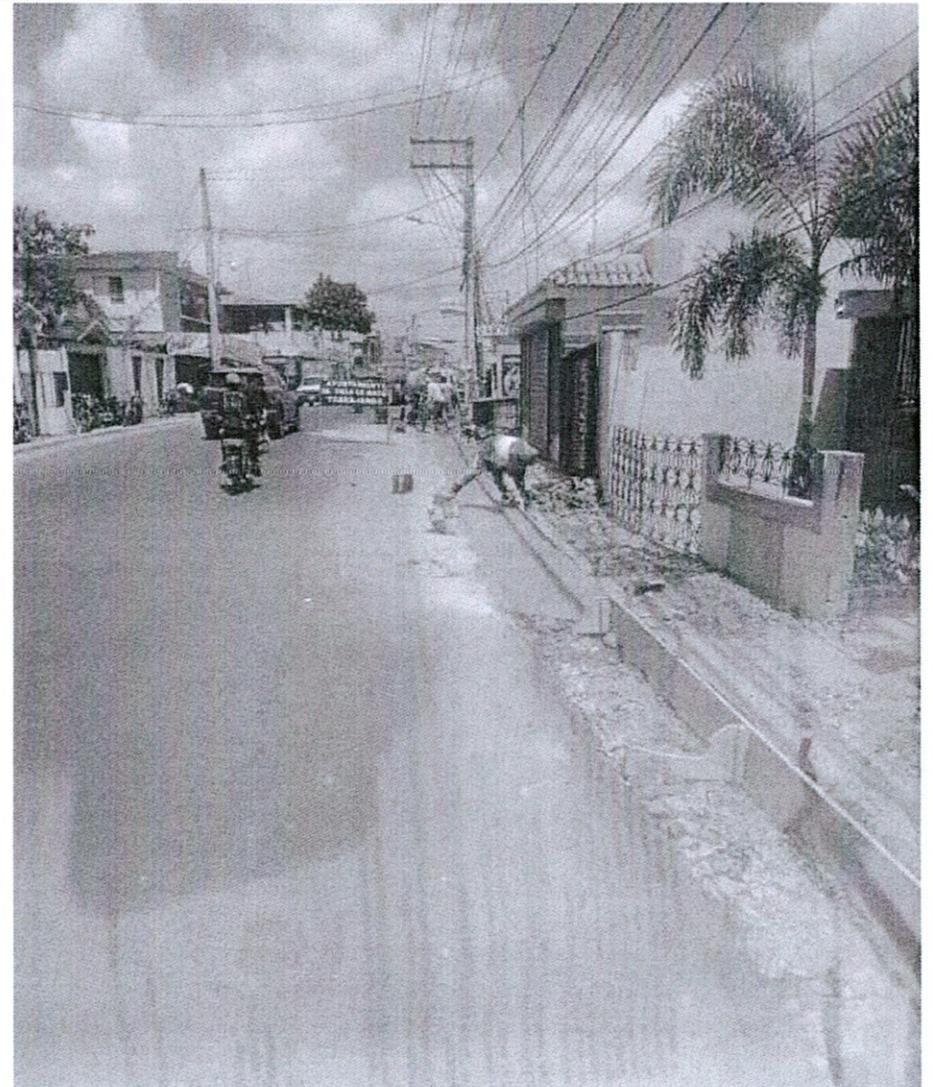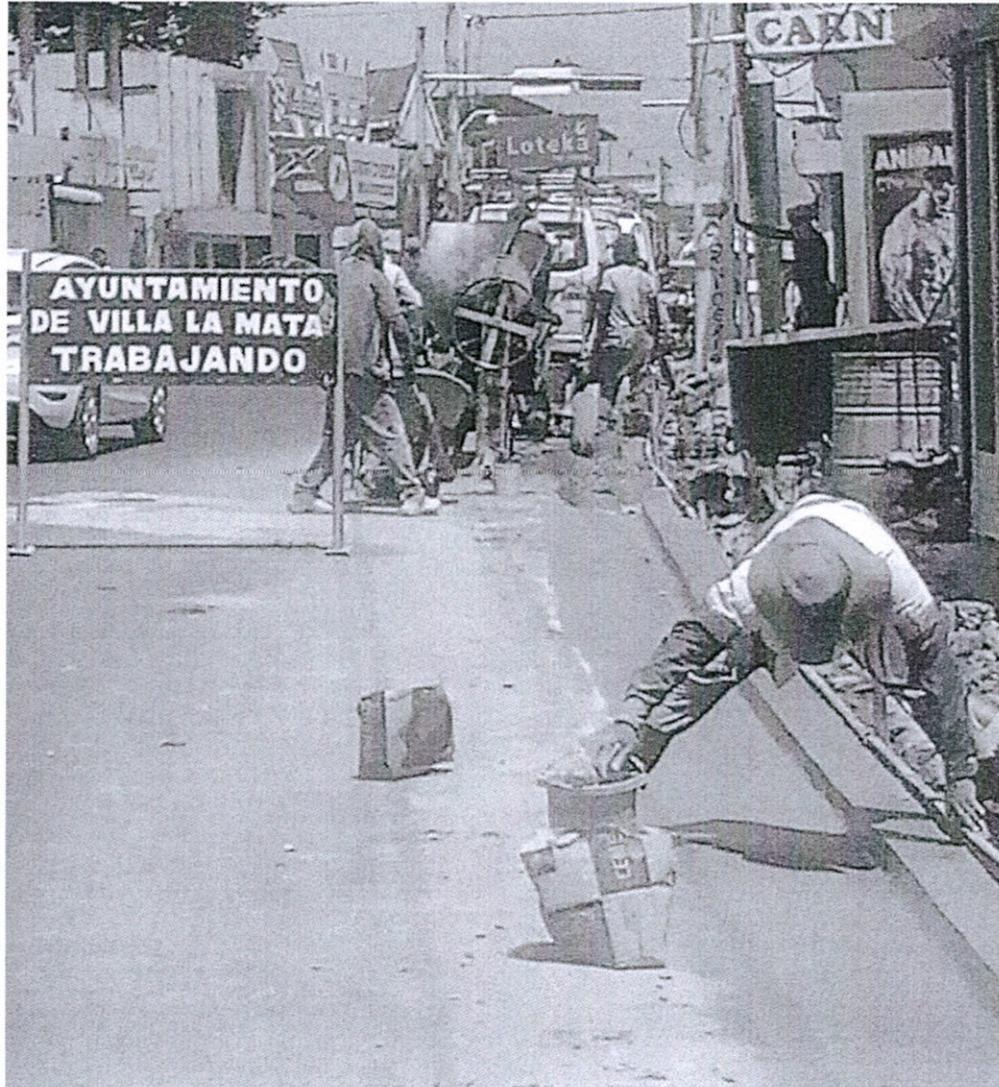

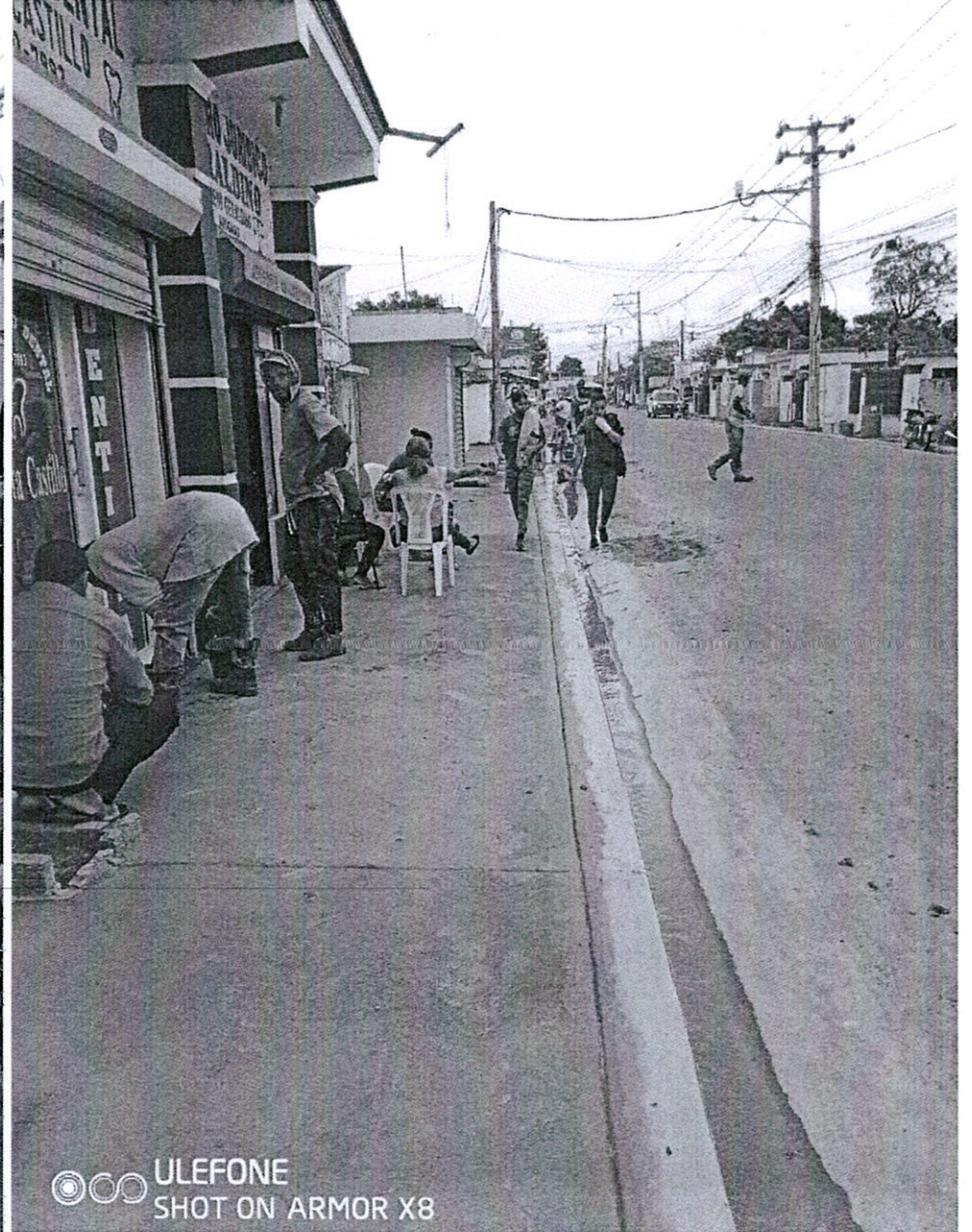

ULEFONE
SHOT ON ARMOR X8

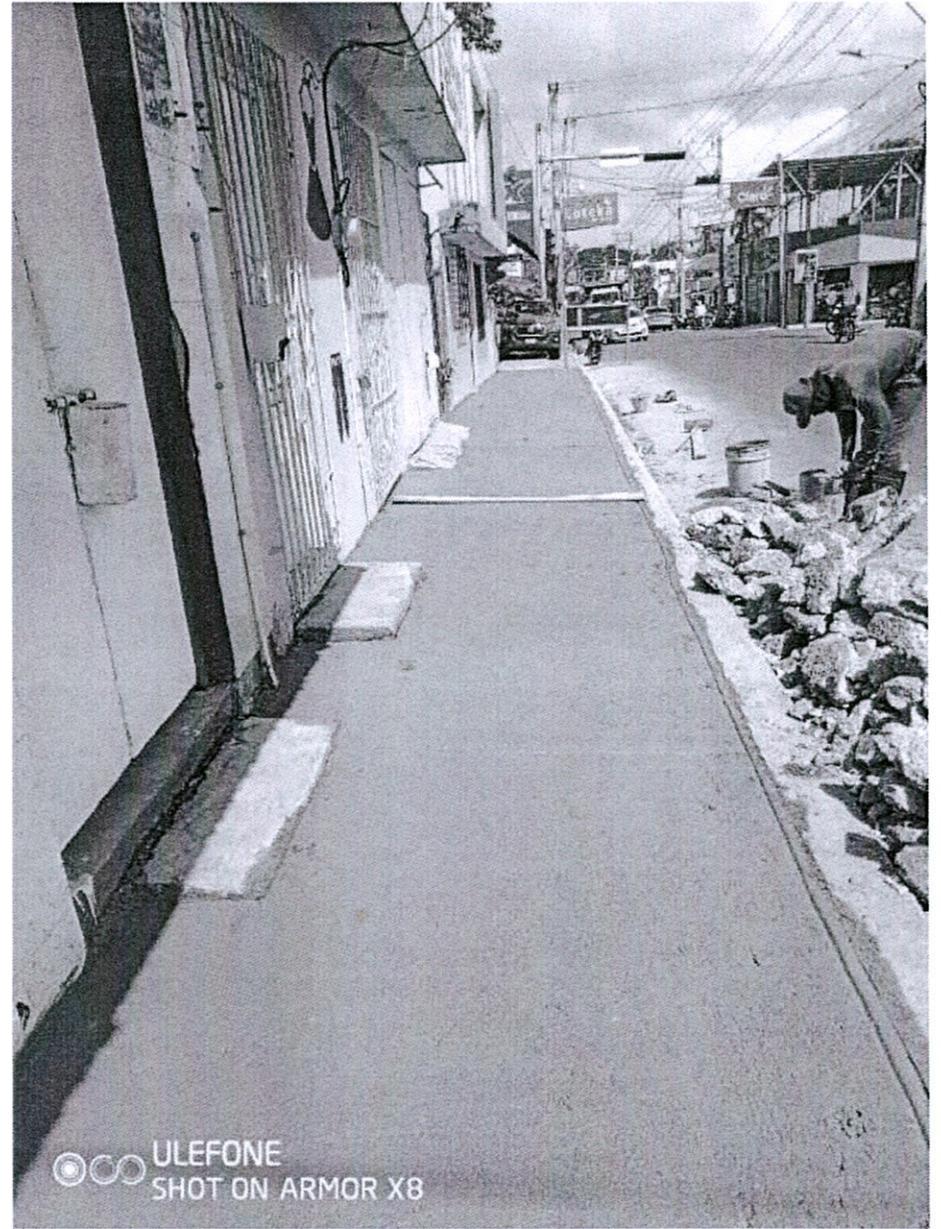





Municipalidad de Villa La Mata

RNC: 4-3001571-7

Villa La Mata, Prov. Sánchez Ramírez
23 de Junio del 2022.

A: SRES. LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Via: ING. VALENTIN SANTOS

Del: ING. MIGUEL ANT. MARTÍNEZ
Alcalde Municipal de Villa La Mata.

Asunto: INFORME SOBRE PROGRAMA DE
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
DE VILLA LA MATA.

Distinguidos Señores:

Con saludo de alta estima, la presente comunicación es para rendirles un informe sobre la situación de la obra de Aceras y Contenes de la calle Duarte de Villa La Mata.

La modalidad utilizada de la obra fue adjudicada al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) núcleo Villa La Mata por sorteo.

La obra ya está iniciada, la cual se encuentra en un 35% de su ejecución y aún nos quedan recursos para seguir avanzando en la misma.

Esperando que nuestras informaciones cumplan con los fines de lugar.

Muy atentamente,

Ing. Ana Lourdes Rosa Santos

[Firma]
ING. MIGUEL ANT. MARTÍNEZ
Alcalde Municipal

