

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 240403
REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ
MUNICIPIO: LA MATA
DISTRITO MUNICIPAL: ANGELINA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 3 de julio de 2023
TÉCNICOS: 1. César De Los Santos
2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CAARET. ANGELINA, LAS GUARANAS	1,040.70	1.04	1	1,040.70	1	1077.882291	1040.7
TRAMO B	LOS COCOS				300.20	1		300.2
Total							1077.88	1340.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,863,448.62
Monto desembolsado RD\$ 3,863,448.62 (100%)
Avance de obra 120.64%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 3 de julio de 2023

PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ

MUNICIPIO: LA MATA

DISTRITO MUNICIPAL: ANGELINA


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,077.88 metros cuadrados de aceras y 1,340.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Este gobierno local cumple con los parametros recomendados por la LMD.
2. Este gobierno local en el sector los cocos solo hizo contenes para aprovechar plan de asfaltado.
3. Este gob. Local ejecutó por contrato.
4. Estas obras poseen una Buena terminación.

IMÁGENES

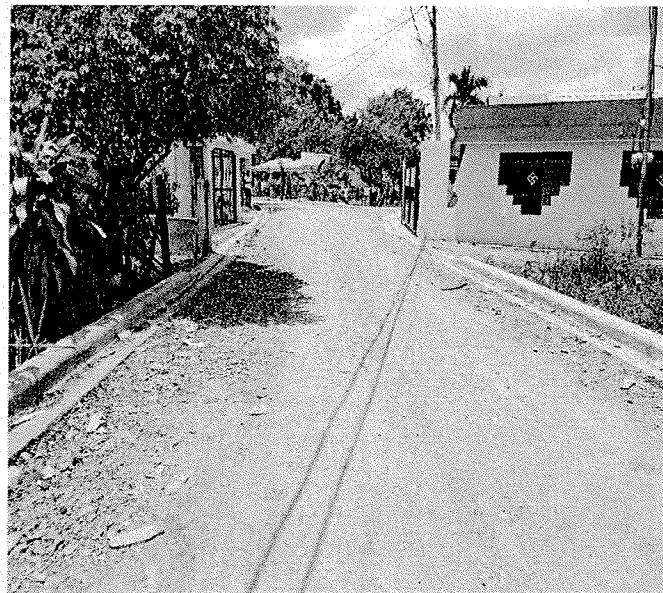





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

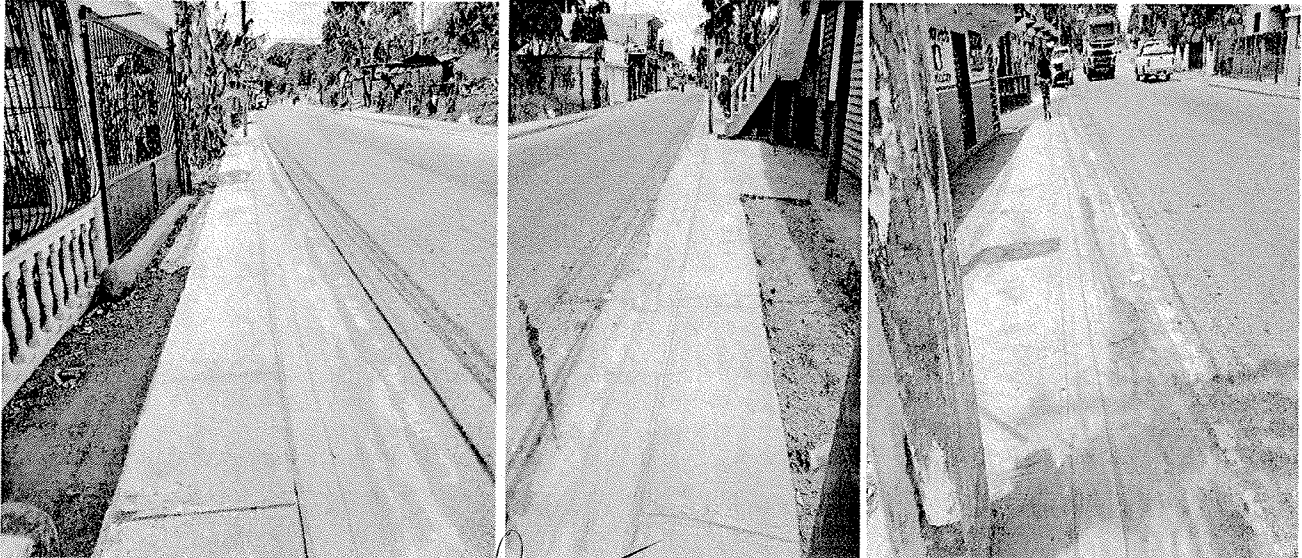

Suministra los datos de este reporte,



CESAR DE LOS SANTOS
Técnico



ING. RICHARD CABRERA
Técnico
