



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 240404

REGIÓN: CIBAO SUR

PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ

MUNICIPIO: LA MATA

DISTRITO MUNICIPAL: HERNANDO ALONZO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 31 de mayo de 2022

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. Ing. Asamín Ferreras

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ PRINCIPAL	138.10	1.07	2	122.00	2	295.534	244
TRAMO B	C/ CAMINO AL AGUACATE	15.00	0.90	1	85.30	2	13.5	170.6
TRAMO C	C/ CAMINO AL AGUACATE	19.40	0.90	1	234.10	2	17.46	468.2
TRAMO D	C/ CAMINO AL AGUACATE				135.3	2		270.6
Total							326.49	1153.40

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,103,834.02

Monto desembolsado RD\$ 3,103,834.03 (100%)

Avance de obra 105.75%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 31 de mayo de 2022

PROVINCIA: SÁNCHEZ RAMÍREZ

MUNICIPIO: LA MATA

DISTRITO MUNICIPAL: HERNANDO ALONZO


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 326.49 metros cuadrados de aceras y 1,153.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. La ejecución de la obra es por contrato.
2. Tienen obras complementarias como cunetas y badenes.

IMÁGENES

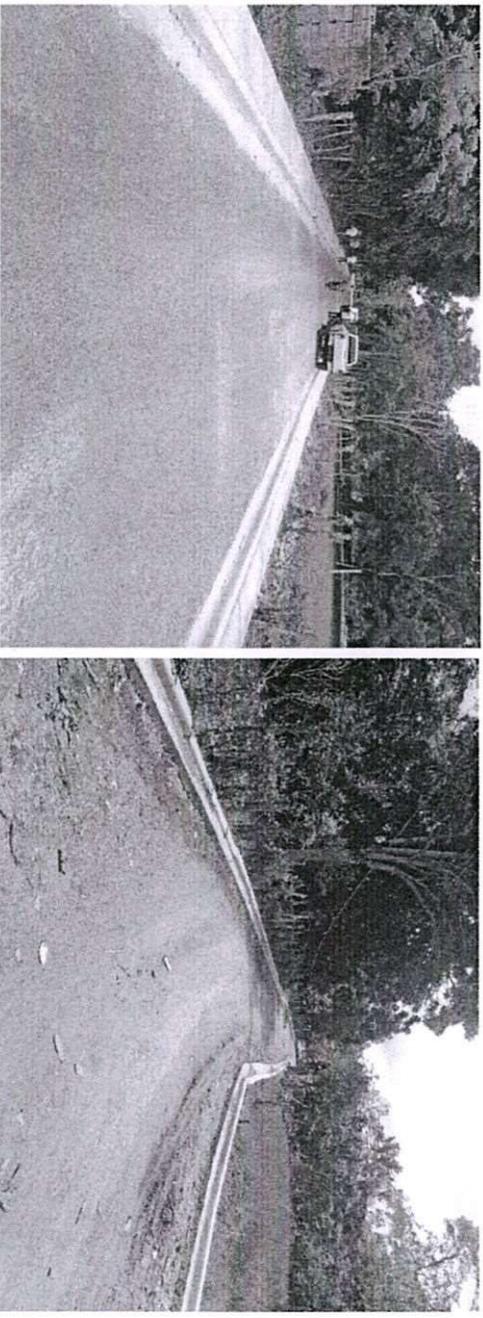




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

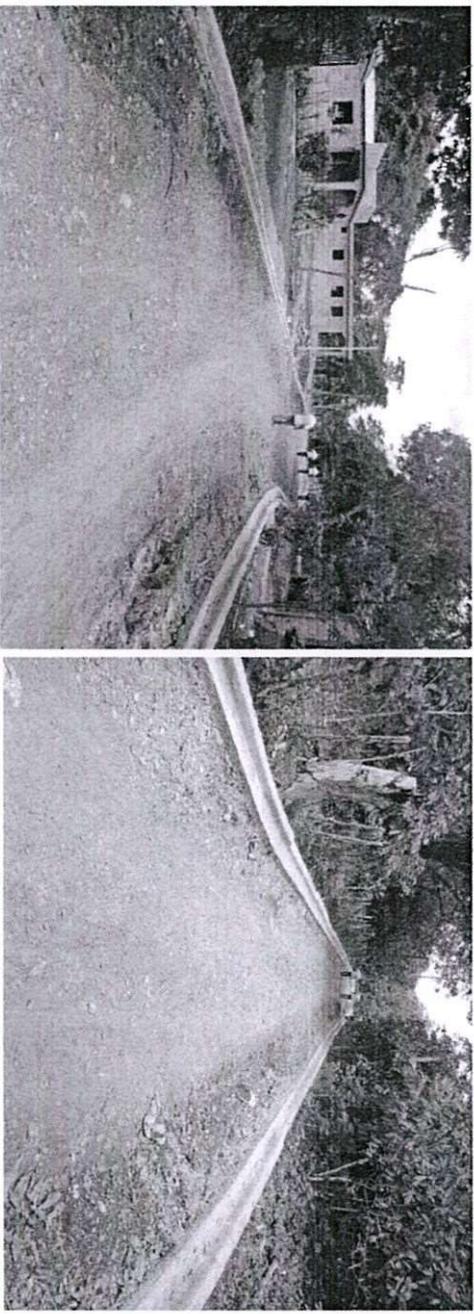

Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILLO MERCADO
Técnico


ING. ASAMÍN FERRERAS
Técnico

