



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


**CODIGO:** 250302  
**REGIÓN:** CIBAO NORTE  
**PROVINCIA:** SANTIAGO  
**MUNICIPIO:** JÁNICO  
**DISTRITO MUNICIPAL:** JUNCALITO

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 12 de enero de 2023  
**TÉCNICOS:** 1. Ing. Ana Indhira Rámirez  
2. Ing. Staylin Mendoza  
3. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE CARLOS RODRIGUEZ				28.30	1		28.3
TRAMO B	CALLE CARLOS RODRIGUEZ				60.50	1		60.5
TRAMO C	CALLE CARLOS RODRIGUEZ				28.30	1		28.3
TRAMO D	CALLE CARLOS RODRIGUEZ				16.00	2		32
TRAMO E	JUNCALITO LA PLACENTA				91	1		91
TRAMO F	JUNCALITO LA PLACENTA				72.8	1		72.8
TRAMO G	CALLE NUÑEZ (SECTOR SAN JOSE)	112.80	0.90	1	334.3	1	101.52	334.3
TRAMO H	CALLE NUÑEZ (SECTOR SAN JOSE)	227.80	0.85	1	253.2	2	193.4022	506.4
TRAMO I	CALLE EUSTACIO FERRERA (SANTA ROSA DE LIMA)				87.6	1		87.6
TRAMO J								
Total							294.92	1241.20

#### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,063,705.89  
Monto desembolsado RD\$ 3,063,705.90 (100%)  
Avance de obra 114.37%



## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

### SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de enero de 2023

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: JÁNICO

DISTRITO MUNICIPAL: JUNCALITO




#### INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 294.92 metros cuadrados de aceras y 1,241.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

#### NOTAS


1. Este distrito esta ejecutando por administración.
2. Al momento de la inspección estuvieron presente dos representante del ayuntamiento que pertenecen al comité de regidores estos son Sr. Neury Espinal (vicepresidente de la junta) y Sra. Flordaliza Espinal (vocal) en sustitución del alcalde que no estuvo presente.
3. Los contenes ejecutados no tienen el tamaño de la planilla aprobada en el programa, por tanto se le explico y suministro lo concerniente a dicho proyecto.

#### IMÁGENES

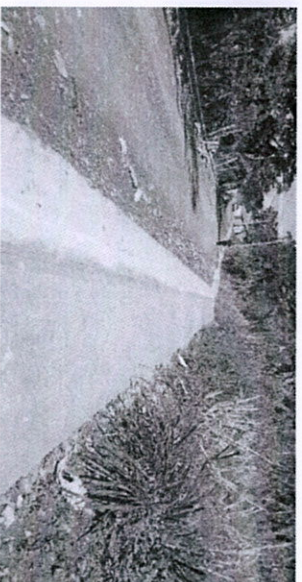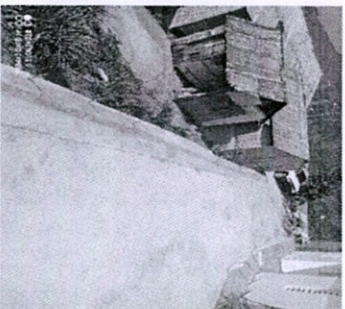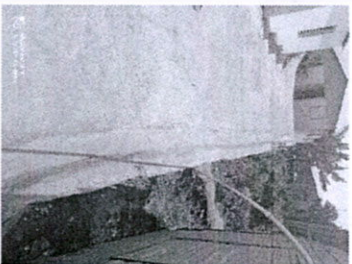





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

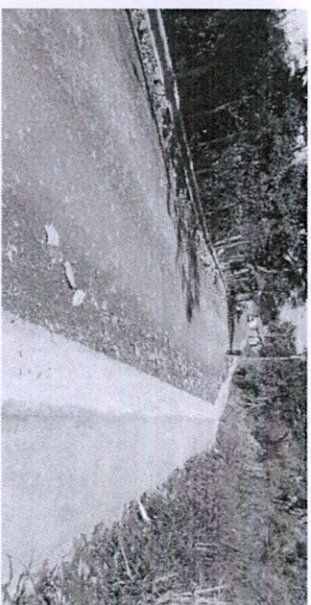

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ  
Técnico

  
ING. STAYLIN MENDOZA  
Técnico



  
ING. RICHARD CABRERA  
Técnico
