



Alcaldía Municipal
San José de las Matas
Despacho del Alcalde

San José de las Matas,
23 de junio del año 2022.

DA-SAJOMA N0.069

Al: Señor
Ing. Valentín Santos García
Subsecretario
Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Liga Municipal Dominicana

Asunto: **Informe estado del programa de construcción de aceras y contenes en el territorio.**

Luego de un cordial saludo, le estamos remitiendo el informe sobre el estado de la obra de construcción para la cual hemos recibido fondos con las siguientes informaciones;

Modalidad de ejecución utilizada: Estos fondos están siendo ejecutados por Administración, previa aprobación del Concejo Municipal, mediante Resolución No.9-2022, de fecha 28 de abril del año 2022.

Estatus de ejecución de la obra: Tenemos como meta realizar 1,379.05 M² de Aceras y 1,379.05 ML de Contén, de los cuales ya hemos realizados un total de 579.7 M² de Aceras y 888.65 ML de Contén.

Estatus de los fondos recibidos: De los RD\$5,193,207.97, que están contemplados desembolsarnos, hemos recibido hasta la fecha la suma de RD\$2,596,603.99, de los cuales tenemos disponible un monto de RD\$478,938.99.-

Atentamente,



Sr. Ramón Alfredo Reyes
Alcalde Municipal

Una Gestión Para Todos

Ave. Alexis Jaquez, Esq. Independencia No. 02, San José de las Matas, Santiago, Rep. Dom., Tel. (809) 571-6067 / (809) 571-6619 / (809) 571-6910

E-Mail: ayuntamiento.sajoma@gmail.com, alcaldia@sajoma.gob.do URL: www.sajoma.gob.do

RNC 402- 06489-2



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 250501

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE LAS MATAS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 12 de julio de 2022

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA INOA (REF. JUNQUITO GAS)	36.10	0.90	1	36.10	1	32.49	36.1
TRAMO B	CARRETERA INOA	263.40	1.00	1	271.90	1	263.4	271.9
TRAMO C	CARRETERA INOA				32.65	1		32.65
TRAMO D	CARRETERA INOA				54.58	1		54.58
TRAMO E	CARRETERA INOA				183	1		183
TRAMO F	AV. EL BERDUGO INT. MARIA JOSEFA				12	1		12
TRAMO G	AV. EL BERDUGO INT. MARIA JOSEFA				27	1		27
TRAMO H	AV. EL BERDUGO INT. MARIA JOSEFA				101.9	1		101.9
TRAMO I	AV. EL BERDUGO INT. MARIA JOSEFA				134.4	1		134.4
TRAMO J	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	144.40	1.00	1			144.4	
TRAMO K	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	46.00	0.92	1	46	1	42.32	46
TRAMO L	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	50.20	1.00	1	50.2	1	50.2	50.2
TRAMO M	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	36.50	1.00	1	48.1	1	36.5	48.1
TRAMO N	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	44.30	1.15	1	44.3	1	50.945	44.3
TRAMO O	BOTONCITO (CRUCE DE GUAJACA, LADO DERECHO)	156.10	1.00	1	127	1	156.1	127
TRAMO P	GUAJACA	67.00	1.00	1	8.7	1	67	8.7
Total							843.355	1177.83

250501 - LEVANTAMIENTO DE INSP. DE ACERA Y CONTEN 12-7-2022

Av. Jiménez Moya, Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, Apartado Postal No. 1471, Santo Domingo, República Dominicana, Tel.:809-533-3686



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


Monto asignado RD\$ 5,193,207.97

Monto desembolsado RD\$ 2,596,603.99 (50%)

Avance de obra 77.45%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

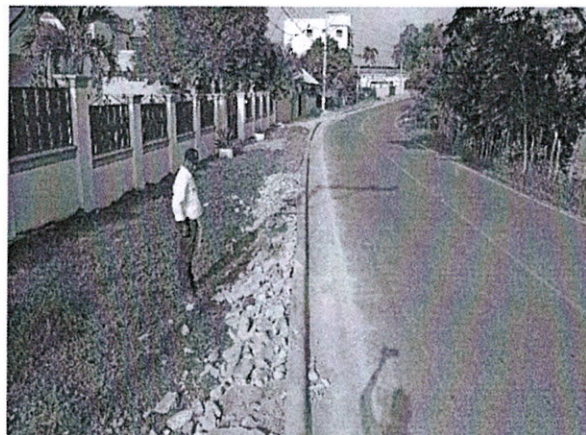



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico



ING. EDWARD ACOSTA
Técnico
