



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


**CODIGO:** 250702  
**REGIÓN:** CIBAO NORTE  
**PROVINCIA:** SANTIAGO  
**MUNICIPIO:** VILLA GONZÁLEZ  
**DISTRITO MUNICIPAL:** PALMAR ARRIBA

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 13/01/23  
**TÉCNICOS:** 1. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	PEDRO BONIE (SECTOR JIMENEZ II)				60.30	2.00		120.60
TRAMO B	PEDRO BONIE (SECTOR JIMENEZ II)				246.50	2.00		493.00
TRAMO C	VILLA TABACALERA (FRENTE A LA CANCHA)	80.00	1.11	1.00	84.20	1.00	88.80	84.20
TRAMO D	VILLA TABACALERA (FRENTE A LA CANCHA)	30.80	1.18	1.00	30.80	2.00	36.34	61.60
TRAMO E	VILLA TABACALERA (FRENTE A LA CANCHA)	41.80	1.33	1.00	24.00	1.00	55.59	24.00
TRAMO F	VILLA TABACALERA Y CARRET. JUAN D.	29.00	1.92	1.00	3.80	1.00	55.68	3.80
TRAMO G	CARRETERA PALMAR	105.30	1.25	1.00	105.30	1.00	131.63	105.30
TRAMO H	CARRETERA PALMAR	74.10	1.59	1.00	161.00	1.00	117.82	161.00
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>485.86</b>	<b>1,053.50</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,296,882.85  
Monto desembolsado RD\$ 1,648,441.43 (50%)  
Avance de obra 99.05%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: VILLA GONZÁLEZ

DISTRITO MUNICIPAL: PALMAR ARRIBA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13/01/23


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 485.86 metros cuadrados de aceras y 1,053.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS


1. En este levantamiento pudimos observar que cumplen con el ancho de las aceras.
2. Esta construcción fue ejecutado por contrato.

### IMÁGENES





**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

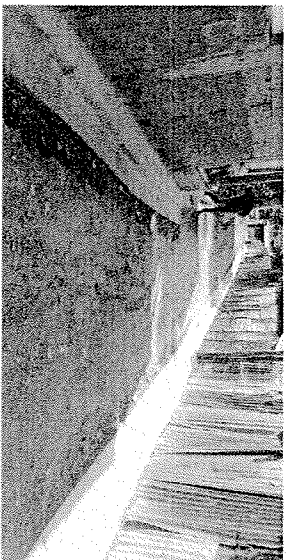

*Suministra los datos de este reporte,*

ING. RICHARD CABRERA  
Técnico

Técnico
