

LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

Santo Domingo, D.N.  
30 de mayo de 2023

Al: Ingeniero  
**Valentín Santos García**  
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Su Despacho-

Vía: Ingeniero  
**Nelson D. Peña Luna**  
Director Asesoría Construcciones Municipales  
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución Mao**

En la visita técnica realizada el 27 de septiembre del 2022 se validó la ejecución de 3,609.64 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 2,665.9 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 6,265. metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

  
**Stephany Castro de la Cruz**  
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

## SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 270101

**REGIÓN:** CIBAO NOROESTE

**PROVINCIA:** VALVERDE

**MUNICIPIO:** MAO

**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 27 de septiembre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

**TÉCNICOS:** 2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE 12 DE JUNIO				241.64	2		483.28
TRAMO B	CALLE 1				83.86	2		167.72
TRAMO C	CALLE 2				151.22	2		302.44
TRAMO D	CARR. MAO-PRESA MONCIÓN				161.90	1		161.9
TRAMO E	CALLE A				186.3	1		186.3
TRAMO F	CALLE A				104	1		104
TRAMO G	CALLE B				278.7	1		278.7
TRAMO H	CALLE C				367.6	1		367.6
TRAMO I	CALLE D				33	1		33
TRAMO J	CALLE D				428.4	1		428.4
TRAMO K	CALLE D				160.2	1		160.2
TRAMO L	MARTIN DE VILLAR				75.7	1		75.7
TRAMO M	PEPILLO SALCEDO				171.9	1		171.9
TRAMO N	HUMBERTO MAZAN				238.4	1		238.4
TRAMO O	HUMBERTO MAZAN				236	1		236
TRAMO P	EUGENIA BELEAR				72.7	1		72.7
TRAMO Q	FRANCISCO GOMEZ				95	1		95
TRAMO R	PEPILLO SALCEDO				46.4	1		46.4
<b>Total</b>							<b>0.00</b>	<b>3609.64</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 8,207,914.83

Monto desembolsado RD\$ 8,207,914.83 (100%)

Avance de obra 110.92%



# LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 27 de septiembre de 2022

PROVINCIA: VALVERDE

MUNICIPIO: MAO

DISTRITO MUNICIPAL: -



## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 3,609.64 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS



1. La obra se ejecutó vía administración.
2. El proyecto cumple con los estándares recomendados por el programa.
3. El ayuntamiento licitó los materiales para la construcción.

### IMÁGENES

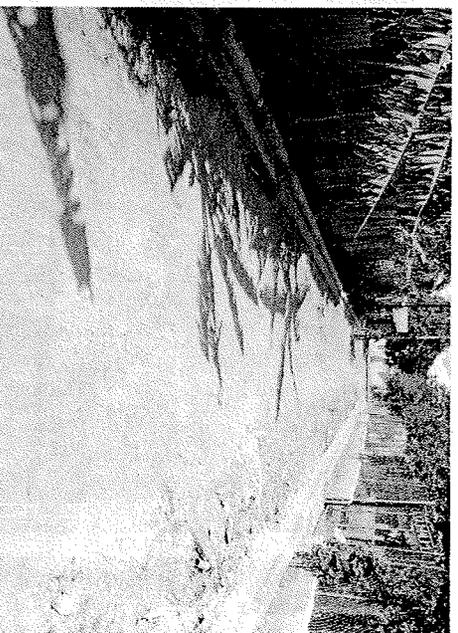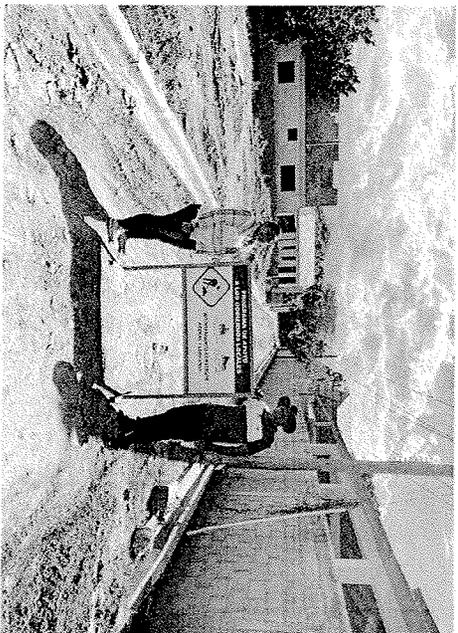



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

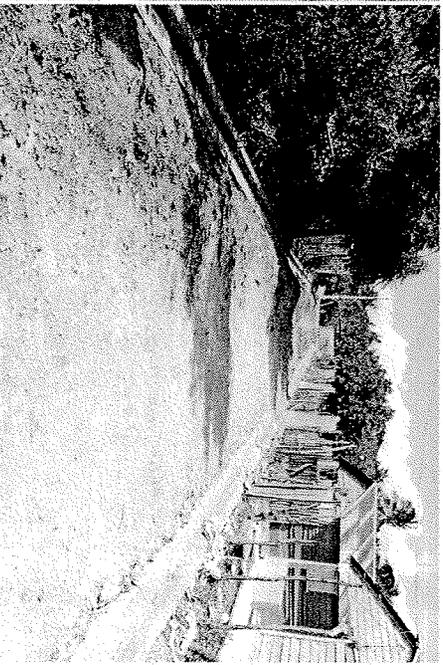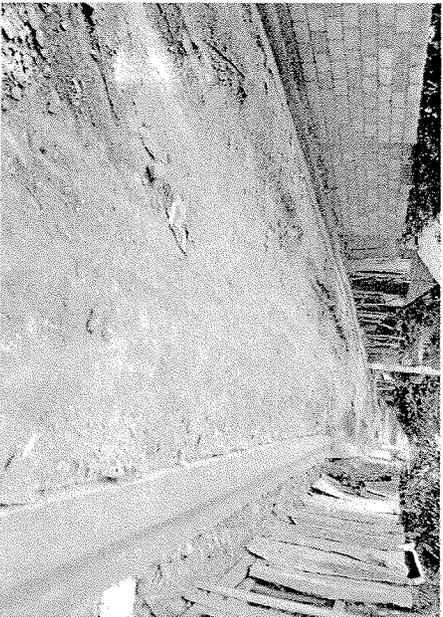

Suministra los datos de este reporte,

*Ana Indhira Ramirez*

ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico

*Daniilo Mercado*

ING. DANILLO MERCADO

Técnico



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: VALVERDE  
MUNICIPIO: MAO  
DISTRITO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
BARRIO Y/O SECTOR: \_\_\_\_\_  
BUENOS AIRES, MARINO TIO, LA COMPUERTA, LOS CORBANOS

2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO  
RNC ó Cédula: 4-09-00024-7

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:  
b. Incluye demoliciones de tramos:  
c. Incluye badenes:   
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.  
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Buenos Aires	19.533972	-71.077583	19.533741	-71.076854	-	-	88.8x2	-	177.6
Tramo B	Buenos Aires	19.533893	-71.076766	19.533326	-71.076396	-	-	113.35x2	-	226.7
Tramo C	Buenos Aires	19.533360	-71.076697	19.533189	-71.076746	-	-	19.7x2	-	39.4
Tramo D	Buenos Aires	19.533911	-71.077472	19.533595	-71.077496	-	-	16.6x2	-	33.2
Tramo E	Buenos Aires	19.533704	-71.077560	19.533786	-71.077469	-	-	48.9x2	-	97.8
Tramo F	Marino Tio	19.531704	-71.074703	19.531744	-71.074861	-	-	27.6x2	-	57.2
Tramo G	La combuerta	19.532274	-71.077825	19.531960	-71.078627	-	-	97x2	-	194
Tramo H	La combuerta	19.532217	-71.078201	19.532356	-71.078348	-	-	23.3x2	-	46.6
Tramo I	Los corbanos	19.534928	-71.080579	19.535397	-71.080189	-	-	65x2	-	130
Tramo J	Los corbanos	19.535351	-71.080251	19.535556	-71.080361	-	-	40.6	-	40.6
Tramo K	Los corbanos	19.533409	-71.080634	19.534375	-71.083105	-	-	223.05x2	-	446.1
Tramo L	Los corbanos	19.533859	-71.080649	19.532439	-71.081343	-	-	73.7x2	-	147.4



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M	Los Corbanos	19.534312,	-71.081114	19.532770,	-71.081837	-	-	160x2	-	320
Tramo N	Los Corbanos	19.533119,	-71.082400	19.535800,	-71.081049	-	-	267.5x2	-	535
Tramo O	Los Corbanos	19.535529,	19.534469,	-71.082405	-71.082699	-	-	52x2	-	104
Tramo P	Los Corbanos	19.534577,	-71.081716	19.534736,	-71.082121	-	-	6x2	-	12
Tramo Q	Los Corbanos	19.535106,	-71.081421	19.535414,	-71.081810	-	-	29x2	-	58
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

2,665.9



**5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

Los contenes se ven muy bien constuidos y el alcalde quiere saber si con estos contenes se puede hacer el reporte de cierre.

**6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR**

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

**NOMBRE COMPLETO:**

Anthony Isidro Almonte Lopez

**CÉDULA:**

094-0023263-4


**CODIA:**

43217

**FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:**

17 de mayo del 2023.

**Valida y aprueba los datos suministrados,**



Sergio de Jesus

Firma y sello


Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



● REDMI NOTE 8  
○ AI QUAD CAMERA



● REDMI NOTE 8  
○ AI QUAD CAMERA

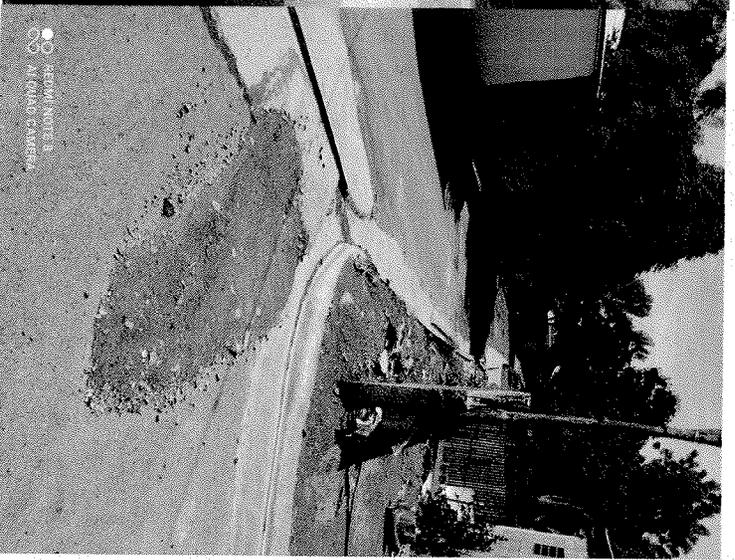

● REDMI NOTE 8  
○ AI QUAD CAMERA

