


**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
17 de mayo de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna 
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho


Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución del DM. Jicomé**


En la visita técnica realizada el 22 de marzo del 2023 se validó la ejecución de 836.94 metros cuadrados de aceras y 975.50 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 189.42 metros cuadrados de aceras y 172.2 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,026.36 metros cuadrados de acera y 1,147.70 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 270203

REGION:

PROVINCIA: VALVERDE

MUNICIPIO: ESPERANZA

DISTRITO MUNICIPAL: JICOME

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22-03-2023


1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ENTRADA LOS POLANCOS	106.30	1.00	1	106.30	1	106.3	106.3
TRAMO B	C/RAFAEL OCTAVIO VARGAS (FELLO)	100.20	0.83	1	100.20	1	83.65	100.2
TRAMO C	A. TEOFILO PEREZ	172.40	1.58	1	198.90	1	273.24	198.9
TRAMO D	A. TEOFILO PEREZ (FRENTE A LA VICE SINDICO)	27.70	0.89	1	27.70	1	24.653	27.7
TRAMO E	C/AMADO ULLOA	143.70	1.01	1	143.7	1	144.612	143.7
TRAMO F	C/SANTA ANA	205.00	0.96	1	205	1	196.8	205
TRAMO G	C/MONTE ADENTRO	11.30	0.68	1	96.85	2	7.684	193.7
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							836.94	975.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,937,031.16
Monto desembolsado RD\$ 2,937,031.17 (100%)
Avance de obra 119.08%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN:
PROVINCIA: VALVERDE
MUNICIPIO: ESPERANZA
DISTRITO MUNICIPAL: JICOMÉ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22-03-2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 836.94 metros cuadrados de aceras y 975.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Las aceras y contenes construidas al momento de la visita cuentan con excelente calidad constructiva.
2. En dos (2) intersecciones se construyeron losas de hormigón armado sobre canaleta abierta con varilla
3. En el Sector KM 7, se construyeron badenes como obras complementarias de drenaje pluvial.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

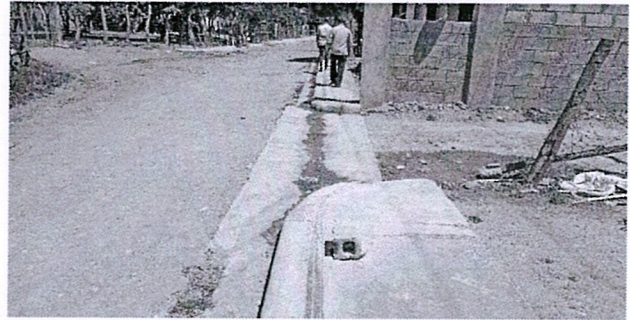

Suministra los datos de este reporte,

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

FELIPE REYES

Técnico

Técnico

Calle	Aceras Long	Ancho	Area
C/ENTRADA LOS POLANCOS	106.3	1	106.3
	106.3	1	106.3
C/RAFAEL OCTAVIO VARGAS (FELLO)	66.2	0.75	49.65
	34	1	34
	100.2	0.834830339	83.65
A. TEOFILO PEREZ	24.7	1.5	37.05
	113.3	1.5	169.95
	18.5		0
	22.4	2.1	47.04
	47.5		0
	12	1.6	19.2
	20.3		0
	72.6		0
172.4	1.584918794	273.24	
A. TEOFILO PEREZ (FRENTE A LA VICE SINDICO)	27.7	0.89	24.653
	27.7	0.89	24.653
C/AMADO ULLOA	15.6	1	15.6
	20	0.65	13
	57.5	0.9	51.75
	50.6	1.27	64.262
	143.7	1.006346555	144.612
C/SANTA ANA	205	0.96	196.8
	205	0.96	196.8
C/MONTE ADENTRO	11.3	0.68	7.684
	11.3	0.68	7.684



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: VALVERDE
MUNICIPIO: ESPERANZA
DISTRITO MUNICIPAL: JICOME
BARRIO Y/O SECTOR:
TEÓFILO PEREZ

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social: JUNTA DISTRITO MUNICIPAL JICOME
RNC ó Cédula: 430-060577-7

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Teófilo Pérez	19.626414	-70.942644	19.624530	-70.942328	172.2	1.10	172.2	189.42	172.2
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										







