



LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA-

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE AVANCE DE OBRA


CODIGO: 280102
REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: BONAO
DISTRITO MUNICIPAL: SABANA DEL PUERTO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de septiembre de 2023
TÉCNICOS: 1. Arq. Zunilda Del Rosario
2. Elisabeht Aguilera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LOS CACAOS DE JIMA	25.90	0.50	1.00	131.20	1.00	12.95	131.20
TRAMO B	LOS PLATANITOS	21.30	1.35	1.00	230.50	2.00	28.76	461.00
TRAMO C	EL ABANICO DE CONSTANZA	361.80	1.50	1.00			542.70	
Total							584.41	592.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,696,428.84
Monto desembolsado RD\$ 3,696,428.85 (100%)
Avance de obra 59.23%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: BONAÓ
DISTRITO MUNICIPAL: SABANA DEL PUERTO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de septiembre de 2023

INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 12/09/2023 se ha ejecutado 584.41 metros cuadrados de aceras y 592.20 metros lineales de contén, lo que corresponde al 59.23% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


- Al momento de agotar nuestra agenda técnica en el Distrito Municipal Sabana del Puerto, sostuvimos un conversatorio el Sr. Juan Francisco Romero Nuñez (Director de la Junta Municipal) el cual nos
1. informó que al momento de la visita la obra no presentaba un avance, es decir, el no había concluido con el 1er ni con el 2do. componente. Nos indico que seguiría construyendo aceras y contenes en la Calle Padre Salvador, hasta la Escuela Basica ubicada en la misma calle.
 2. La Obra en cuestion se esta ejecutando por Administración.
 3. El avance hasta el momento de nuestra visita tecnica realizada el 12/9/2023 es de un 59.23% coincidiendo con el porcentaje arrojado con la visita anterior.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

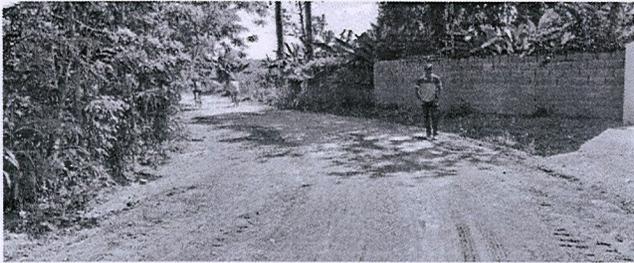

Suministra los datos de este reporte,

Zunilda Del Rosario G.

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

Elisabeth Aguilera G.

ELISABETH AGUILERA

Técnico

