



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
07 de septiembre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho


Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución del D.M. Jayaco**

En la visita técnica realizada el 07 de julio de 2022 se validó la ejecución de 1,653.80 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 1,214.68 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 2,868.48 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 280105
REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: BONAO
DISTRITO MUNICIPAL: JAYACO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de julio de 2022
TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
 2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Puerto rico				23.70	1.00		23.70
TRAMO B	Puerto rico				34.90	1.00		34.90
TRAMO C	Puerto rico				14.00	1.00		14.00
TRAMO D	Puerto rico				53.40	2.00		106.80
TRAMO E	Puerto rico				12.70	1.00		12.70
TRAMO F	Puerto rico				212.50	2.00		425.00
TRAMO G	Puerto rico				9.70	2.00		19.40
TRAMO H	Puerto rico				11.00	1.00		11.00
TRAMO I	Puerto rico				285.40	2.00		570.80
TRAMO J	Puerto rico				17.70	1.00		17.70
TRAMO K	Puerto rico				208.90	2.00		417.80
Total								1,653.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,479,736.96
 Monto desembolsado RD\$ 3,479,736.97 (100%)
 Avance de obra 118.97%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: BONAÓ
DISTRITO MUNICIPAL: JAYACO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de julio de 2022

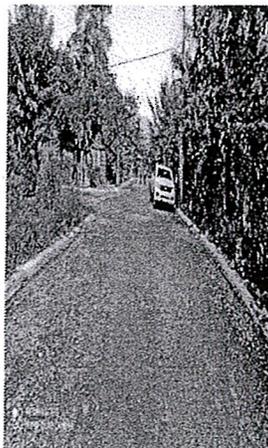
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,653.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.


NOTAS

1. Esta alcaldía solo ejecuto contenes para el aprovechamiento del programa de asfalto que se realizara en esa localidad
2. Estos contenes fueron ejecutado bajo los parametros establecidos con relacion a la terminacion y los niveles correspondientes.


IMÁGENES



Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico


ARQ. KEILYN MORA

Técnico



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

3ER COMPONENTE

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:

Monsenor Nouel

MUNICIPIO:

Bonao

DISTRITO MUNICIPAL:

Jayaco

BARRIO Y/O SECTOR:

Puerto Rico / Malaguan

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

b. Contratista

Razón Social

Kenedys Rodriguez P.

RNC ó Cédula:

048-00718194

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes:

b. Incluye demoliciones de tramos:

c. Incluye badenes:

d. Otros:

construcción de 1,214.69 m² de aceras

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m ²)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Lado derecho C/ principal	19.018200	70.430328	19.015390	70.429321	381.1	0.93		354.33	
Tramo B	L Izq. C/ principal	19.018154	70.430435	19.015659	70.429878	296.9	1.02		302.84	
Tramo C	C/ principal	19.015612	70.429817	19.01539	70.429321	7.00	1.03		7.21	
Tramo D	C/ principal	19.01539	70.429321	19.013832	70.427851	9.4	0.99		9.31	
Tramo E	C/ principal	19.014074	70.427485	19.012314	70.427612	201.7	1.03		207.75	
Tramo F	C/ principal	19.013832	70.427551	19.013006	70.427689	99.7	0.76		75.77	
Tramo G	C/ principal	19.012737	70.427734	19.012169	70.427650	65.6	0.87		57.07	
Tramo H	Lado Izq. C/ principal	19.012079	70.427597	19.011736	70.427505	46.5	1.00		46.5	
Tramo I	C/ principal	19.011217	70.427513	19.011211	70.427388	23.2	0.85		19.72	
Tramo J	L Izq. C/ principal	19.010597	70.426201	19.010267	70.425255	108.00	1.13		122.04	
Tramo K	C/ principal	19.010126	70.424927	19.009054	70.424896	11.8	1.03		12.15	
Tramo L										

Σ = 1,214.69



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Bm. de Jayaco realizo todos los trabajos de aceras en la primera partida realizada en los centros.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Julio Cesar Muñoz O.

FIRMA:

[Handwritten signature]

CÉDULA:

056-0148422-2

CODIA:

25464

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

31/8/23

Valida y aprueba los datos suministrados,

[Handwritten signature]

Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



