



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

Santo Domingo, D.N.
03 de octubre de 2023

Al:

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto:


Remisión de informe de cierre de ejecución de Piedra Blanca.

En la visita técnica realizada el 18 de agosto de 2022 se validó la ejecución de 2,509.8 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 897.1 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 3,406.90 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 280301

REGIÓN: CIBAO SUR

PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL

MUNICIPIO: PIEDRA BLANCA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 18/8/2022

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Ing. Richard Cabrera


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	ORLANDO MARTINEZ				130.80	1		130.8
TRAMO B	ORLANDO MARTINEZ				138.20	2		276.4
TRAMO C	ORLANDO MARTINEZ				59.30	2		118.6
TRAMO D	JUAN RAMON DE LA CRUZ				36.8	2		73.6
TRAMO E	SENON MEDINA				58.2	2		116.4
TRAMO F	JUAN RAMON DE LA CRUZ				127	1		127
TRAMO G	SENON MEDINA				28.8	2		57.6
TRAMO H	PROYECTO				42.2	2		84.4
TRAMO I	YOLANDA GUZMAN				103.8	1		103.8
TRAMO J	SENON MEDINA				61.1	2		122.2
TRAMO K	PROYECTO				154.5	1		154.5
TRAMO L	SENON MEDINA				30.3	2		60.6
TRAMO M	SENON MEDINA				43	1		43
TRAMO N	MESIA				65.1	2		130.2
TRAMO O	ORLANDO MARTINEZ				129.7	1		129.7
TRAMO P	PROYECTO				127.1	2		254.2
TRAMO Q	PROYECTO				157.1	2		314.2
TRAMO R	FRANCISCO CAAMAÑO				67.3	2		134.6
TRAMO S	FRANCISCO CAAMAÑO				39	2		78
TRAMO T								
Total							0	2509.8

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,757,814.03

Monto desembolsado RD\$ 1,878,907.02 (50%)

Avance de obra 167.19%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: C.BAO SUR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 18 de agosto de 2022

PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL

MUNICIPIO: PIEDRA BLANCA

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,509.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS




1. Se emplearon los fondos del programa en la construcción de contenes únicamente.
2. La modalidad de ejecución es por contrato.

IMÁGENES

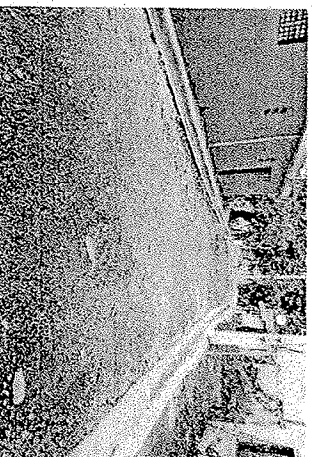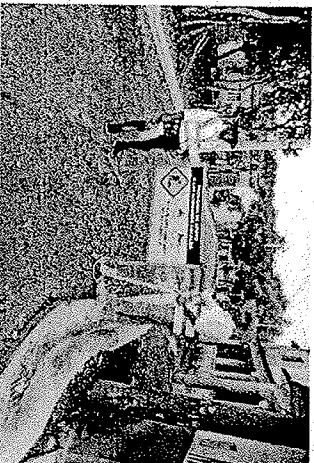



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

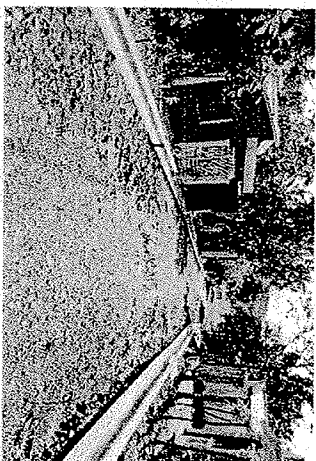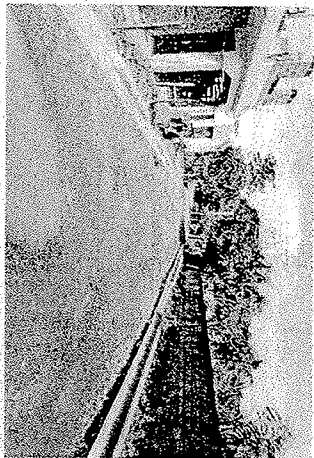

Suministra los datos de este reporte.


ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

ING. RICHARD CABRERA

Técnico



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL

MUNICIPIO: PIEDRA BLANCA

DISTRITO MUNICIPAL: N/A

BARRIO Y/O SECTOR: _____

LOS CUBANOS, VILLA PROGRESO

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social
RNC ó Cédula:

JOSE RAFAEL REYES MARCELINO
4020888767-5

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	CALLE S/N BARRIO CUABANO	362603	2083466	362474	2083576			235.50		488.00
Tramo B	CALLE S/N VILLA PROGRESO	359644	2084939	359691	2084996			72.00		144.00
Tramo C	CALLE S/N VILLA PROGRESO	359677	2084890	359710	2084884			43.50		67.10
Tramo D	CALLE S/N VILLA PROGRESO	359682	2084850	359626	2084773			99.00		198.00
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

S=897.1ml



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SOLO SE CONSTRUYERON CONTENES







6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR Anexar imágenes de las obras.

BARRIO LOS CUBANOS

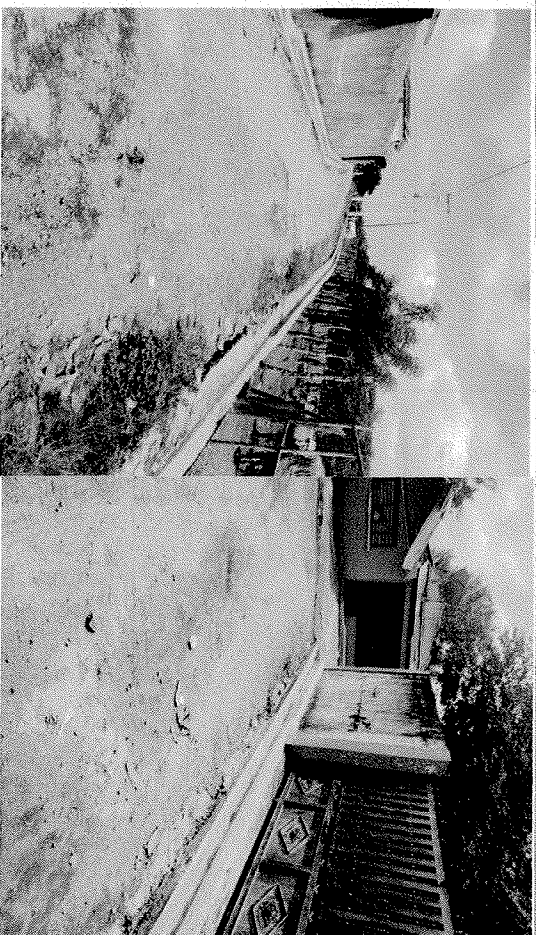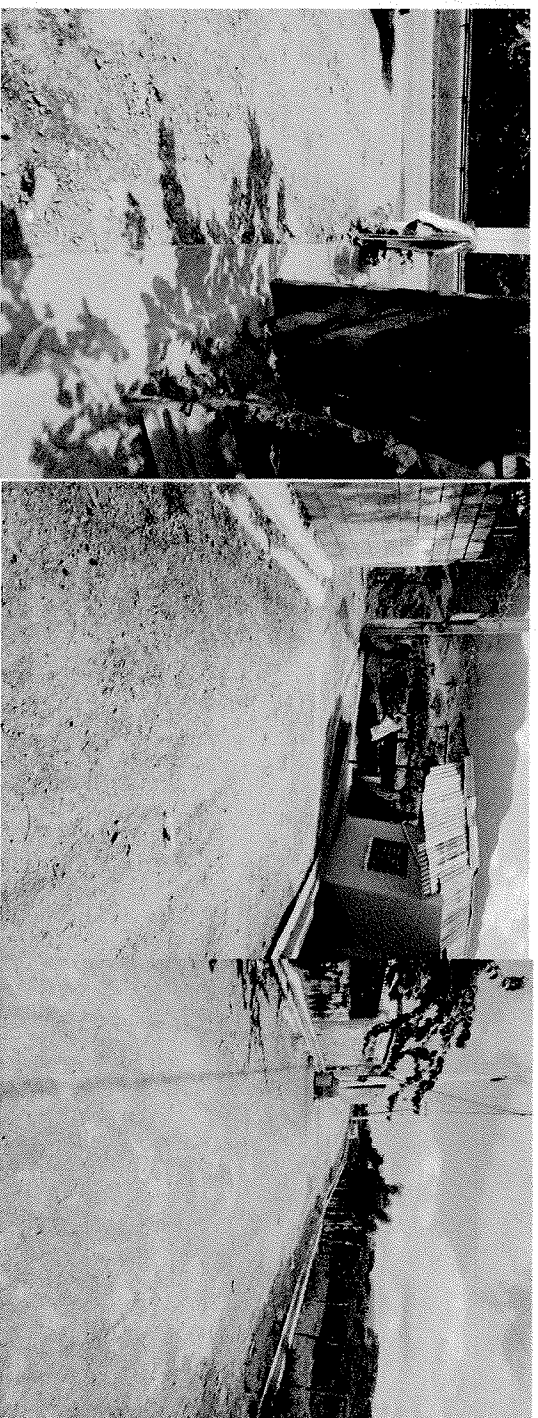

BARRIO VILLA PROGRESO

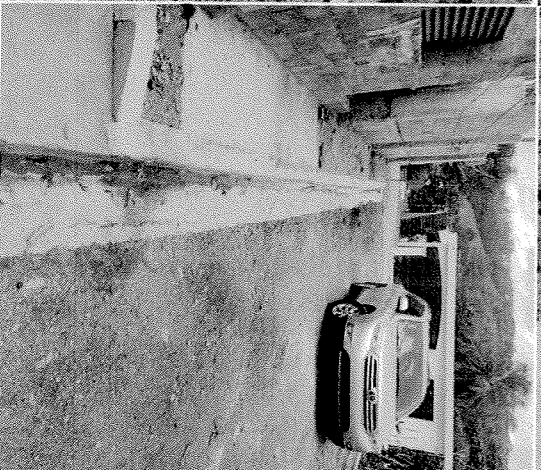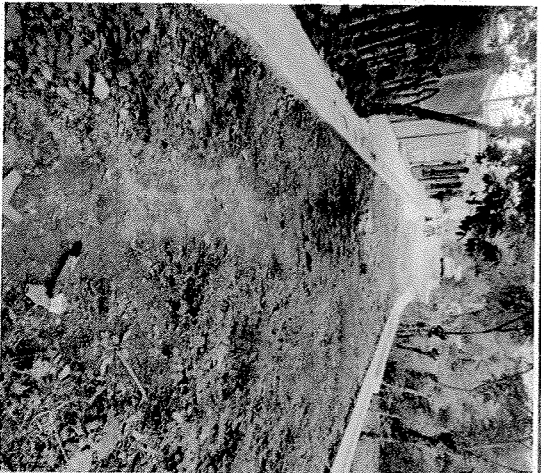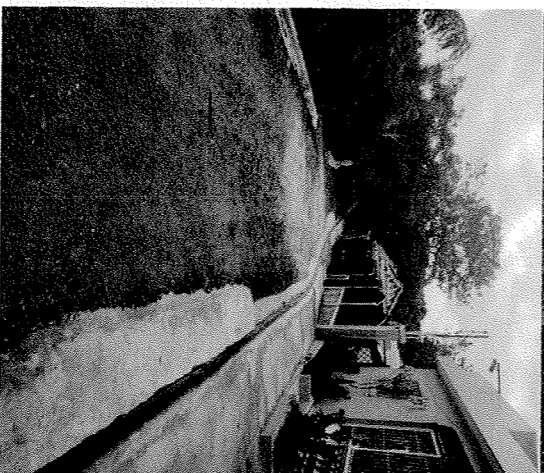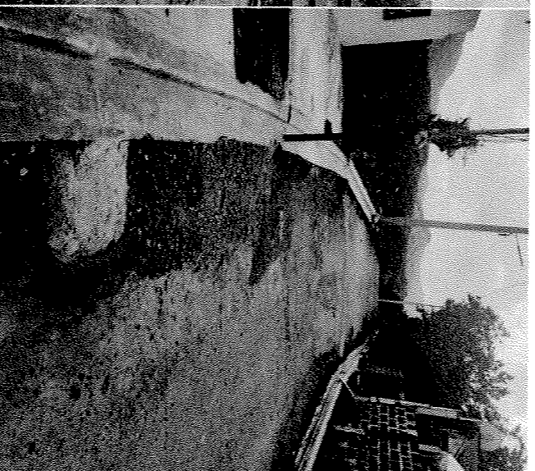



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Los Contenedores fueron Compuados

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte al Supervisor,

NOMBRE COMPLETO: JULIO CESAR MUÑOZ MINIER

FIRMA:

CÉDULA: 0560014007-2

CODIA: 8831

FECHA DE LA VISITA

TÉCNICA:

11/08/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,

PEDRO CONTRERAS BURGOS
Firma y sello
Alcalde/a Municipal

