



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


CODIGO: 280303  
REGIÓN: CIBAO SUR  
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL  
MUNICIPIO: PIEDRA BLANCA  
DISTRITO MUNICIPAL: JUAN ADRIÁN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de mayo de 2023  
TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera  
2. Felipe Reyes

| TRAMOS  | NOMBRE DE LA CALLE                           | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|---------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A | C1 (REFERENCIA SUPER COLMADO EL SANTIAGUERO) | 16.90                  | 0.70                | 1.00                         | 16.90                 | 1.00                           | 11.83                | 16.90                 |
| TRAMO B | C2                                           | 78.70                  | 0.50                | 1.00                         | 127.70                | 1.00                           | 39.35                | 127.70                |
| TRAMO C | C3                                           | -                      | -                   | 1.00                         | 17.30                 | 1.00                           | -                    | 17.30                 |
| TRAMO D | C4                                           | 35.30                  | 0.70                | 1.00                         | 35.30                 | 1.00                           | 24.71                | 35.30                 |
| TRAMO E | C5                                           | 4.20                   | 0.88                | 1.00                         | 42.20                 | 1.00                           | 3.70                 | 42.20                 |
| TRAMO F | C6                                           | 42.50                  | 0.67                | 1.00                         | 42.50                 | 1.00                           | 28.48                | 42.50                 |
| TRAMO G | C7                                           | 50.00                  | 0.67                | 1.00                         | 101.40                | 1.00                           | 33.50                | 101.40                |
| TRAMO H | C8                                           | 132.70                 | 0.85                | 1.00                         | 149.10                | 1.00                           | 112.80               | 149.10                |
| TRAMO I | C9                                           | 89.32                  | 1.10                | 1.00                         | 97.30                 | 1.00                           | 98.25                | 97.30                 |
| TRAMO J | C10                                          | 68.70                  | 0.90                | 1.00                         | 157.90                | 1.00                           | 61.83                | 157.90                |
| TRAMO K | C7/ROSA EUFENIA BULCASE                      | 315.21                 | 1.00                | 1.00                         | 472.50                | 1.00                           | 315.21               | 472.50                |
| Total   |                                              |                        |                     |                              |                       |                                | 729.65               | 1,260.10              |

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,963,494.03  
Monto desembolsado RD\$ 2,963,494.03 (100%)  
Avance de obra 136.23%





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de mayo de 2023

PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL

MUNICIPIO: PIEDRA BLANCA

DISTRITO MUNICIPAL: JUAN ADRIÁN



## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 729.65 metros cuadrados de aceras y 1,260.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## NOTAS



1. Gobierno local cumple con el metraje recomendado por el programa.
2. Durante el Levantamiento se observaron la construcción de badenes realizados en algunas zonas.

## IMÁGENES

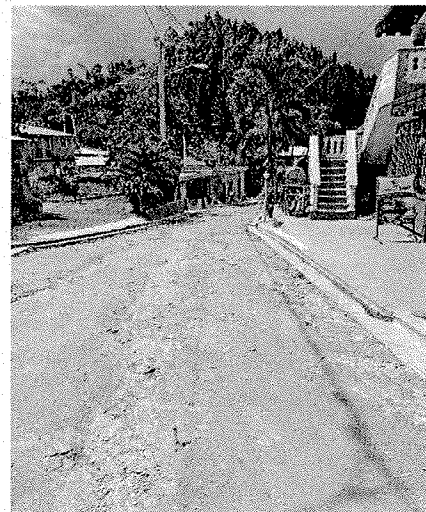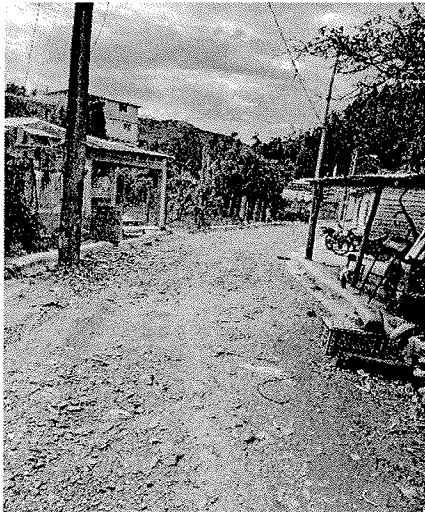



## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

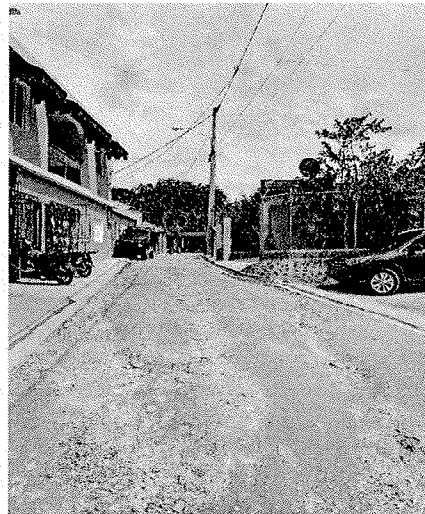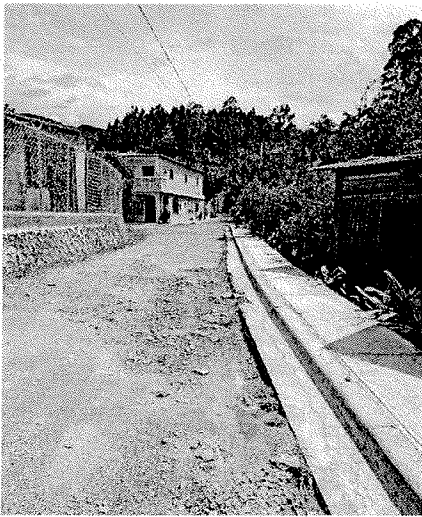

*Suministra los datos de este reporte,*

ING. RICHARD CABRERA  
Técnico

FELIPE REYES  
Técnico

