



**LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA**

Santo Domingo, D.N.
18 de agosto de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución del D.M. Juan Adrian**

En la visita técnica realizada el 24 de mayo de 2023 se validó la ejecución de 729.65 metros cuadrados de aceras y 1,260.10 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 29.37 metros cuadrados de aceras y 458.2 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 759.02 metros cuadrados de aceras y 1,718.3 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 280303
REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: PIEDRA BLANCA
DISTRITO MUNICIPAL: JUAN ADRIÁN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de mayo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C1 (REFERENCIA SUPER COLMADO EL SANTIAGUERO)	16.90	0.70	1.00	16.90	1.00	11.83	16.90
TRAMO B	C2	78.70	0.50	1.00	127.70	1.00	39.35	127.70
TRAMO C	C3	-	-	1.00	17.30	1.00	-	17.30
TRAMO D	C4	35.30	0.70	1.00	35.30	1.00	24.71	35.30
TRAMO E	C5	4.20	0.88	1.00	42.20	1.00	3.70	42.20
TRAMO F	C6	42.50	0.67	1.00	42.50	1.00	28.48	42.50
TRAMO G	C7	50.00	0.67	1.00	101.40	1.00	33.50	101.40
TRAMO H	C8	132.70	0.85	1.00	149.10	1.00	112.80	149.10
TRAMO I	C9	89.32	1.10	1.00	97.30	1.00	98.25	97.30
TRAMO J	C10	68.70	0.90	1.00	157.90	1.00	61.83	157.90
TRAMO K	C/ROSA EUFENIA BULCASE	315.21	1.00	1.00	472.50	1.00	315.21	472.50
Total							729.65	1,260.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,963,494.03
 Monto desembolsado RD\$ 2,963,494.03 (100%)
 Avance de obra 136.23%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de mayo de 2023

PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL

MUNICIPIO: PIEDRA BLANCA


DISTRITO MUNICIPAL: JUAN ADRIÁN

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 729.65 metros cuadrados de aceras y 1,260.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Gobierno local cumple con el metraje recomendado por el programa.
2. Durante el Levantamiento se observaron la construcción de badenes realizados en algunas zonas.


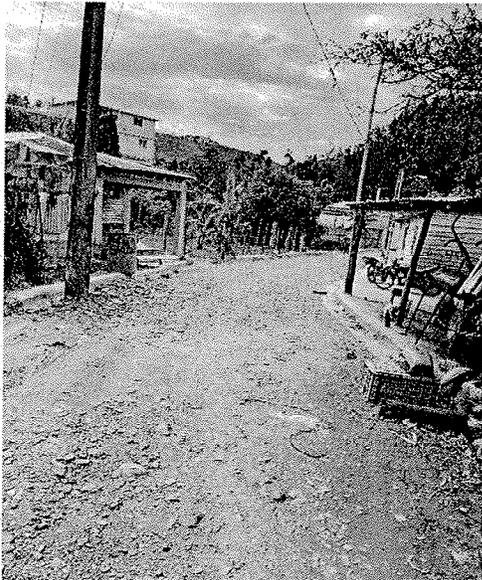


IMÁGENES

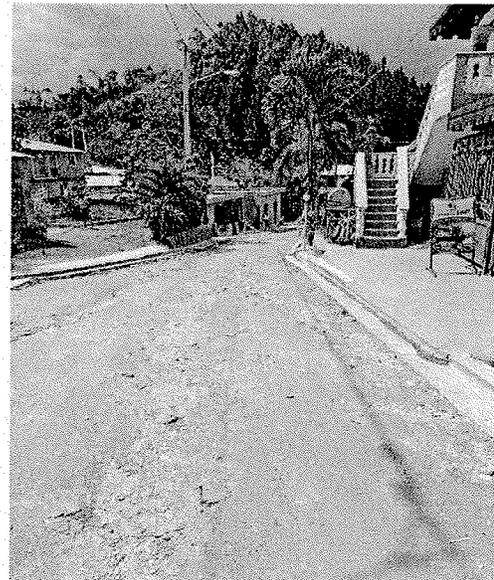



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

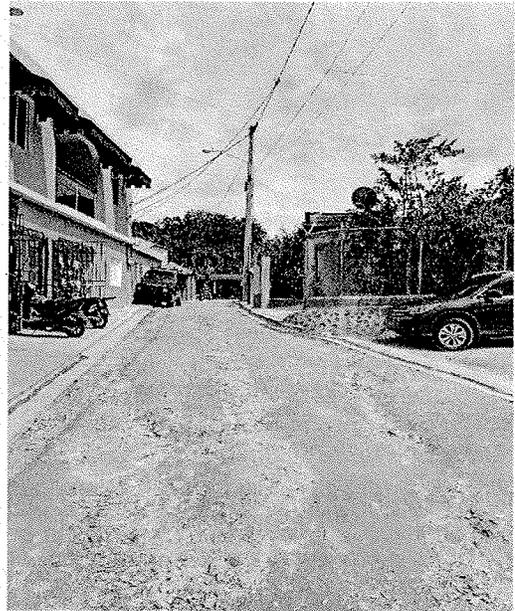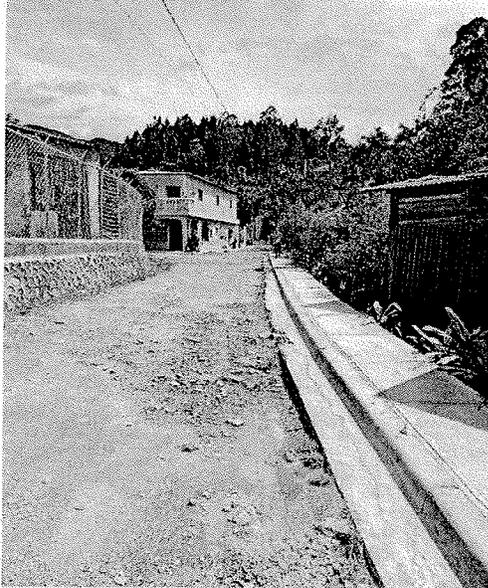

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico

FELIPE REYES
Técnico

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: PIEDRA BLANCA
DISTRITO MUNICIPAL: JUAN ADRIAN
BARRIO Y/O SECTOR:
SECTOR LOS PLATANOS

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social JUNTA DISTRITAL JUAN ADRIAN
RNC ó Cédula: 430051055

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

CONSTRUCCION DE DE 458.2ML DE CONTENES Y 29.37M2 DE ACERA

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m ²)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	<i>Lab. de la calle</i> calle pedro mateo	18.781387	70.323486	18.782534	70.324089			154.90		154.90
Tramo B	calle pedro mateo	18.782534	70.324089	18.782026	70.324677			144.20		144.20
Tramo C	el prolongación pedrom	18.782534	70.324089	18.782026	70.324677	26.7	1.10	26.70	29.37	26.70
Tramo D	el prolongación pedro mateo	18.782026	70.324677	18.781660	70.324387			51.30		51.30
Tramo E	<i>Lab. reparado.</i> calle pedro mateo	18.781660	70.324387	18.781776	70.323814			81.10		81.10
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Acera = 29.37 M²
 Contenes = 458.2 ML

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Julissa Muñoz O.

FIRMA:

[Handwritten signature]

CÉDULA:

056-0148422-2

CODIA:


25464

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

31/7/23

Valida y aprueba los datos suministrados,

[Handwritten signature]



Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

