



# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 290302

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: SABANA GRANDE DE BOYÁ

DISTRITO MUNICIPAL: GONZALO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de febrero de 2023

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Ing. Stephany Castro

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A.	DUARTE	32.20	1.00	1	189.20	1	32.2	189.2
TRAMO B	PROYECTO 1	91.20	0.96	2	127.70	2	182.4	255.4
TRAMO C	PROYECTO 2	70.30	1.00	1	70.30	1	70.3	70.3
TRAMO D	CALLE 1	106.00	1.00	2	106.00	2	212	212
TRAMO E	CALLE 2	137.00	1.03	2	137	2	282.72	274
TRAMO F	CALLE 3	341.00	1.03	2	316.35	2	702.46	632.7
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1481.58	1633.60

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,172,919.47  
Monto desembolsado RD\$ 3,172,919.48 (100%)  
Avance de obra 192.83%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** HIGUAMO

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 24 de febrero de 2023

**PROVINCIA:** MONTE PLATA

**MUNICIPIO:** SABANA GRANDE DE BOYÁ

**DISTRITO MUNICIPAL:** GONZALO


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,481.58 metros cuadrados de aceras y 1,633.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS


1. Esta obra fue ejecutada por administración.
2. Se puede observar que cumple con las especificaciones recomendadas.

### IMÁGENES

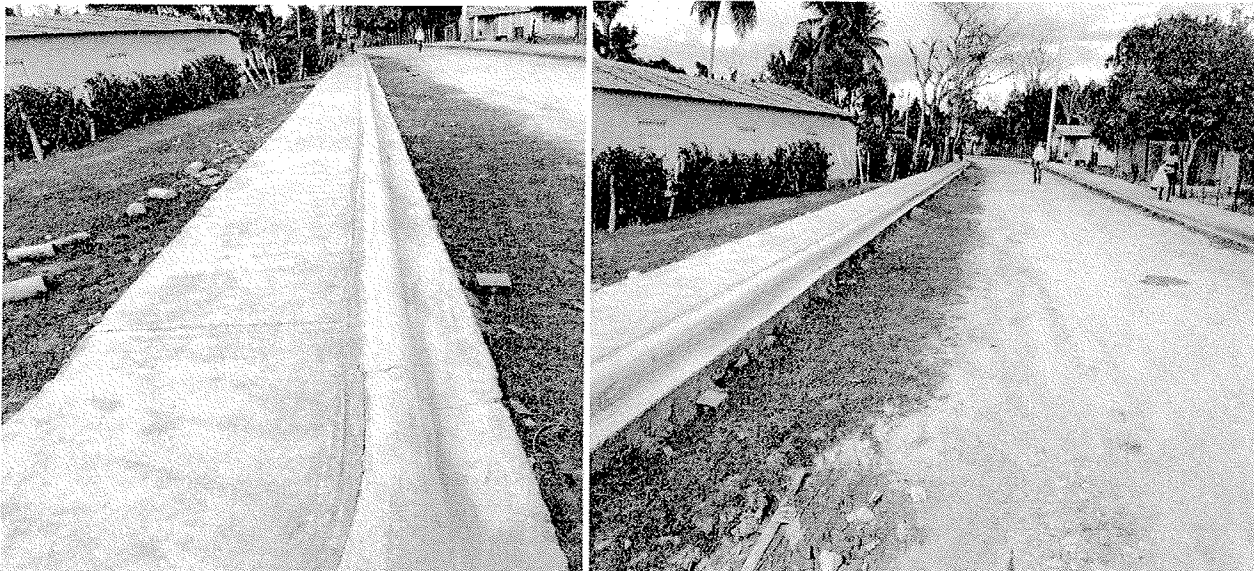



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

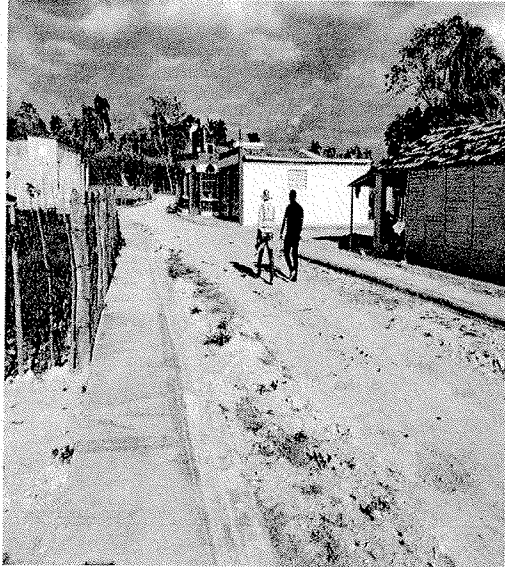

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA  
Técnico

  
ING. STEPHANY CASTRO  
Técnico
