



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 300101
REGIÓN: HIGUAMO
PROVINCIA: HATO MAYOR
MUNICIPIO: HATO MAYOR

DISTRITO MUNICIPAL: -


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de junio de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LUPERON	1,805.83	1.00	1.00	2,478.80	1.00	1,805.83	2,478.80
Total							1,805.83	2,478.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 7,476,173.02
Monto desembolsado RD\$ 7,476,173.03 (100%)
Avance de obra 116.27%



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de junio de 2022

PROVINCIA: HATO MAYOR
MUNICIPIO: HATO MAYOR

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,805.83 metros cuadrados de aceras y 2,478.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. La construcción de las aceras y contenes se realizaron acorde a las requerimientos técnicos sugeridos para estos fines.


IMÁGENES

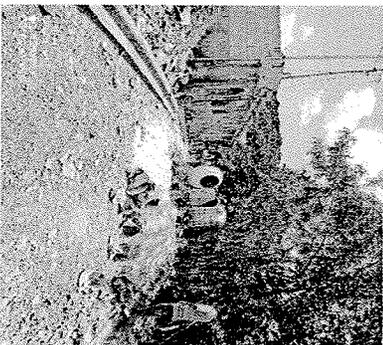

Suministra los datos de este reporte,


ING. STÁYLIN MENDOZA

Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico
