



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 300103

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: HATO MAYOR

MUNICIPIO: HATO MAYOR

DISTRITO MUNICIPAL: MATA PALACIO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de mayo de 2023

1. César De Los Santos

TÉCNICOS: 2. Ing. Ana Indhira Rámirez


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle segunda	112.40	1.00	2.00	112.40	2.00	224.80	224.80
TRAMO B	Calle segunda	93.10	1.00	2.00	93.10	2.00	186.20	186.20
TRAMO C	Calle Duarte	46.70	1.00	1.00			46.70	
TRAMO D	Calle Mechon Contin	92.00	1.00	2.00	92.00	2.00	184.00	184.00
TRAMO E	Los hermanos de ramoncito	99.20	1.00	2.00	99.20	2.00	198.40	198.40
TRAMO F	Calle del brujo	163.70	1.00	1.00	163.70	1.00	163.70	163.70
TRAMO G	Calle frente al colmado francis	109.20	1.15	1.00	109.20	1.00	125.58	109.20
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1,129.38	1,066.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,191,465.17

Monto desembolsado RD\$ 3,191,465.18 (100%)

Avance de obra 131.94%



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: HATO MAYOR

MUNICIPIO: HATO MAYOR

DISTRITO MUNICIPAL: MATA PALACIO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de mayo de 2023



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,129.38 metros cuadrados de aceras y 1,066.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Este distrito esta ejecutando por contrato.
2. El alcalde nos expresa que va construir mas contenes que aceras para poder aprovechar el asfalto pror
3. Al momento del levantamiento estuvieron presente ambas partes y municipes del lugar.
4. Lo construido cumple con los parametros recomendados.

IMÁGENES

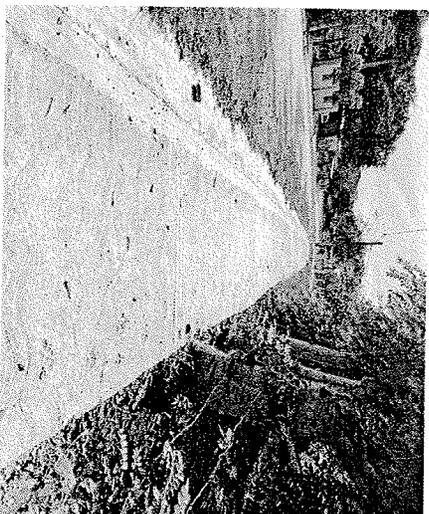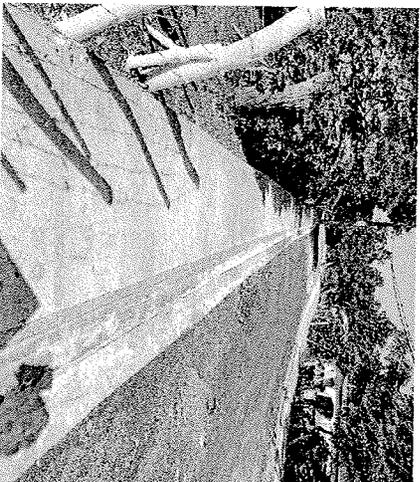





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

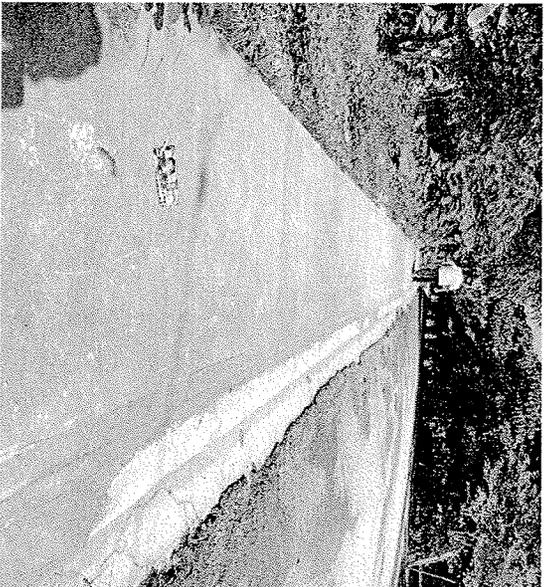

Suministra los datos de este reporte,


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico
