



LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA-

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


CODIGO: 300104
REGIÓN: HIGUAMO
PROVINCIA: HATO MAYOR
MUNICIPIO: HATO MAYOR
DISTRITO MUNICIPAL: GUAYABO DULCE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 30 de agosto de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Félix Tavárez
 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	JALONGA LA 40				840.10	1.00		840.10
TRAMO B	BARRIO LA BOMBA	131.70	2.50	1.00			329.25	
TRAMO C	CALLEJÓN / PEATONAL BLADIMIR	80.20	2.50	1.00			200.50	
TRAMO D	C/ PRINCIPAL	196.70	2.10	1.00			413.07	
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							942.82	840.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,472,036.70
 Monto desembolsado RD\$ 3,472,036.70 (100%)
 Avance de obra 97.59%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 30 de agosto de 2023

PROVINCIA: HATO MAYOR

MUNICIPIO: HATO MAYOR

DISTRITO MUNICIPAL: GUAYABO DULCE

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 942.82 metros cuadrados de aceras y 840.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. En el sector denominado barrio la bomba por se consideró la losa de la canaleta como acera, ya que su funcionalidad funge como paseo peatonal.
2. Las aceras ejecutadas presentan una muy buena calidad y cumplen con lo recomendado por la LMD

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

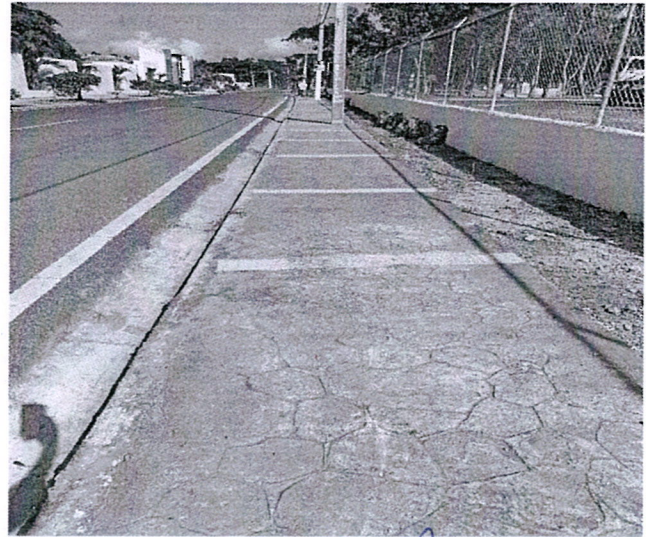

Suministra los datos de este reporte,

ING. FÉLIX TAVÁREZ

Técnico

CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico
