

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE AVANCE DE OBRA

**CODIGO:** 300202

**REGIÓN:** HIGUAMO

**PROVINCIA:** HATO MAYOR

**MUNICIPIO:** SABANA DE LA MAR

**DISTRITO MUNICIPAL:** ELUPINA CORDERO DE LAS CAÑITAS

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 8 de febrero de 2023

1. Felipe Reyes

**TÉCNICOS:** 2. Ing. Fichard Cabrera


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	BARRIO MAGUA							
TRAMO B					99.80	1		99.8
TRAMO C					43.90	1		43.9
TRAMO D					66.60	1		66.6
TRAMO E					62.5	1		62.5
TRAMO F					60.8	1		60.8
TRAMO G					47.5	1		47.5
TRAMO H					47.4	1		47.4
TRAMO I					114.5	2		229
<b>Total</b>							0.00	657.50

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,883,020.87

Monto desembolsado RD\$ 1,441,510.44 (50%)

Avance de obra 57.74%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** HIGUAMO

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 8 de febrero de 2023

**PROVINCIA:** HATO MAYOR

**MUNICIPIO:** SABANA DE LA MAR

**DISTRITO MUNICIPAL:** ELUPINA CORDERO DE LAS CAÑITAS


## **INFORME DE AVANCE DE OBRA**

A la fecha de 08/02/2023 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 657.50 metros lineales de contén, lo que corresponde al 57.74% del fondo asignado para este territorio.

### **NOTAS**


1. Algunos tramos no supera el espesor estimado.
2. La lluvia a dificultado el avance del trabajo.

### **IMÁGENES**

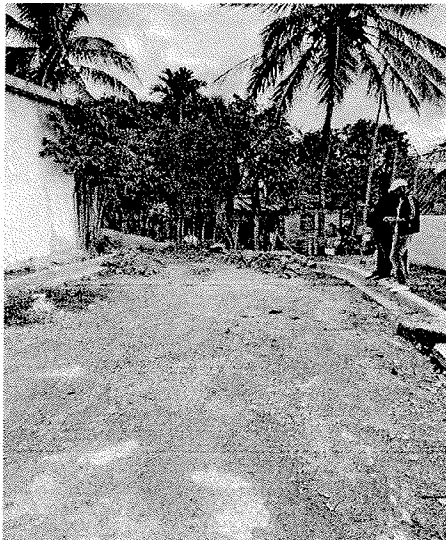





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

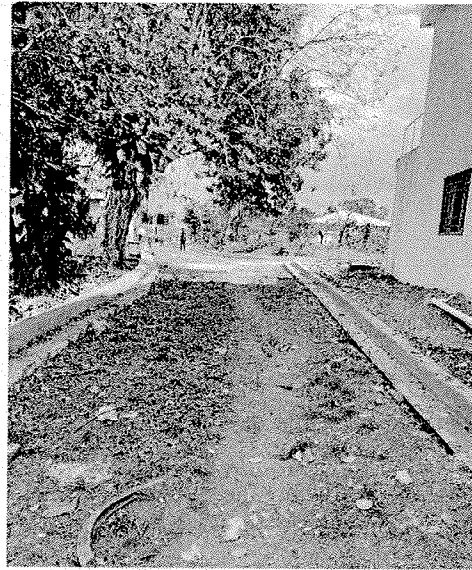

Suministra los datos de este reporte,

  
\_\_\_\_\_  
**FELIPE REYES**  
Técnico

  
\_\_\_\_\_  
**ING. RICHARD CABRERA**  
Técnico

