



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
18 de agosto de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

D/O Ing. 

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de San José de Ocoa**

En la visita técnica realizada el 09 de marzo del 2023 se validó la ejecución de 520.60 metros cuadrados de aceras y 2,207.40 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 335.32 metros cuadrados de aceras y 340.50 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 855.92 metros cuadrados de acera y 2,547.9 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 88% de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 310101
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: SAN JOSÉ DE OCOA
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE OCOA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de marzo de 2023
TÉCNICOS:
 1. Ing. Stephanie S. Castro
 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (M)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SAN RAFAEL	33.10	0.81	2	33.10	2	53.622	66.2
TRAMO B	C/MARTIN MARTINEZ	59.80	0.59	1	69.20	1	35.282	69.2
TRAMO C	C/SAN FRANCISCO	36.30	0.85	1	36.30	1	30.855	36.3
TRAMO D	RESPALDO C/SAN FRANCISCO	50.85	0.95	2	121.90	2	96.35433333	243.8
TRAMO E	SANTA CLARA	53.35	0.78	2	145.35	2	83.226	290.7
TRAMO F	LA ESPERANZA (CALLE 1)	12.20	0.90	1	73.4	2	10.98	146.8
TRAMO G	LA ESPERANZA (CALLE 3)	12.90	0.68	1	27.6	2	8.7075	55.2
TRAMO H	LA ESPERANZA (CALLE 2)				55.3	1		55.3
TRAMO I	EL PUENTE	23.00	0.75	1	156.7	2	17.25	313.4
TRAMO J	LAS CAOBAS				171.9	2		343.8
TRAMO K	BALLONA	139.00	0.66	2	110	2	184.32	220
TRAMO L	LOS RANCHITOS				183.35	2		366.7
Total							520.60	2207.40

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,394,933.15
 Monto desembolsado RD\$ 5,394,933.15 (100%)
 Avance de obra 117.72%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de marzo de 2023

PROVINCIA: SAN JOSÉ DE OCOA

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE OCOA

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 520.60 metros cuadrados de aceras y 2,207.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. En el levantamiento realizado se pudo observar que cumplen con los parámetros recomendados por el programa.
2. En algunas áreas se puede visualizar que se utilizó telford tanto en aceras como en contenes.
3. Debido al alto volumen de agua que circula en la zona cuando llueve, los contenes tienen una batea mayor a lo estándar y esta tendría un ancho de 0.45 metros.

IMÁGENES

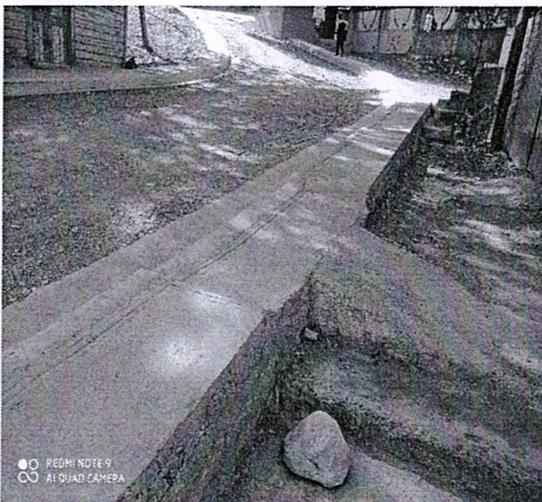





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. STEPHANIE S. CASTRO
Técnico


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SAN JOSE DE OCOA

MUNICIPIO: SAN JOSE DE OCOA

DISTRITO MUNICIPAL: _____

BARRIO Y/O SECTOR: _____

ARROYO PALMA, ENTRE LICEO Y APTOS. CALLES NO TIENEN NOMBRE

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social **RAMON FRANCO**

RNC ó Cédula: **013-0029453-3**

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros: **X**

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
① Tramo A	Alcornoque Nuñez de Cáceres	18.53358	-70.51417	18.53219	-70.51409	172.10	1.00	172.1	172.10	172.10
② Tramo B		18.53353	-70.51412	18.53261	-70.51419	108.3	1.00	108.30	108.30	108.30
③ Tramo C		18.53261	-70.51419	18.53241	-70.51406	25.9	0.80	25.90	20.72	25.90
④ Tramo D		18.53241	-70.51406	18.53222	-70.51384	34.2	1.00	34.20	34.20	34.20
Tramo E								total	335.32 m ²	340.50 ML
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Radio de Giro tramo D tomar en cuenta terminación
- mejorar terminación en juntas y Biolines de Aceras
- mejorar limpieza en Aceras y contenes
- Condición de presupuesto Asignado (AVANCE)

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Alis yos / mecedas

CÉDULA:

402-2112386-8

CODIA:

35877

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

16/03/2023


Valida y aprueba los datos suministrados,



Dr. Isidoro

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA (MUNICIPIO CABECERA)

Capa sin título



INICIO A



TRAMO A



FINAL A



INICIO B



TRAMO B



FINAL B- INICIO C



TRAMO C



INICIO FINAL C - INICIO D



TRAMO D



FINAL D

LEVANTAMIENTOS, DE
ACERAS Y CONTENES



CONDICIONES QUE SE DIERON POR EL LUGAR

