



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 320501

REGIÓN: OZAMA

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: SAN ANTONIO DE GUERRA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15 de noviembre de 2022

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE MERCEDES	434.50	0.90	2	434.50	2	782.1	869
TRAMO B	DOÑA JULIA CALLE 1RA	110.20	1.00	2	110.20	2	220.4	220.4
TRAMO C	RESP. LA MERCEDES 1RA	35.70	1.00	2	35.70	2	71.4	71.4
TRAMO D	RESP. LA MERCEDES 2DA	22.80	1.00	2	22.80	2	45.6	45.6
TRAMO E	LA JOYA 1	96.40	1.11	1	96.4	1	106.522	96.4
TRAMO F	LA JOYA 3	50.70	1.00	1	50.7	1	50.7	50.7
TRAMO G	LA JOYA 1	49.70	1.00	1	49.7	1	49.7	49.7
TRAMO H	LA JOYA 2	25.00	1.00	2	25	2	50	50
TRAMO I	LA JOYA 1	29.60	1.00	1	29.6	1	29.6	29.6
TRAMO J	LA REBALOSA	246.40	1.12	1	246.4	2	275.968	492.8
TRAMO K	ENTRADA DE PISINAN CALLE 1RA	160.10	1.00	2	160.1	2	320.2	320.2
TRAMO L	CRUCE DE GUERRA	133.20	1.00	1	133.2	1	133.2	133.2
Total							2135.39	2429.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 6,751,155.38

Monto desembolsado RD\$ 6,751,155.38 (100%)

Avance de obra 133.34%



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15 de noviembre de 2022

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: SAN ANTONIO DE GUERRA

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,135.39 metros cuadrados de aceras y 2,429.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Esta obra fue ejecutada por contrato.
2. Esta obra fue ejecutada en cinco diferentes localidades del municipio.
3. La ejecución tanto de las aceras como de los contenes son buenas a excepción de un tramo de aproximadamente 20 ml de acera que tiene malterminación de la misma.

IMÁGENES

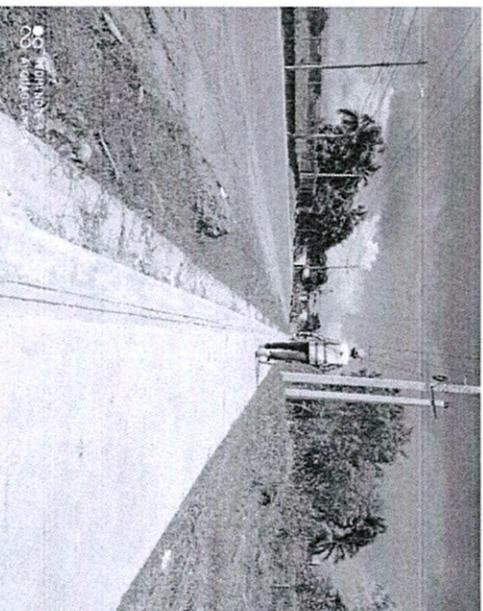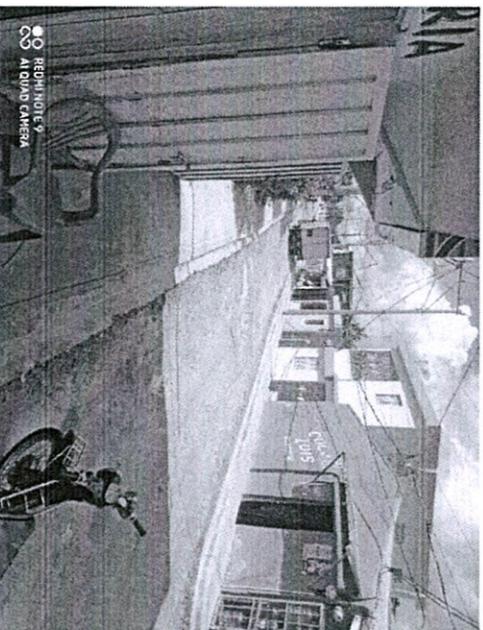



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

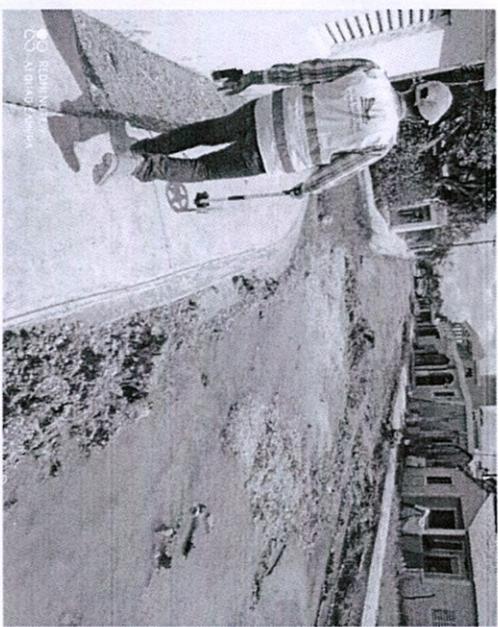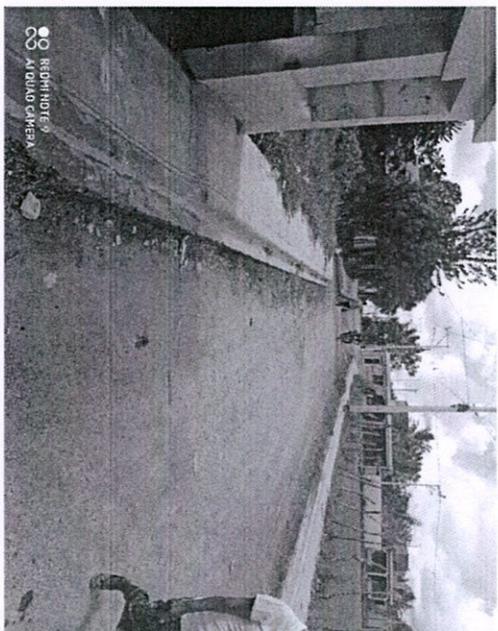

Suministra los datos de este reporte,


ING. EDWARD ACOSTA

Técnico


ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

