



# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 320603  
**REGIÓN:** OZAMA  
**PROVINCIA:** SANTO DOMINGO  
**MUNICIPIO:** LOS ALCARRIZOS  
**DISTRITO MUNICIPAL:** PANTOJA


**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 16 de enero de 2023

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Ana Indhira Ramírez  
2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	VILLA FLORES (CALLE PROGRESO)	568.85	1.00	2	578.20	2	1137.7	1156.4
TRAMO B	CALLE FRENTE A LA ESCUELA ANDUJAR	457.10	1.00	2	535.70	2	914.2	1071.4
Total							2051.90	2227.80

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 8,042,304.97  
Monto desembolsado RD\$ 8,042,304.97 (100%)  
Avance de obra 104.14%



## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: LOS ALCARRIZOS

DISTRITO MUNICIPAL: PANTOJA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de enero de 2023


### INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,051.90 metros cuadrados de aceras y 2,227.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

#### NOTAS

1. Este distrito municipal esta construyendo por contrato.
2. Tanto la aceras como los contenes cumple con los parametros exigido por la LMD.
3. En este levantamiento estuvieron presente la asistente del alcalde y el Ing. Encargado de obras publicas.

#### IMÁGENES

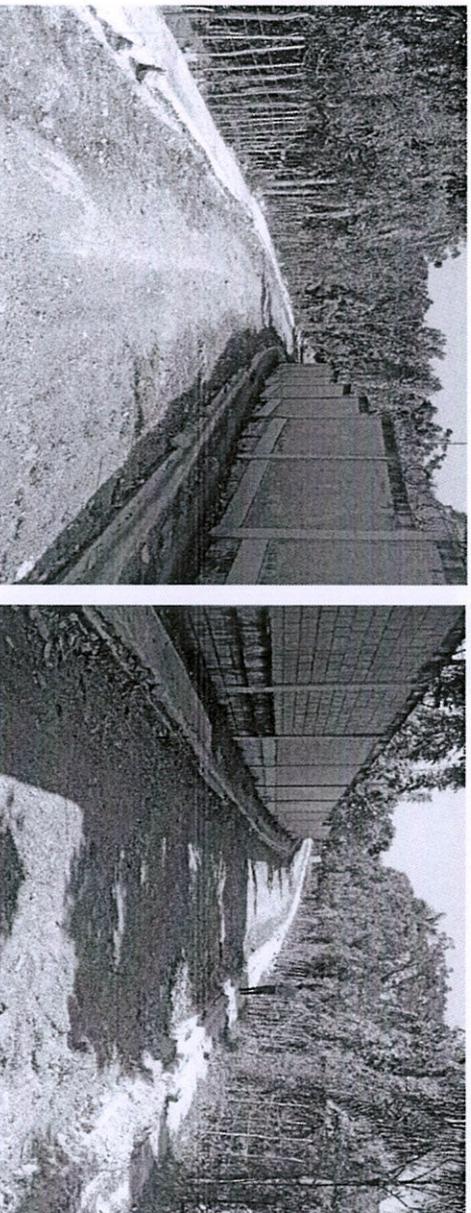



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RAMIREZ  
Técnico

  
ARQ. KEILIN MORA  
Técnico

