

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

Santo Domingo, D.N.
02 de octubre de 2023

Al:
Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:
Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho


Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución del D.M. La Guáyiga**

En la visita técnica realizada el 28 de junio del 2023 se validó la ejecución de 1,324.22 metros cuadrados de aceras y 1,816.00 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución 254.10 metros cuadrados de aceras y 296.30 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,578.32 metros cuadrados de acera y 2,112.3 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 91% de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 320702

REGIÓN: OZAMA

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: PEDRO BRAND

DISTRITO MUNICIPAL: LA GUÁYIGA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de junio de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. Elizabeth García


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE PRINCIPAL	117.20	0.80	2.00	117.20	2.00	187.52	234.40
TRAMO B	CALLE PRINCIPAL				14.20	1.00		14.20
TRAMO C	CALLE PRINCIPAL	47.30	0.80	2.00	47.30	2.00	75.68	94.60
TRAMO D	CALLE PRINCIPAL	8.80	1.00	1.00	8.80	1.00	8.80	8.80
TRAMO E	CALLE PRINCIPAL	57.60	0.75	1.00	57.60	2.00	43.20	115.20
TRAMO F	CALLE PRINCIPAL				5.30	2.00		10.60
TRAMO G	CALLE PRINCIPAL	11.40	1.05	1.00	16.80	1.00	11.97	16.80
TRAMO H	CALLE PRINCIPAL	24,4	0.75	1.00	37.80	2.00		75.60
TRAMO I	CALLE PRINCIPAL				24.30	1.00		24.30
TRAMO J	CALLE PRINCIPAL				9.30	1.00		9.30
TRAMO K	CALLE PRINCIPAL				9,3	1.00		
TRAMO L	CALLE PRINCIPAL LOS COQUITOS III	422.65	0.92	2.00	495.50	2.00	775.85	991.00
TRAMO M	LOS COQUITOS	110.60	1.00	2.00	110.60	2.00	221.20	221.20
TRAMO N								
Total							1,324.22	1,816.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,125,098.61

Monto desembolsado RD\$ 5,125,098.61 (100%)

Avance de obra 124.54%



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA
PROVINCIA: SANTO DOMINGO
MUNICIPIO: PEDRO BRAND
DISTRITO MUNICIPAL: LA GUÁYIGA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de junio de 2023


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,324.22 metros cuadrados de aceras y 1,816.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. En esta visita pudimos observar que las aceras y contenes a la fecha presentan buena terminación.
2. En uno de los tramos se presentó levas deterioros a causa de la construcción de una vivienda.

IMÁGENES

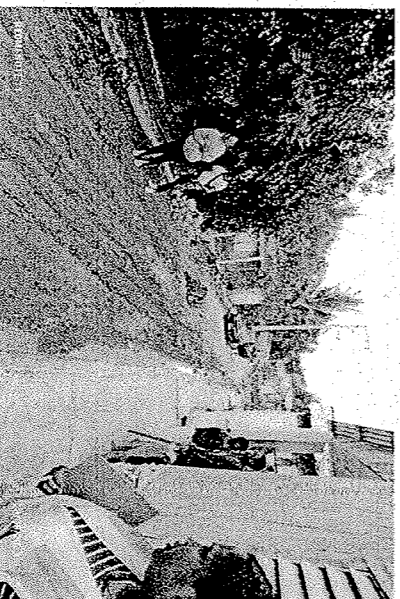




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

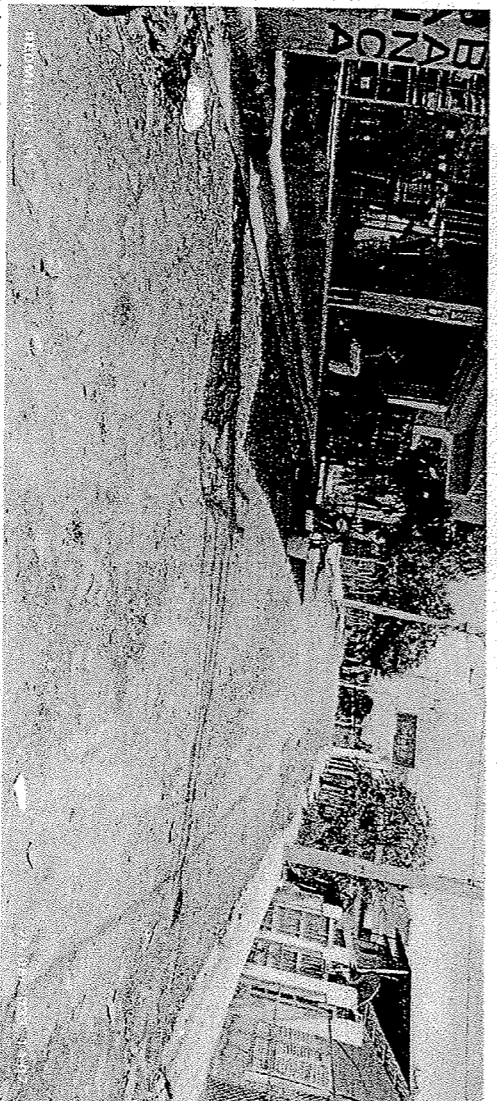

Suministra los datos de este reporte.


ING. AMA INDHIRA RAMIREZ
Técnico


ELIZABETH GARCÍA
Técnico

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

3ER COMPONENTE

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Santo Domingo
MUNICIPIO: Santo Domingo Oeste
DISTRITO MUNICIPAL: La Guayiga
BARRIO Y/O SECTOR: El Pedregal

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local
b. Contratista


Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Código 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

Razón Social OXALIS, SRL
RNC ó Cédula: 1-31-85956-9

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

Construcción de contenes y aceras nuevos



4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle B	18.597318	-70.031274	18.597250	-70.029688	246.70	1.03	296.30	254.10	296.30
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Totales

254.10 m2

296.30 m




Manuel A. Delgado L.
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se observa la construcción de contenes y aceras con las dimensiones normales, con buena Terminación.
El contratista debe corregir los contenes maltratados o destruidos durante el proceso.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.


Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,


NOMBRE COMPLETO: Manuel Delgado Duran

CÉDULA: 001-1812369-4

CODIA: 31150


FECHA DE LA VISITA TÉCNICA: 22/09/2023


Valida y aprueba los datos suministrados,




Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal




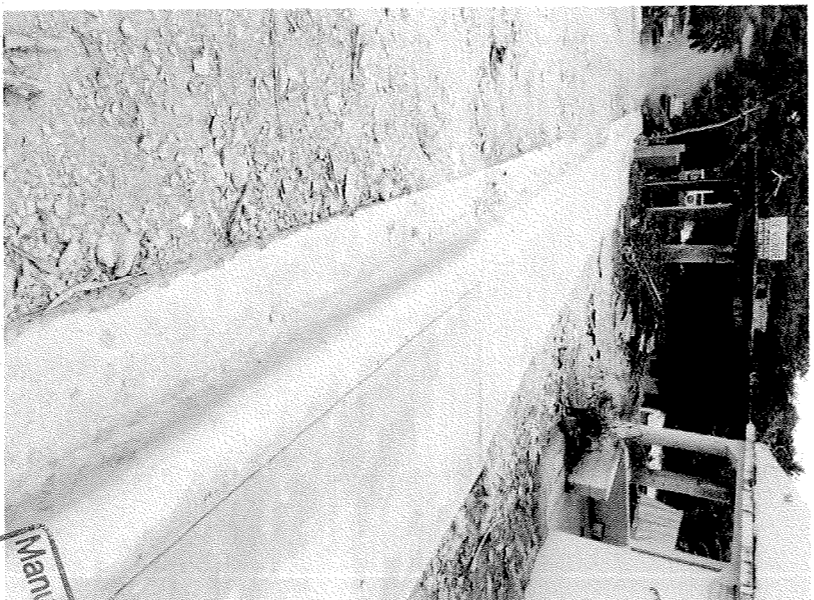

IMÁGENES

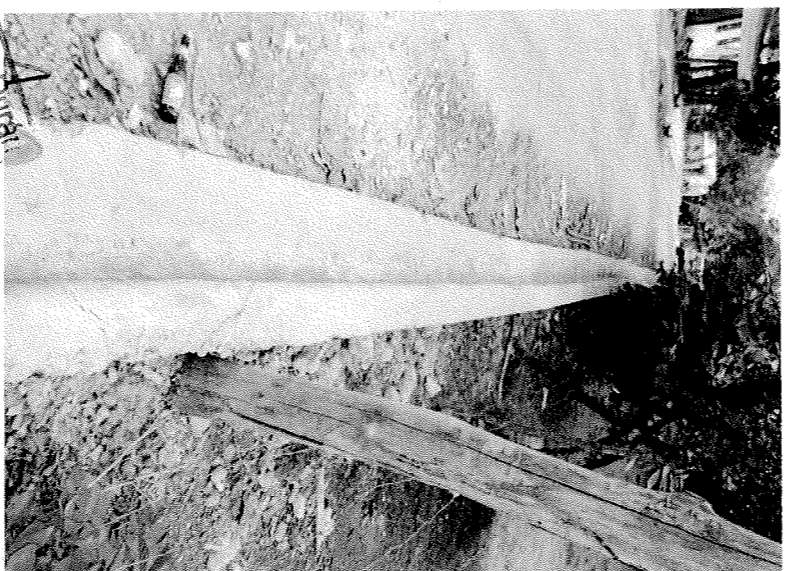


Manuel A. Delgado Duran
Ingeniero Civil
Santo Domingo

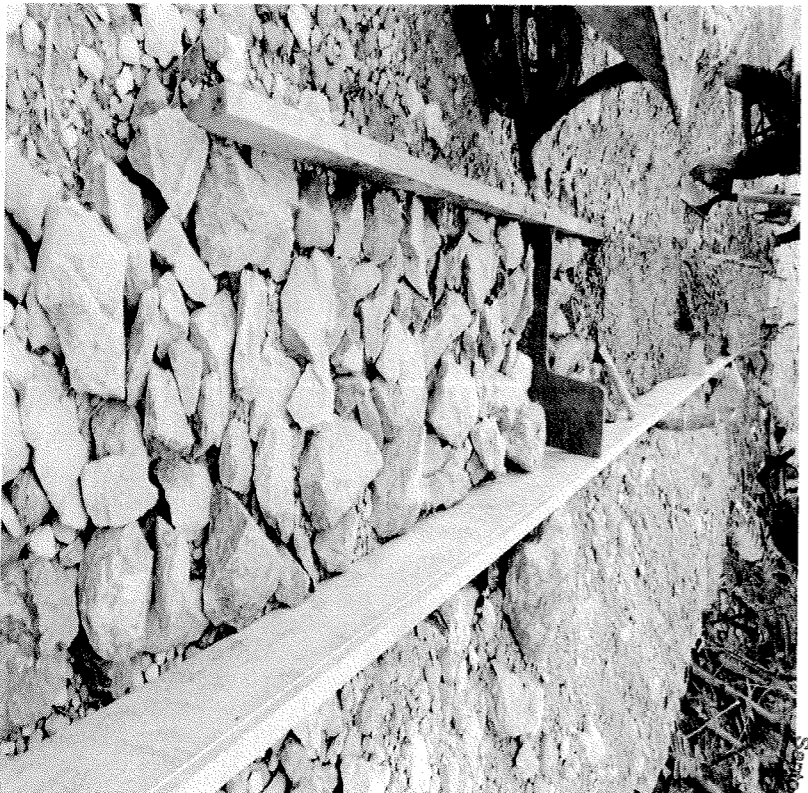

M.A. Delgado Lu
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. D.

Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.

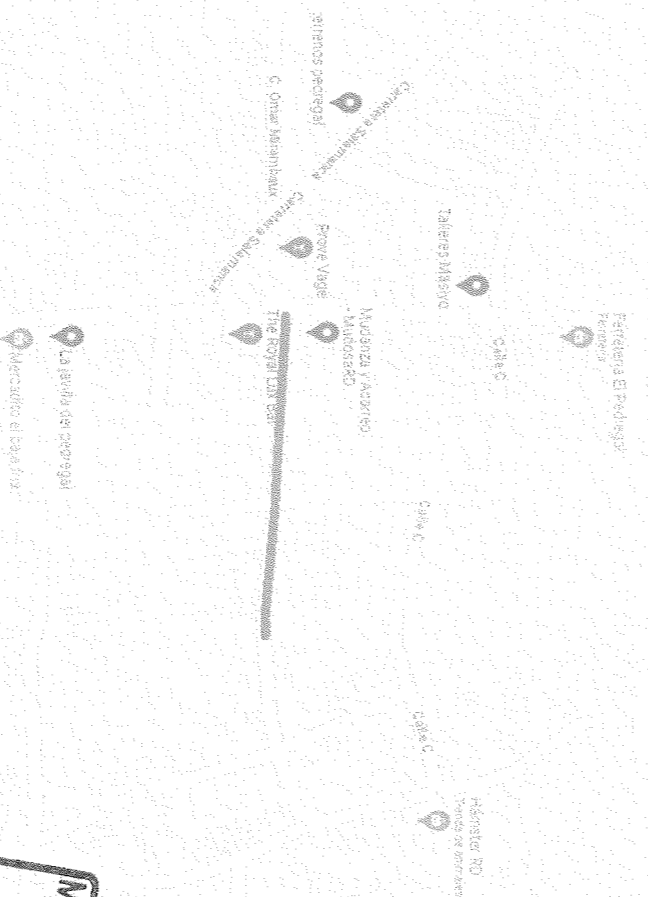

Manuel A. S400
 Ingeniero CIM
 Codigo 31150
 Santo Domingo, D.R.



En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes y aceras, trabajados por el contratista en cuestión, trabajando solo un lado de la calle.
