

Santo Domingo, D.N.
12 de octubre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de Avance de San Luis.**



En la visita técnica realizada el 28 de octubre de 2022 se validó la ejecución de 159.27 metros cuadrados de aceras y 5,065.30 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 168.03 metros cuadrados de aceras y 3,375.7 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 327.03 metros cuadrados de aceras y 8,441 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 89 % de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 320102

REGIÓN: OZAMA

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ESTE

DISTRITO MUNICIPAL: SAN LUIS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de octubre de 2022

1. Ing. Staylin Mendoza

TÉCNICOS: 2. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/RESP. JOSE FRANCISCO PE;A GOMEZ				305.50	1		305.5
TRAMO B	C/RESP. JOSE FRANCISCO PE;A GOMEZ	9.70	1.15	1	306.40	1	11.155	306.4
TRAMO C	C/3RA	86.20	1.05	1	86.20	1	90.51	86.2
TRAMO D	C/3RA	75.80	0.76	1	75.80	1	57.608	75.8
TRAMO E	C/LA TORRE				143.9	1		143.9
TRAMO F	C/LA TORRE				150.1	1		150.1
TRAMO G	C/ORIENTACION				283	1		283
TRAMO H	C/ORIENTACION				281.3	1		281.3
TRAMO I	EL NARANJO				181	2		362
TRAMO J	EL NARANJO				102.4	2		204.8
TRAMO K	C/PAZ Y BIEN				150.4	2		300.8
TRAMO L	C/RESP. 18				160.7	2		321.4
TRAMO M	C/RESP. ANACAONA				70.7	2		141.4
TRAMO N	C/MILEDY SANTOS				130.4	1		130.4
TRAMO O	C/MIGUELITO DE LOS SANTOS				124.3	2		248.6
TRAMO P	C/MILEDY SANTOS				153.4	1		153.4
TRAMO Q	C/CRISTO SALVADOR				238.5	2		477
TRAMO R	C/MARIA DE LOS SANTOS				49.5	2		99
TRAMO S	C/2DA				141.5	2		283
TRAMO T	C/4TA				24.4	2		48.8
TRAMO U	C/6TA				49.55	2		99.1
TRAMO V	C/8VA				116.95	2		233.9



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO W	C/RESP. ORIENTAL				87.75	2		175.5
TRAMO X	C/VIRGINIA FELIZ				77	2		154
Total							159.27	5065.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 8,781,204.77
Monto desembolsado RD\$ 8,781,204.78 (100%)
Avance de obra 151.40%





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de octubre de 2022

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ESTE

DISTRITO MUNICIPAL: SAN LUIS


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 159.27 metros cuadrados de aceras y 5,065.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Tantos los contenes como las aceras tienen muy buena terminación y están contruidos bajo los parán
2. No se presentan deficiencia en los niveles de los contenes.
3. Este proyecto fue ejecutado bajo contrato y en diferentes lotes por barrios.
4. En general esta bien ejecutada la construcción de las aceras y contenes.

IMÁGENES

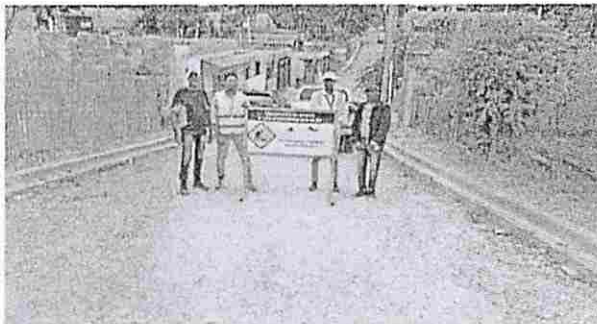





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

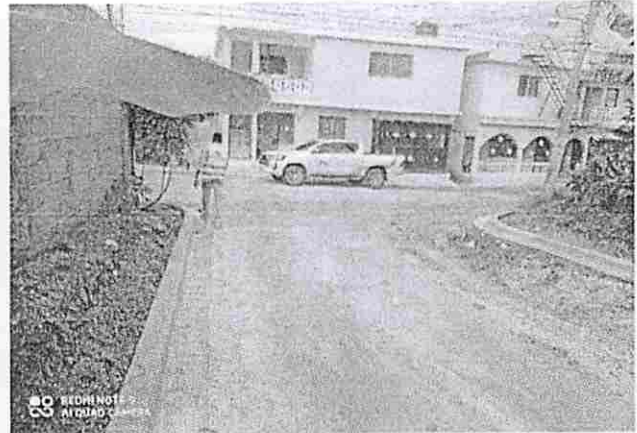

Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


ING. EDWARD ACOSTA
Técnico



PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

INFORME PRELIMINAR DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

3ER COMPONENTE

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Santo Domingo
MUNICIPIO: Santo Domingo Este
DISTRITO MUNICIPAL: San Luis
BARRIO Y/O SECTOR: San Isidro (Frente a la Fuerza Aerea)

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 21150
Santo Domingo Rep. Dom.

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☐
b. Contratista ☒

Razón Social: Instalaciones Batista Diaz y Asociados
RNC ó Cédula: 130-48804-5

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: ☒
b. Incluye demoliciones de tramos: ☐
c. Incluye badenes: ☐
d. Otros: Construcción de Acera nuevo

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	C. Los Rieles	18.530143	-69.759461	18.530298	-69.755258	-	-	845.20	-	845.20
Tramo B	C. Juan Burgos De La Cruz	18.527940	-69.758909	18.529176	-69.757622	-	-	502.00	-	502.00
Tramo C	Calle sin identificar	18.527983	-69.758868	18.527980	-69.758792	-	-	18.10	-	18.10
Tramo D	C. Luis Matos	18.527755	-69.758132	18.528720	-69.758184	66.90	0.58	197.00	38.80	197.00
Tramo E	Calle sin identificar	18.528269	-69.758132	18.528277	-69.757727	19.60	0.50	108.70	9.80	108.70
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Totales 48.60 m2 1,671.00m



CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

REVISADO
Auditoría Interna

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle sin identificar	18.534197	-69.801278	18.533772	-69.800527	-	-	239.90	-	239.90
Tramo B	Calle sin identificar	18.533088	-69.800443	18.534126	-69.800525	19.70	0.95	226.70	18.72	226.70
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Totales 18.72 m2 466.60 m



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Carretera Mella	18.526816	-69.768781	18.526782	-69.768224	56.90	1.77	-	100.71	-
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

Totales 100.71 m2 0.00 m

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle no identificada	18.543495	-69.803567	18.543473	-69.803894	-	-	59.30	-	59.30
Tramo B	Calle Lirio Del Valle	18.543470	-69.803824	18.538758	-69.804651	-	-	1058.00	-	1058.00
Tramo C	Calle 5ta	18.538718	-69.804998	18.538674	-69.804357	-	-	120.80	-	120.80
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

Totales - 1,238.10 m



REVISADO
Auditoría Interna



Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se superviso y cubico la construcción de contenes nuevos.
El constratista debe corregir al momento de confeccionar las aceras la reparación de los contenes rotos o maltratados.
Se sugiere la construcción de baden e imbornal para el tramo B de este informe.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR


Anexar imágenes de las obras.


Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:	Manuel Delgado Duran
CÉDULA:	001-1812369-4
CODIA:	31150
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:	12/09/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,


Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



4/9/24

IMÁGENES



Calle Lirio Del Valle



Calle 5ta



Calle 5ta



Calle 5ta



IMÁGENES




Carretera Mella



Carretera Mella



Carretera Mella

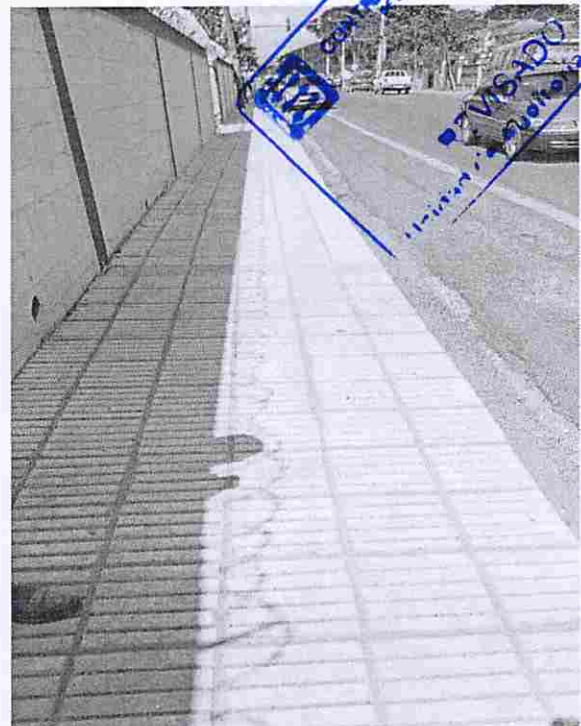

Carretera Mella

IMÁGENES



Calle no identificada




Calle no identificada



Calle Lirio Del Valle



Calle Lirio Del Valle




IMÁGENES



Calle no identificada 1



Calle no identificada 2

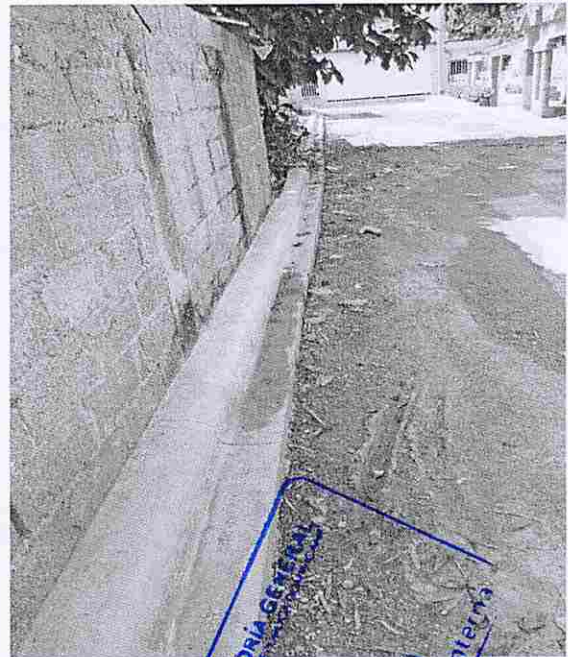

Calle no identificada 1




Calle no identificada 2

IMÁGENES



Calle no Identificada 2

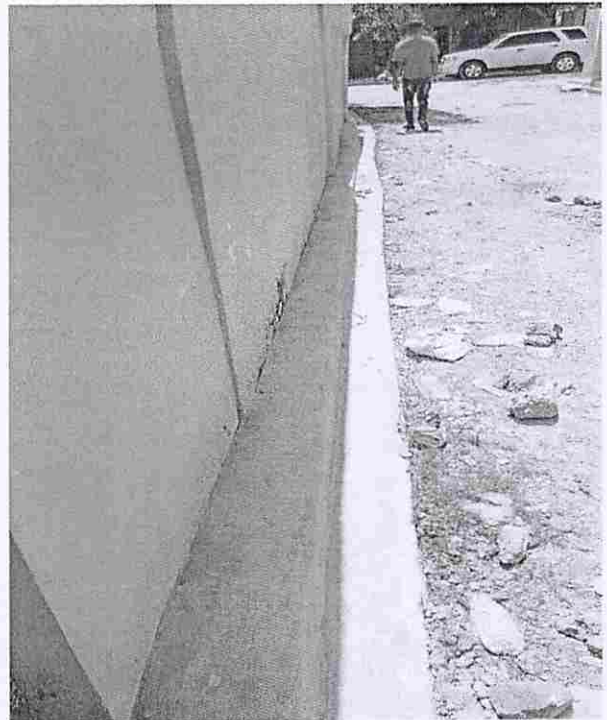

Calle no Identificada 2



IMÁGENES



Calle no Identificada 1



C. Luis Matos



Calle no Identificada 1



C. Luis Matos

IMÁGENES



Calle Los Rieles



Calle Los Rieles




C. Juan Burgos De La Cruz



C. Juan Burgos De La Cruz

Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.

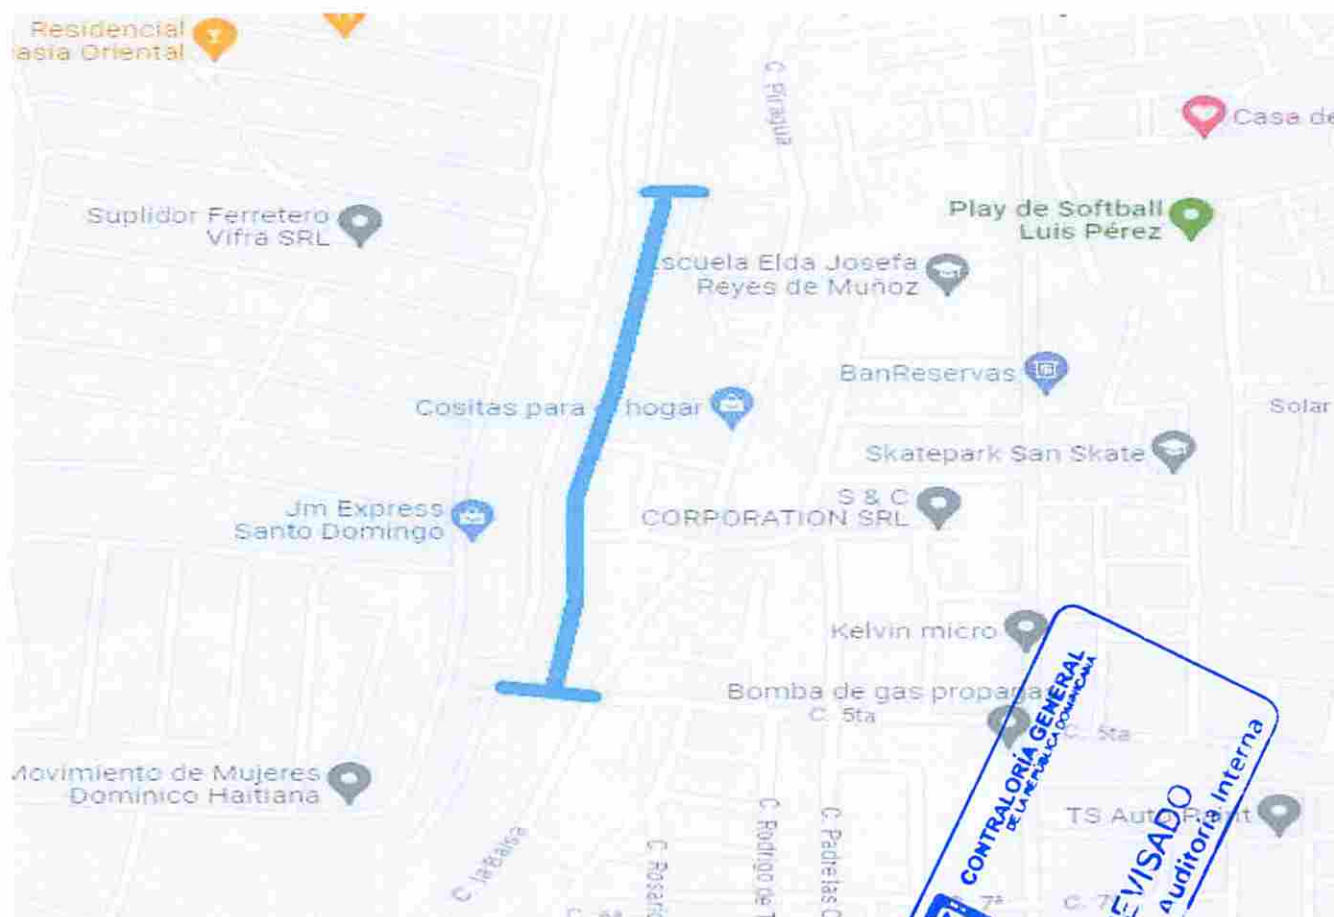


En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes, trabajados por el contratista en cuestión

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.





Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.

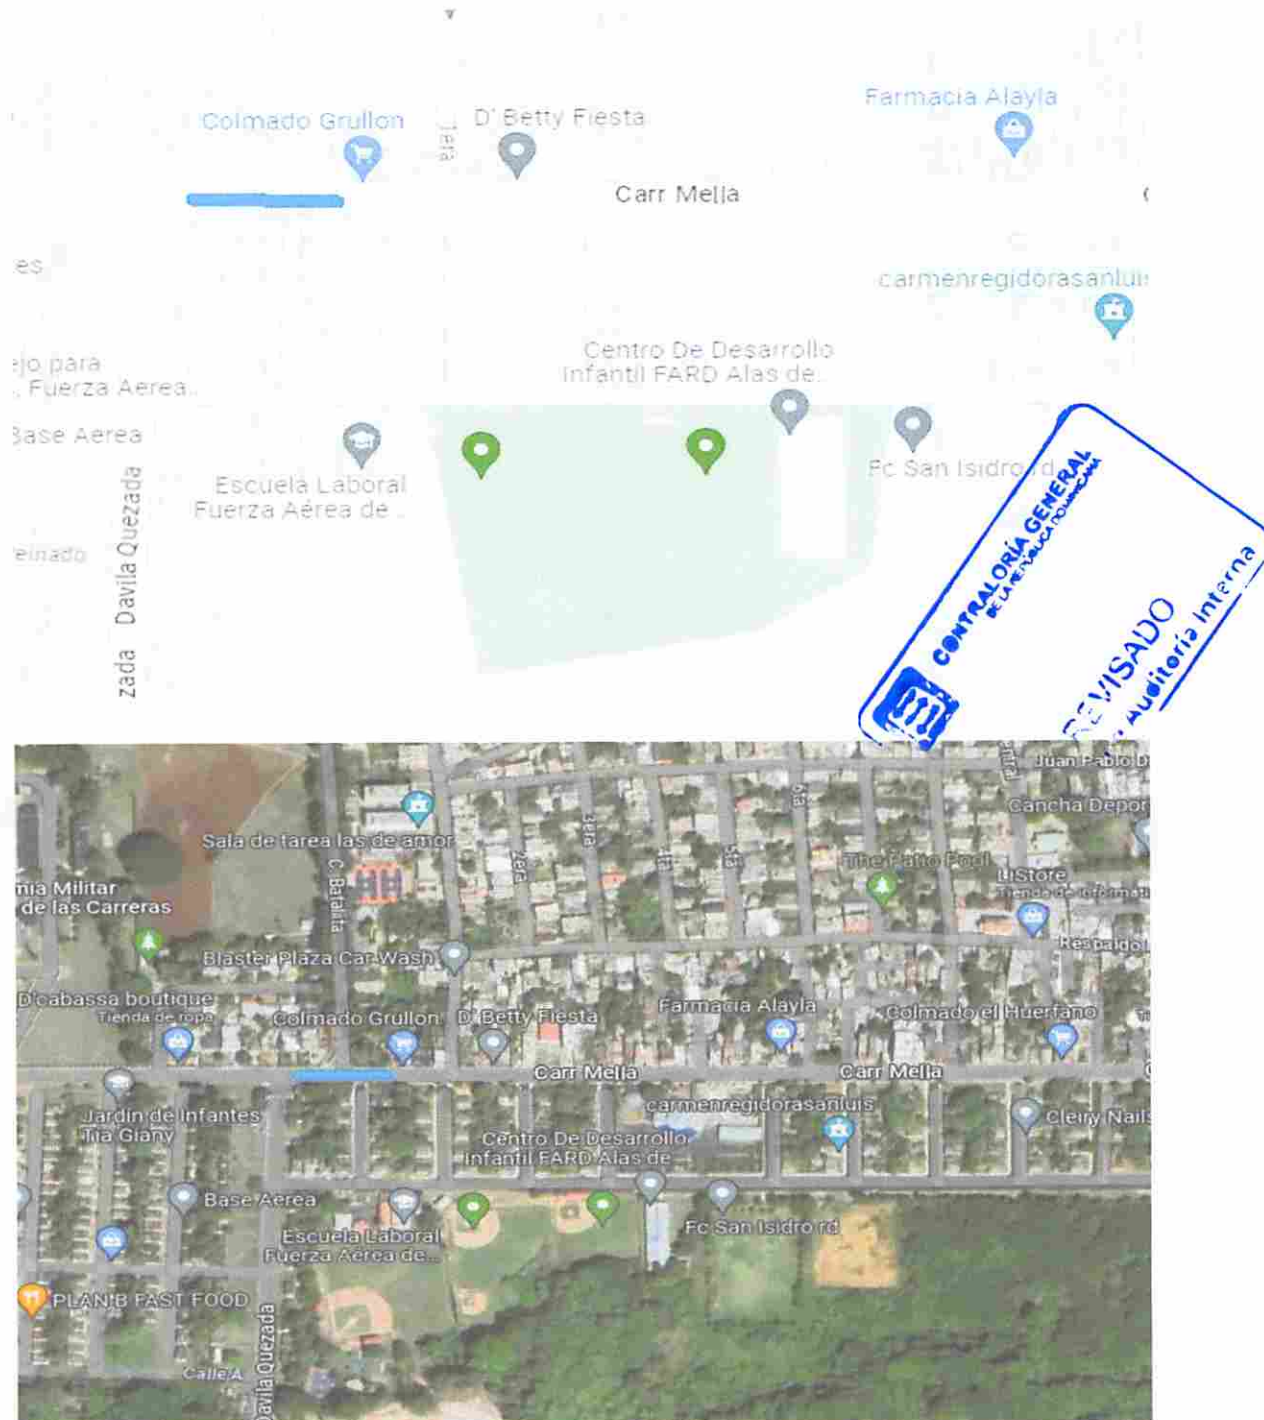

En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes, trabajados por el contratista en cuestión

Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.

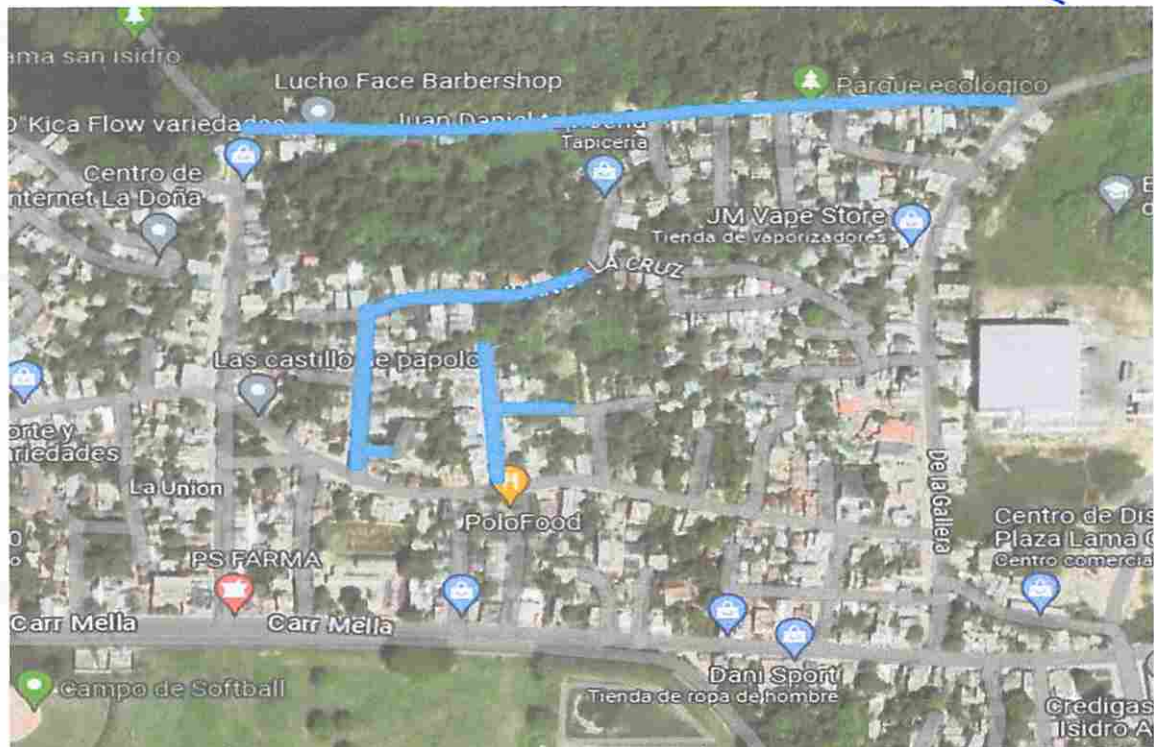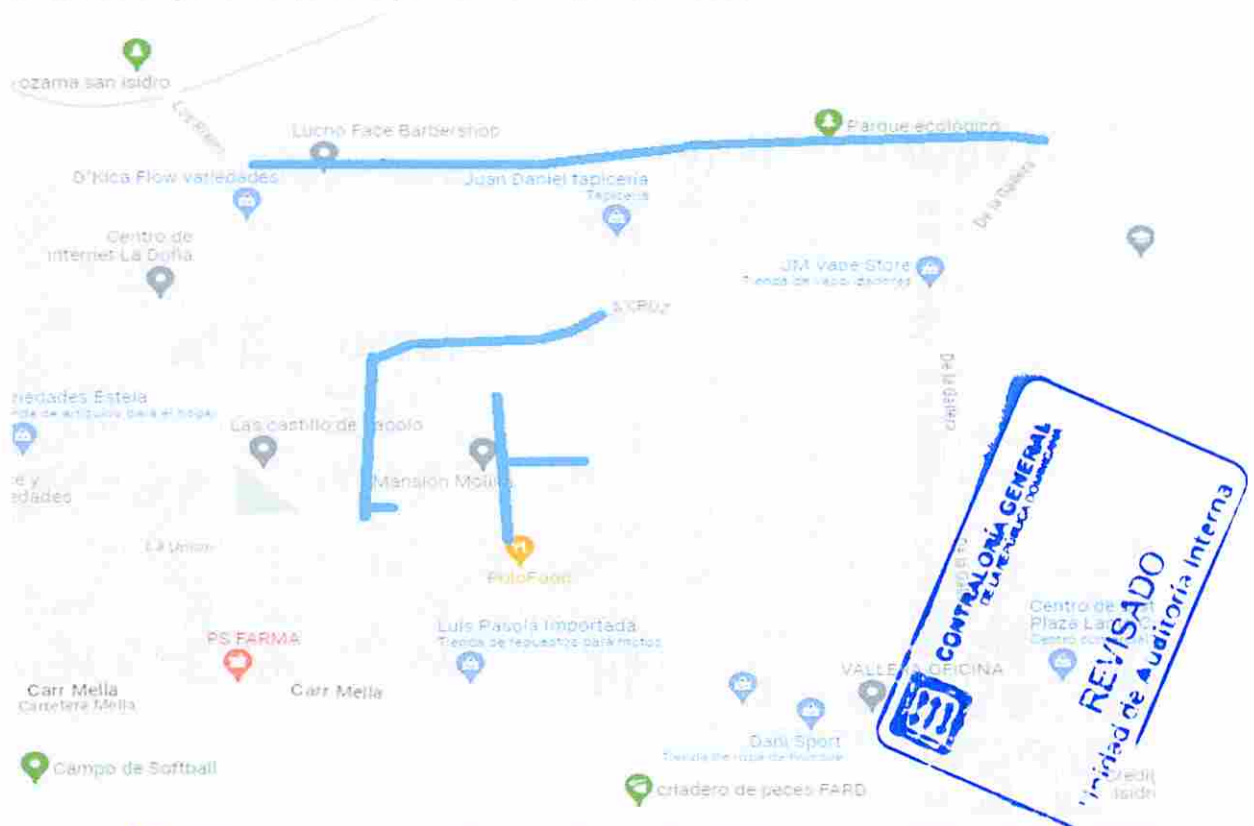

En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes, trabajados por el contratista en cuestión.
