

Santo Domingo, D.N.
15 de marzo de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución de Esperanza**




En la visita técnica realizada el 27 de septiembre del 2022 se validó la ejecución de 2,935.23 metros cuadrados de aceras y 3,052.42 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 1,805.00 metros cuadrados de aceras y 1,030.60 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Por lo que, mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 4,740.23 metros cuadrados de acera y 4,083.02 metros lineales de contenes, y se valida que se ha ejecutado el 100% en volumetría según la proyección estimada.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 270201

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: VALVERDE

MUNICIPIO: ESPERANZA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 27 de septiembre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	HERMANAS MIRABAL	87.20	1.30	2	87.60	2	226.72	175.2
TRAMO B	CALLE DEL PARQUE A-B	166.40	1.60	1	79.20	1	266.24	79.2
TRAMO C	JOSE NUÑEZ DE CACERES	177.55	1.70	2	177.55	2	603.67	355.1
TRAMO D	CALLE INTERIOR C	133.25	0.80	2	253.45	2	213.2	506.9
TRAMO E	NICOLAS DE OVANDO	200.00	1.00	1	231.5	2	200	463
TRAMO F	CARMEN TORRES	28.00	1.00	1			28	
TRAMO G	CALLE 10				484.36	2		968.72
TRAMO H	CALLE 5				203.15	2		406.3
TRAMO I	JUAN BOSCH	403.00	1.60	2			1289.6	
TRAMO J	CALLE H	107.80	1.00	1	98	1	107.8	98
TRAMO K								
Total							2935.23	3052.42




AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 7,351,992.73

Monto desembolsado RD\$ 7,351,992.74 (100%)

Avance de obra 154.19%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 27 de septiembre de 2022

PROVINCIA: VALVERDE

MUNICIPIO: ESPERANZA

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,935.23 metros cuadrados de aceras y 3,052.42 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. La obra se ejecuto vía contrato.
2. El proyecto cumple con los estándares de calidad recomendados por el programa.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

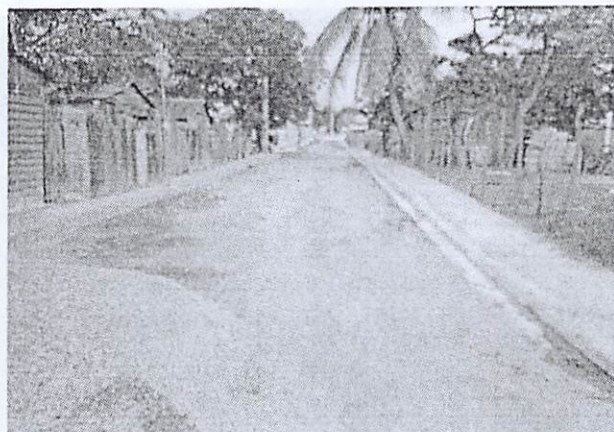

Suministra los datos de este reporte,

Ing. Ana Román
ING. ANA INDIRA RÁMIREZ
Técnico

Juan P. Mercado
ING. DANILO MERCADO
Técnico





3er componente

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: Valverde
MUNICIPIO: Esperanza
DISTRITO MUNICIPAL: N/A.
BARRIO Y/O SECTOR:

Barrio Los Palitos.
calle Primera, (caño).
Paseo industrial de Esperanza



2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☒
b. Contratista ☐

Razón Social: Ayuntamiento Municipal de Esperanza
RNC ó Cédula: 4-0900023-9



3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)


- a. Reparación de aceras y contenes: ☐
b. Incluye demoliciones de tramos: ☐
c. Incluye badenes: ☐
d. Otros:

Construcción de Aceras y contenes.

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Barrio Los Palitos calle #6	19.5960	-70.9831	19.5972	-70.9832	N/A	N/A	221.00	N/A	221.00
Tramo B	Barrio Los Palitos calle #8	19.5967	-70.9833	19.5971	-70.9826	N/A	N/A	276.00	N/A	276.00
Tramo C	Barrio Los Palitos calle #7	19.5969	-70.9830	19.5961	-70.9821	N/A	N/A	213.00	N/A	213.00
Tramo D	Barrio Los Palitos calle #3	19.5960	-70.9826	19.5969	-70.9830	N/A	N/A	195	N/A	195.00
Tramo E	(campo). calle Primera	19.5642	-70.9813	19.5647	-70.9814	125.6	1.50	125.6	281.00	125.6
Tramo F	Av. Maria Trinidad Sanchez (Paseo Industrial Esperanza)	19.5963	-70.9805			240.14	6.35	N/A	1524.00	N/A
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										


CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
28 ABR 2023
 REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.



Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Anthony Isidro Almonte Lopez

CÉDULA:

094-0023263-4

CODIA:

43217

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

1 de Marzo del 2023.

Valida y aprueba los datos suministrados,


A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. J. J.", written over a horizontal line.

Firma y sello

Junta Distrital o Alcaldía Municipal



Barrio Los Palitos

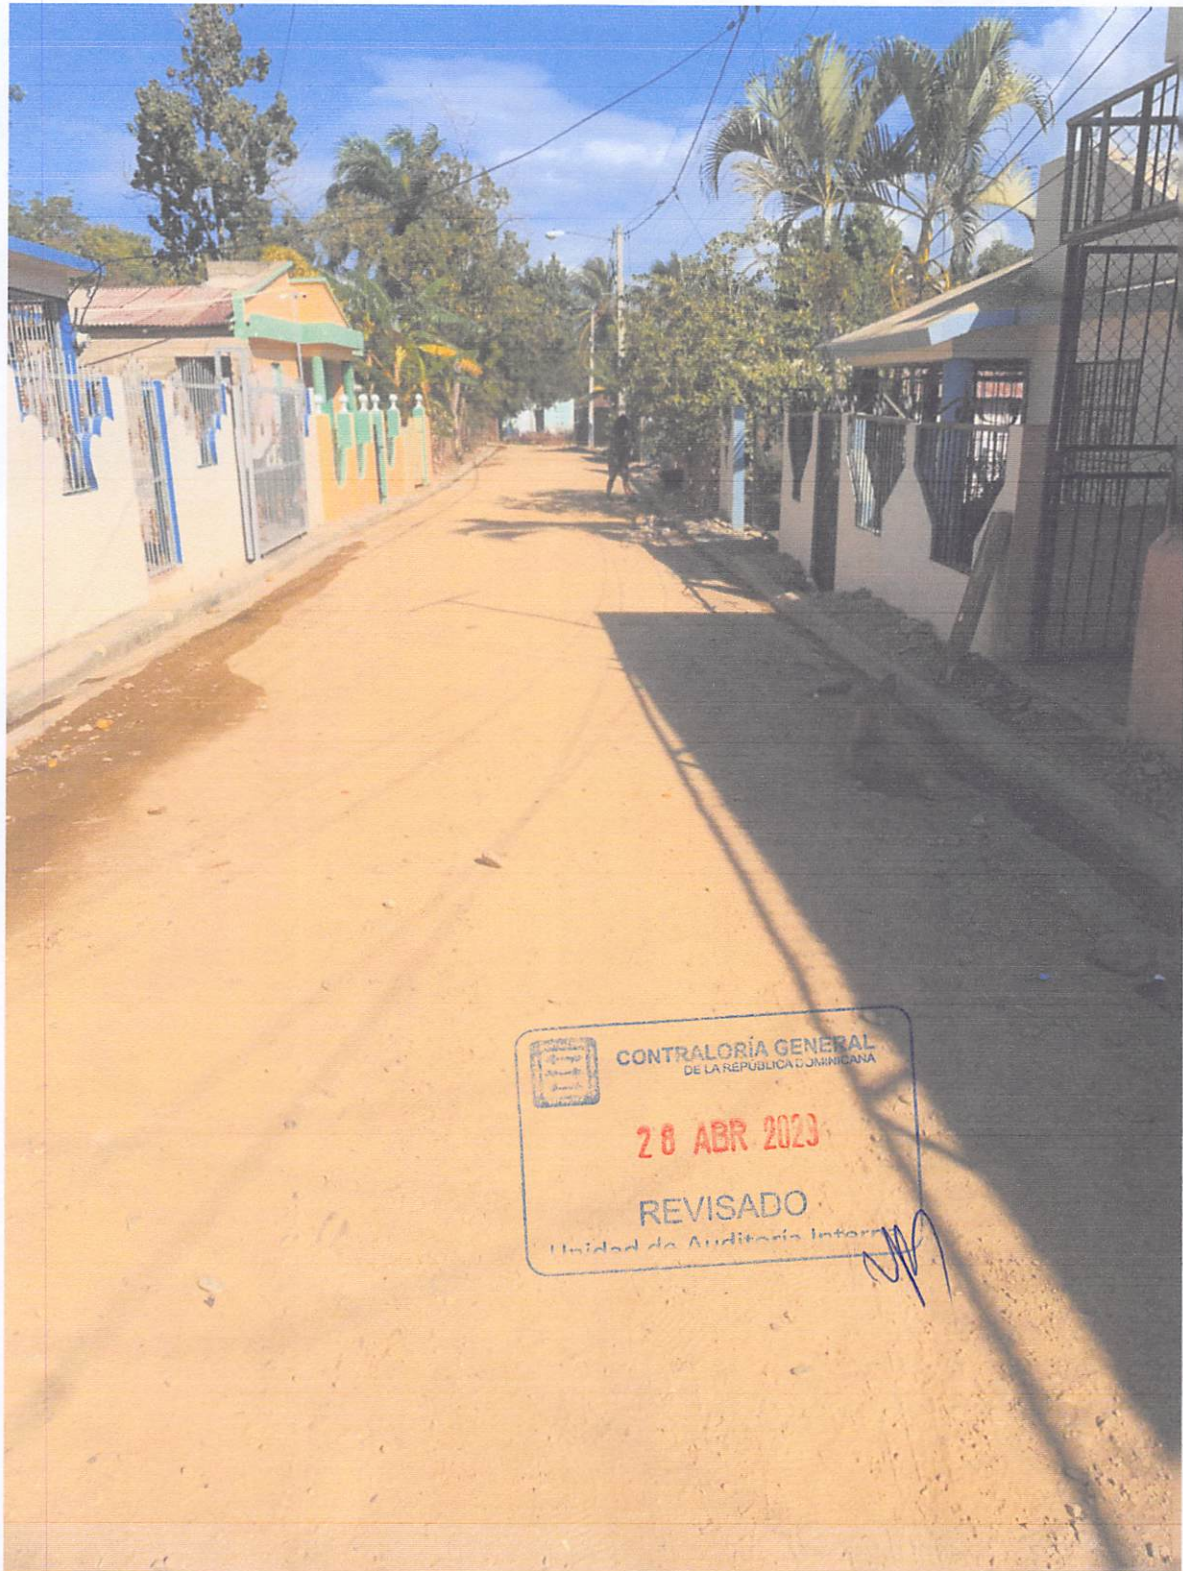

Barrio Los Palitos



Barrio Los Palitos

