


Santo Domingo, D.N.
15 de marzo de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución de Peralvillo**




En la visita técnica realizada el 4 de noviembre del 2022 se validó la ejecución de 1,853.17 metros cuadrados de aceras y 1473.80 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 1,383.28 metros cuadrados de aceras y 1,323.20 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.


Por lo que, mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 3,236.45 metros cuadrados de acera y 2,797.00 metros lineales de contenes, y se valida que se ha ejecutado el 100% en volumetría según la proyección estimada.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 290501

REGIÓN: HIGUAMO

PROVINCIA: MONTE PLATA

MUNICIPIO: PERALVILLO

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de noviembre de 2022

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	FRENTE FERRECENTRO ALEXANDER	180.10	1.50	2	179.90	2	540.3	359.8
TRAMO B	SUNSO DIONICIO FRENTE A MATEA	98.70	0.61	2	98.70	2	120.414	197.4
TRAMO C	COMPRAVENTA JORGE DIONICIO	149.70	1.30	2	165.30	2	389.22	330.6
TRAMO D	FRANCISCO SANCHEZ	172.40	1.70	2	172.40	2	586.16	344.8
TRAMO E	ALREDEDOR DE LA IGLESIA CATÓLICA	120.60	0.90	2	120.6	2	217.08	241.2
Total							1853.17	1473.80


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,873,267.50

Monto desembolsado RD\$ 2,436,633.75 (50%)

Avance de obra 127.45%





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO
PROVINCIA: MONTE PLATA
MUNICIPIO: PERALVILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de noviembre de 2022

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,853.17 metros cuadrados de aceras y 1,473.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. La obra se ejecuto por contrato y todos los trabajos fueron supervisados bajo la supervicion de la alcaldía.
2. El proyecto cumple con los estandares de calidad recomendados.
3. Observamos algunas secciones de tramos destruidos producto por camiones pesados, se nos informo que dichos tramos seran reparados.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILO MERCADO
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico





3^{er} Componente

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA:

MUNICIPIO:

DISTRITO MUNICIPAL:

BARRIO Y/O SECTOR:

Monte Platan

Peralvillo

Las Guaymas de Peralvillo



2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

☐

b. Contratista

☒

Razón Social

RNC ó Cédula:

Melvin A. Garcia meo
001-0886300-2

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: ☒

b. Incluye demoliciones de tramos: ☐

c. Incluye badenes: ☒

d. Otros:

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	C. Mateo Pico	18.871223	-70.005817	18.871497	-70.005685	39.00	0.75	39.00	29.25	39.00
Tramo B	C. Los Tumbos	18.871406	-70.005361	18.870904	-70.005058	100.70	1.00	107.40	100.70	107.40
Tramo C	C. Requén	18.871335	-70.005175	18.871456	-70.004948	54.80	1.08	54.80	59.18	54.80
Tramo D	C. Requén	18.871505	-70.005468	18.871734	-70.005792	45.00	2.00	45.00	90.00	45.00
Tramo E	C. Los Bratos	18.871578	-70.005725	18.871619	-70.007071	582.50	1.05	582.50	611.63	582.50
Tramo F	C. Barrio Los Camacho	18.871770	-70.005796	18.871979	-70.005483	66.00	0.95	73.00	62.70	73.00
Tramo G	C. Barrio Los Camacho	18.871918	-70.005437	18.871629	-70.004652	85.30	1.00	85.30	85.30	85.30
Tramo H	C. Barrio Los Camacho	18.871629	-70.004652	18.872441	-70.006215	215.90	1.15	215.90	248.29	215.90
Tramo I	C. Barrio Los Camacho	18.872441	-70.006215	18.871971	-70.005494	120.30	0.80	120.30	96.24	120.30
Tramo J		/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tramo K		/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tramo L		/	/	/	/	/	/	/	/	/



Total 1383.28 1323.20

[Handwritten Signature]

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										


CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
28 ABR 2023
REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Corregir Contén trans E (sección).
(Puntos de terminación estropeados)

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.



Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Manuel Alejandro Delgado Durán

CÉDULA:

004812369-4

CODIA:

31150

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

03/03/2023


Valida y aprueba los datos suministrados,


D/o [Firma]

Firma y sello

Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



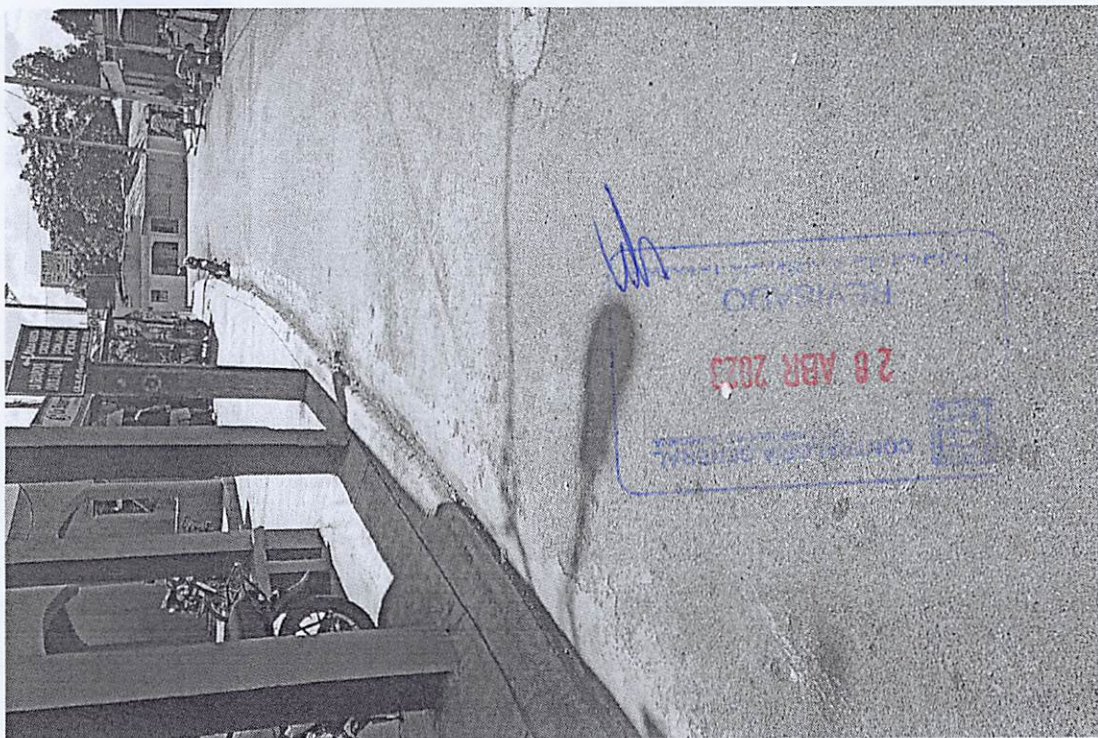

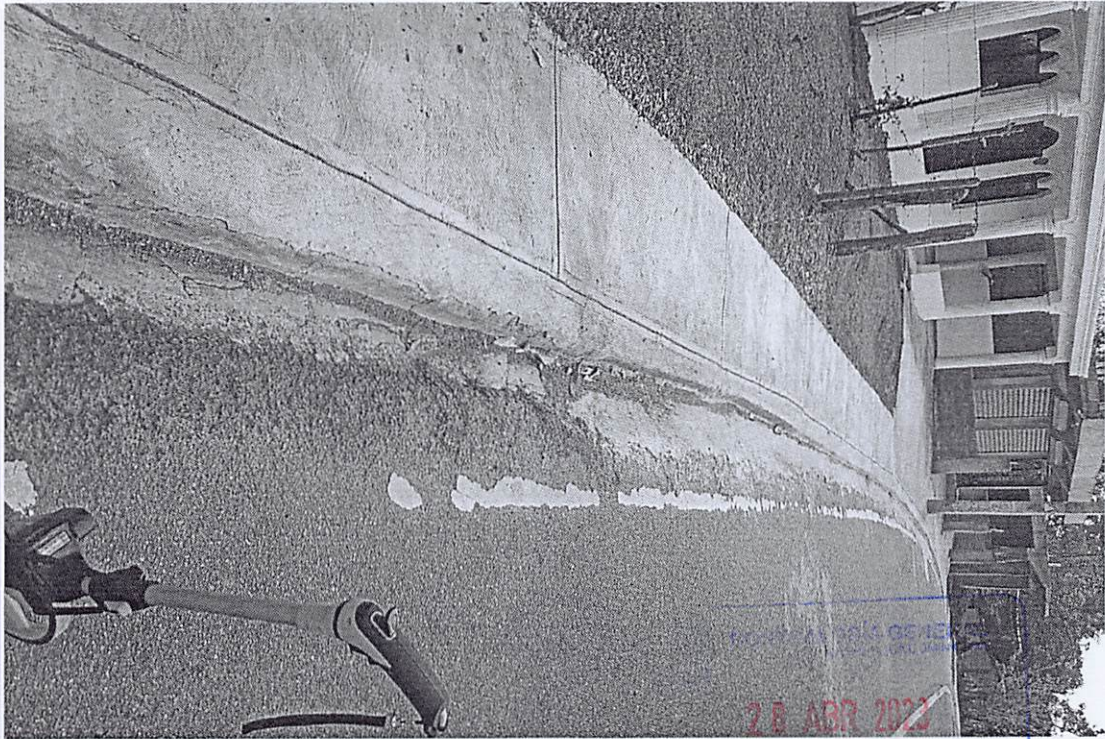

KONTAS DEL GENDERO

28 ABR 2022

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna



