

Santo Domingo, D.N.
19 de diciembre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho


Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución de Villa Hermosa.**

En la visita técnica realizada el 01 de noviembre de 2022 se validó la ejecución de 3,653.23 metros cuadrados de aceras y 3,580.10 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 1,735.6 metros cuadrados de aceras y 1,980.3 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia que se ha ejecutado 5,388.83 metros cuadrados de aceras y 5,560.4 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022

PROVINCIA: LA ROMANA

MUNICIPIO: VILLA HERMOSA

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 3,653.23 metros cuadrados de aceras y 3,580.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Pudimos observar en la visita que la calidad y terminación de las aceras y contenes con una buena calidad
2. Han ejecutado tanto las aceras y contenes con los parámetros recomendados.
3. Este municipio ejecuto por administración.
4. El alcalde nos expresa que fuero intervenido 5 sectores de los cuales solo visitamos 3, por lo tanto quedan al pendiente dos sectores..

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico


ING. FÉLIX TAVÁREZ

Técnico



PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: LA ROMANA

MUNICIPIO:

DISTRITO MUNICIPAL: VILLA HERMOSA

BARRIO Y/O SECTOR:

VILLA PROGRESO,PIEDRA LINDA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social: AYUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA

RNC ó Cédula: N/D.

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: X
- b. Incluye demoliciones de tramos: X
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias. Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	C/S/N	18.446133	-69.020142	18.44257	-69.020560	53.00	1.00	76.8	53.00	76.8
Tramo B	S/N	18.446285	-69.024112	18.446288	-69.023423	247.00	0.5	247.00	123.50	247.00
Tramo C	S/N	18.446288	-69.023423	18.446698	-69.020959	282.00	0.75	282.00	211.50	282.00
Tramo D	S/N	18.446698	-69.020959	18.446283	-69.020787	132.00	0.80	132.00	105.60	132.00
Tramo E	La Trinitaria	18.444424	-69.012035	18.444182	-69.008966	646.00	1.00	646.00	646.00	646.00
Tramo F	Calles 4 ^{ta}	18.443025	-69.011949	18.442831	-69.0109151	596.50	1.00	596.50	596.50	596.50
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

$$\Sigma = 1,735.6 \quad \Sigma = 1,980.3$$

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

César E. Hernández

CÉDULA:

001-1022049-5

CODIA:

21125


FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

12/12/2023


Valida y aprueba los datos suministrados,

ZAN
Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



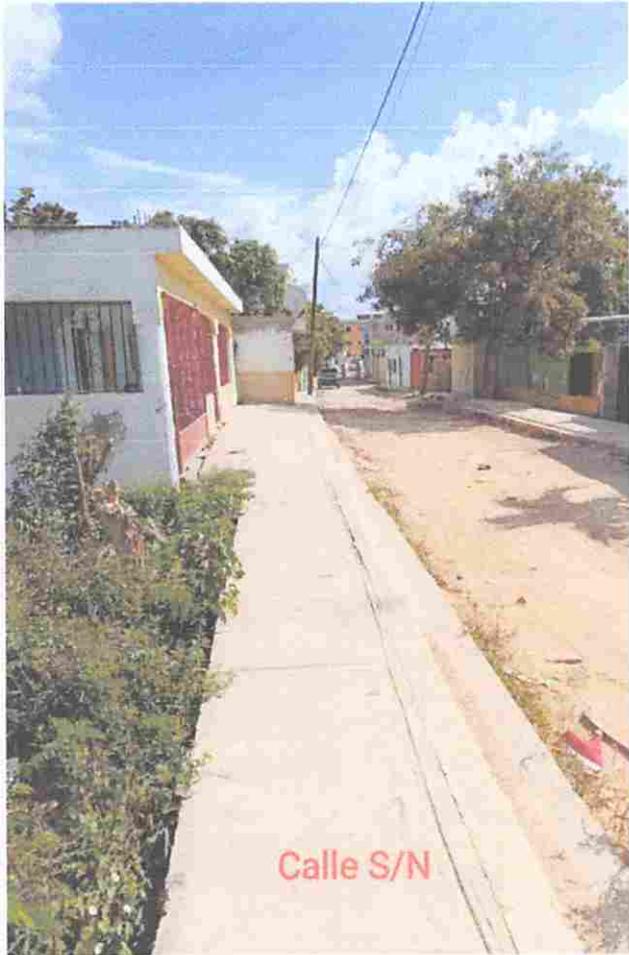

Calle S/N

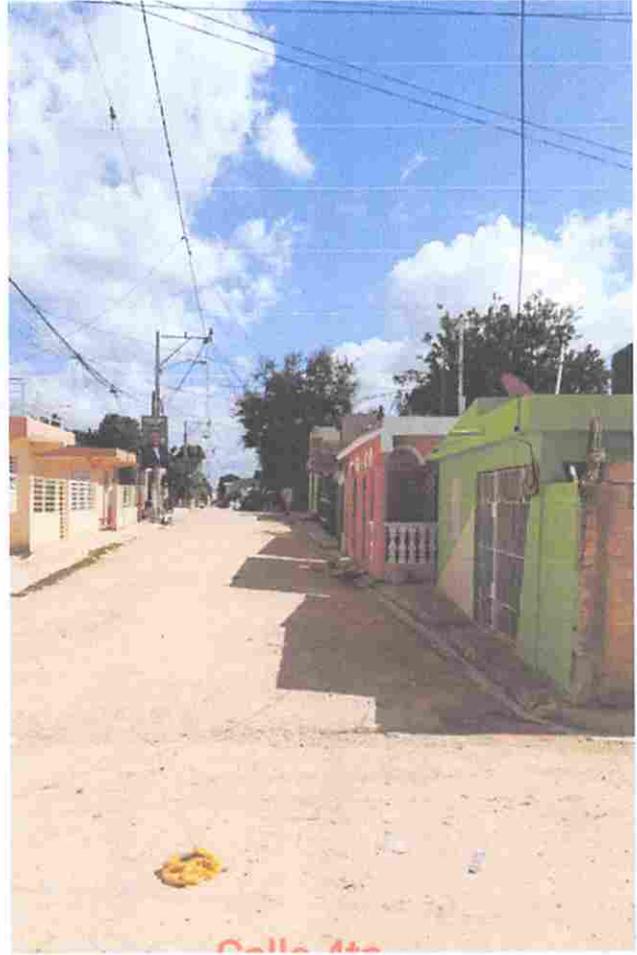


Calle 4ta




Calle S/N




Calle Los Trinitarios

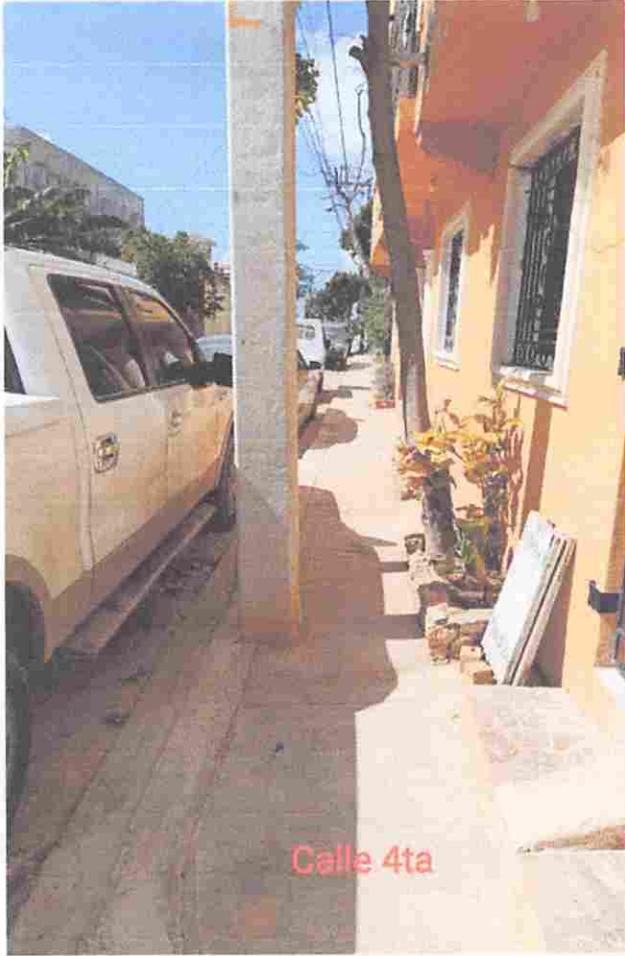

Calle 4ta

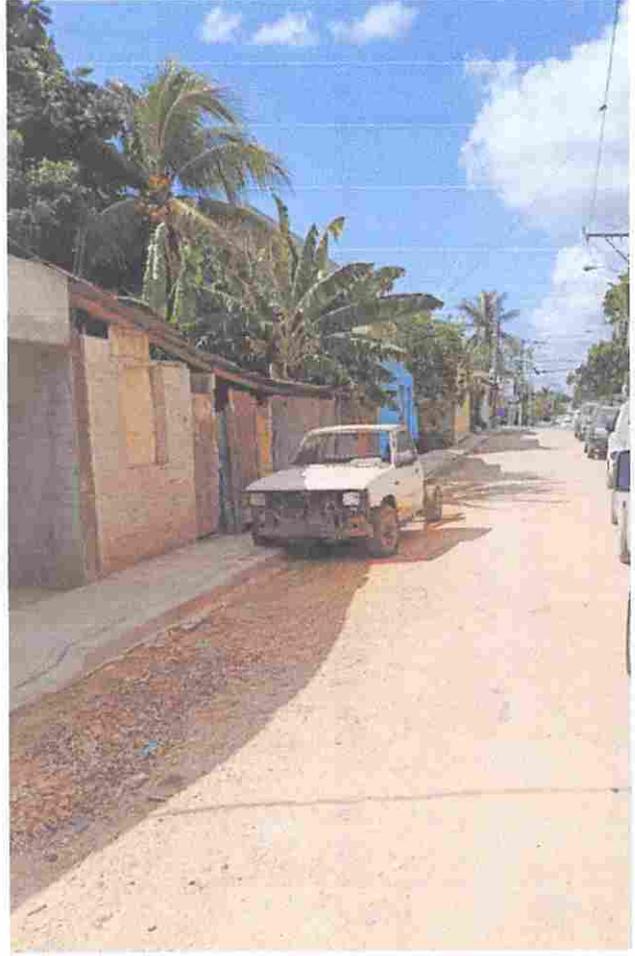

Calle S/N

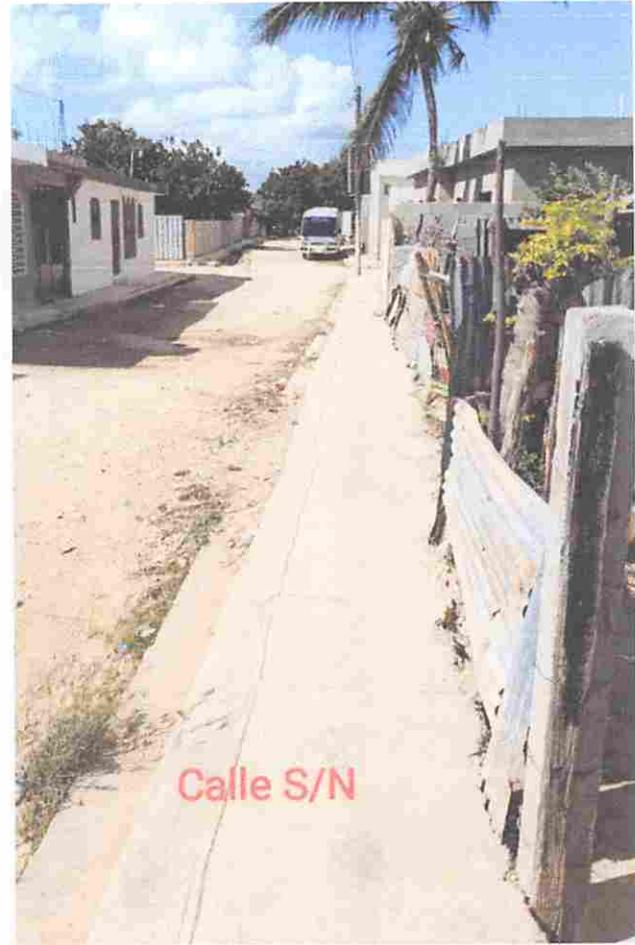

Calle S/N
