


Santo Domingo, D.N.
16 de octubre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho




Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución de Nizao.**

En la visita técnica realizada el 02 de julio de 2023 se validó la ejecución de 272.44 metros cuadrados de aceras y 2,956.40 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.


La supervisión externa ha validado la ejecución de 539.88 metros cuadrados de aceras y 21.55 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 812.32 metros cuadrados de aceras y 2,977.95 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 170201
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: PERAVIA
MUNICIPIO: NIZAO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de junio de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Danilo Mercado
2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	ESQ. CALLE MELLA DE LOS BOMBERO	10.30	0.83	1.00	93.10	2.00	8.55	186.20
TRAMO B	ZONA COLEGIO SALVADOR				74.80	2.00		149.60
TRAMO C	ZONA COLEGIO SALVADOR				41.20	2.00		82.40
TRAMO D	ZONA DE CARLITO				104.70	2.00		209.40
TRAMO E	ZONA DE CARLITO				20.00	2.00		40.00
TRAMO F	ZONA LA POLLERA				112.30	2.00		224.60
TRAMO G	ZONA LA POLLERA				89.90	2.00		179.80
TRAMO H	ZONA LA POLLERA				60.10	2.00		120.20
TRAMO I	ZONA PROFESOR JUAN				101.60	2.00		203.20
TRAMO J	ZONA PROFESOR JUAN				120.20	2.00		240.40
TRAMO K	C/ 1 ERA(SANTO MP)				119.40	2.00		238.80
TRAMO L	RESP. MELLA				113.20	2.00		226.40
TRAMO M	SECTOR LA MINA				171.20	2.00		342.40
TRAMO N	SECTOR PICUA				106.50	2.00		213.00
TRAMO O	LAS TRES VIAS	135.00	1.09	1.00			146.61	
TRAMO P	LAS TRES VIAS	29.60	0.86	1.00			25.46	
TRAMO Q	LAS TRES VIAS	14.10	0.44	1.00			6.13	
TRAMO R	LAS TRES VIAS	90.20	0.95	1.00			85.69	
TRAMO S	ZAPOTAL				150.00	2.00		300.00
Total							272.44	2,956.40

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,042,506.82
Monto desembolsado RD\$ 2,021,253.42 (50%)
Avance de obra 196.87%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: PERAVIA
MUNICIPIO: NIZAO
DISTRITO MUNICIPAL: -


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de junio de 2023

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 272.44 metros cuadrados de aceras y 2,956.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.


NOTAS

1. Este distrito ejecutó por administración.
2. Esta obra cumple con los estándares de calidad recomendado por el programa.

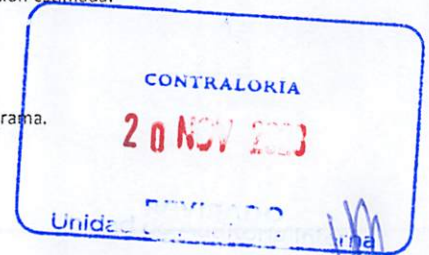

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—







LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—



Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILO MERCADO
Técnico


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

3ER COMPONENTE

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO ✓

PROVINCIA:

PERAVIA

MUNICIPIO:

Bani


DISTRITO MUNICIPAL:

(NIZAO)

BARRIO Y/O SECTOR:

sector mazo mazo

- ubicado por el multiso



2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local



b. Contratista



Razón Social

RNC ó Cédula:

Evaristo Valez Paulino
084-0003725-8

(maestro constructor)

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: ☐

b. Incluye demoliciones de tramos: ☐

c. Incluye badenes: ☐


d. Otros:

- Construcción de Acera

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ✓


Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A		18.2495	-70.2114	18.24932	-70.21164	32.00	0.95		30.40	
Tramo B		18.2493	-70.21166	18.24924	-70.21175	14.90	1.00		14.90	
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										




- total de mts² Acera → (45.30) mts²

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	C/Resguardo Melga	18.24221	-70.19694	18.24216	-70.19671	25.80	1.30		33.54	
Tramo B	U	18.24216	-70.19671	18.24212	-70.19652	22.50	0.90		20.25	
Tramo C	V	18.24212	-70.19652	18.24216	-70.19636	11.80	0.55		6.49	
Tramo D	V	18.24208	-70.19636	18.2421	-70.19643	(Backu) 8.10	0.75		(Backu) 6.075	
Tramo E	U	18.24208	-70.19634	18.242	-70.1962	16.00	0.65		10.40	
Tramo F	V	18.24197	-70.19623	18.24209	-70.19661	42.50	0.60		25.50	
Tramo G		18.24211	-70.19674	18.24213	-70.19693	22.00	0.70		15.40	
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

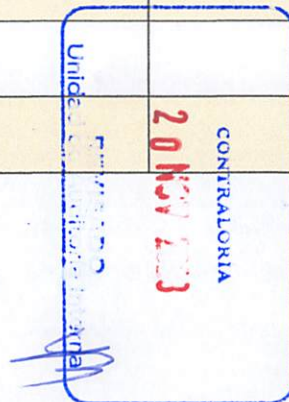

- total mts² Acera → (111.58) mts²
 - total mts² Contenes → (6.075) mts²

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	No Asignada	18.2499	-70.20636	18.2491	-70.20606			32.60		32.60
Tramo B	11	18.2491	-70.20606	18.24908	-70.20595	11.90	1.30	11.90	15.47	11.90
Tramo C	11	18.24908	-70.20595	18.24899	-70.20572			30.40		30.40
Tramo D	11	18.249	-70.20567	18.24903	-70.20548			20.40		20.40
Tramo E	11	18.24903	-70.20545	18.24858	-70.20512			82.50		82.50
Tramo F	11	18.24907	-70.20515	18.24916	-70.20473			46.00		46.00
Tramo G	11	18.24916	-70.20465	18.2492	-70.20411			63.00		63.00
Tramo H	11	18.24927	-70.20409	18.24932	-70.20391			20.60		20.60
Tramo I	11	18.24934	-70.20382	18.2494	-70.2036			24.00		24.00
Tramo J	11	18.24931	-70.20414	18.24933	-70.20424			24.00		24.00
Tramo K	11	18.24922	-70.20463	18.24938	-70.20468			17.70		17.70
Tramo L	11	18.24928	-70.20468	18.24941	-70.20473			10.00		10.00



- total mL Contenes $\rightarrow (383.00 \text{ mL})$
 - total mts² Acera $\rightarrow (15.47) \text{ mts}^2$

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se terminacion Esta Rustica por condiciones de la lluvia en momento del vaciado

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,



NOMBRE COMPLETO:

José Yoaí Mercedes Urbaz

FIRMA:

José Yoaí Mercedes

CÉDULA:

402-2112386-8

CODIA:

35877

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

29/07/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,

Electro



Junta Distrital o Alcaldía Municipal
