

Santo Domingo, D.N.
05 octubre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Lupa
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de La Victoria.**




En la visita técnica realizada el 20 de febrero del 2023 se validó la ejecución de 2,427.15 metros cuadrados de aceras y 2,507.40 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución 972.32 metros cuadrados de aceras y 1000.20 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 3,399.47 metros cuadrados de acera y 3.507.60 metros lineales de contenes, lo que corresponde al 50% de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 320302

REGIÓN: OZAMA

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

DISTRITO MUNICIPAL: LA VICTORIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de enero de 2023

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS:

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	HACIENDA ESTRELLA, CRUCE DE LA GINA	424.50	1.00	1	424.50	1	424.5	424.5
TRAMO B	LOS CASTILLOS, CARR. LA VICTORIA - CRUCE DE LA GINA	522.30	1.00	1	522.30	1	522.3	522.3
TRAMO C	LA UNIÓN, C/BOHECHÍO	252.50	0.79	1	252.50	1	200.3335	252.5
TRAMO D	CARR. LA VICTORIA - VILLA MELLA3	486.00	1.00	1	631.80	1	486	631.8
TRAMO E	LA VIRGEN, CARR. SABANA PERDIDA	653.30	1.22	1	676.3	1	794.02082	676.3
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							2427.15	2507.40



AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 9,213,829.36
Monto desembolsado RD\$ 9,213,829.37 (100%)
Avance de obra 103.94%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de enero de 2023

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

DISTRITO MUNICIPAL: LA VICTORIA


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,427.15 metros cuadrados de aceras y 2,507.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Las aceras y contenes construídos en el distrito fueron ejecutados con basta calidad constructiva.
2. En algunos tramos fue necesario hacer muro de contencion para el relleno bajo aceras debido a la diferencia de altura entre la via y el terreno aledaño.


IMÁGENES

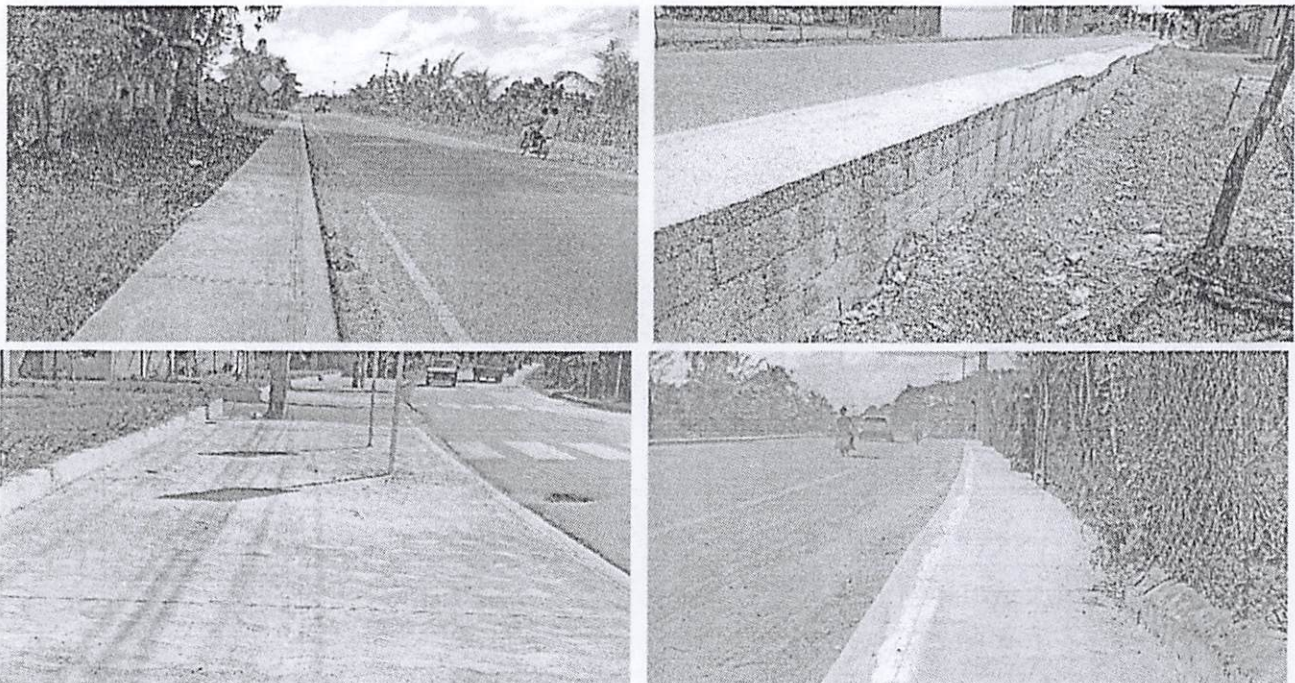



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

Suministra los datos de este reporte,



ING. EDWARD ACOSTA

Técnico



PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

3ER COMPONENTE

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO


PROVINCIA: Santo Domingo
MUNICIPIO: Santo Domingo Norte
DISTRITO MUNICIPAL: La Victoria
BARRIO Y/O SECTOR: Conde 2do

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local ☐
b. Contratista ☒

Razón Social: Ing. Luis Vicente Magallanes Benítez
RNC ó Cédula: 001-0618288-4



3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: ☒
b. Incluye demoliciones de tramos: ☐
c. Incluye badenes: ☐
d. Otros:

Construcción de contenes y aceras nuevos


4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

CONTRALORIA
20 NOV 2003
Unidad Ejecutiva Interna

249.00 m


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle 3ra	18.576929	-69.849457	18.577401	-69.848874	141.60	0.98	153.00	138.77	153.00
Tramo B	Calle 1ra	18.577704	-69.849161	18.577109	-69.848569	136.40	0.78	136.40	106.39	136.40
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



Totales 245.16 m2 289.40 m

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Carretera la Victoria	18.664757	-69.881321	18.665564	-69.881829	100.00	1.04	100.00	104.00	100.00
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										
Totales									104.00 m2	100.00 m



Manuel A. Delgado
 Ingeniero Civil
 Codia 31150
 Santo Domingo Rep. Dominicana

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Carretera La Luisa	18.670606	-69.879134	18.671256	-69.878624	194.20	1.02	194.20	198.08	194.20
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										



Totales

198.08 m2

194.20 m

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Carretera la Victoria	18.643649	-69.869997	18.645077	-69.870582	167.60	1.05	167.60	175.98	167.60
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

CONTRALORIA
 2015
 Unidad de Planeación Urbana

Totales 175.98 m2 167.60 m

Manuel A. Delgado Durán
 Ingeniero Civil
 Codia 31150
 Santo Domingo Rep. Dom.

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se observa la construcción de contenes y aceras con las dimensiones normales, con buena Terminación.

Se debe buscar solución para desaguar tramo donde se acumula agua.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,



NOMBRE COMPLETO:

Manuel Delgado Duran

CÉDULA:


001-1812369-4

CODIA:

31150

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

18/09/2023



Valida y aprueba los datos suministrados,

Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



CONTRALORIA

20 NOV 2013


Unidad Ejecutiva de Planeación

IMÁGENES



Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.





Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.



En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes y aceras, trabajados por el contratista en cuestión, trabajando ambos lados de la calle.

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.

Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.



En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes y aceras, trabajados por el contratista en cuestión, trabajando solo un lado de la calle.

Manuel A. Delgado Durán
Ingeniero Civil
Codia 31150
Santo Domingo Rep. Dom.
