



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 170105
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: PERAVIA
MUNICIPIO: BANÍ
DISTRITO MUNICIPAL: PAYA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 5 de octubre de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. César De Los Santos

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|--------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A | PROLONGACION CALLE DUARTE | | | | 1,436.20 | 1.00 | | 1,436.20 |
| TRAMO B | PROLONGACION CALLE DUARTE | | | | 157.30 | 1.00 | | 157.30 |
| TRAMO C | PROLONGACION CALLE DUARTE | | | | 282.80 | 1.00 | | 282.80 |
| Total | | | | | | | - | 1,876.30 |

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,139,356.60
Monto desembolsado RD\$ 2,069,678.30 (50%)
Avance de obra 116.64%





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: PERAVIA
MUNICIPIO: BANÍ
DISTRITO MUNICIPAL: PAYA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 5 de octubre de 2022


INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 05/10/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,876.30 metros lineales de contén, lo que corresponde al 116.64% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este distrito esta ejecutando por administración.
2. Lo visto hasta el momento cumple con los parámetros recomendados.

IMÁGENES

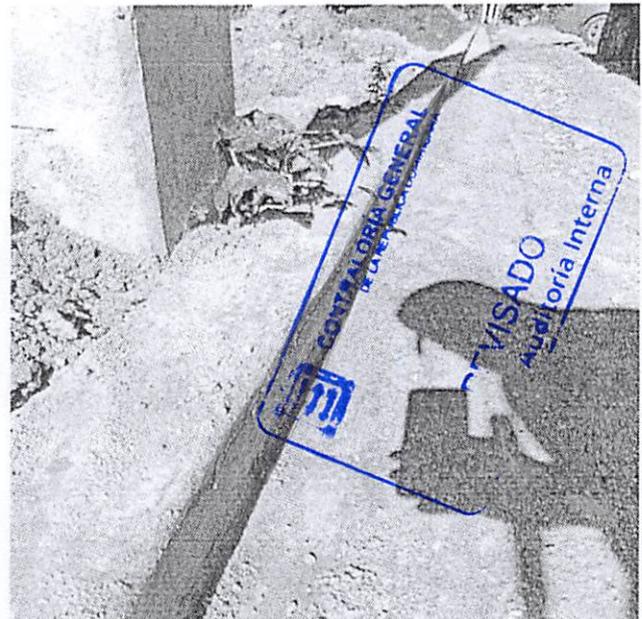




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

